



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-06

Diarienummer SFF-2023-00149

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se

Projektportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 2023

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för projektportföljen gymnasie- och grundskolefastigheter
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för gymnasie- och grundskola enligt bilaga 1 i stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi för gymnasie- och grundskolefastigheter.

- Generell överkapacitet av grundskoleplatser i nutid och närtid, men utmaningar att tillgodose behoven i de centrala delarna av centrum och Hisingen.
- Fortsatt behov av fler platser för anpassad grundskola (grundsärskola). Löpande samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Stadsfastighetsförvaltningen pågår för att hitta lämpliga lösningar som tillgodoser behoven.
- Grundskoleförvaltningen har den senaste tiden avstyrkt större byggprojekt på grund av höga projektkostnader. De främsta orsakerna till de höga kostnaderna är höjd internränta och ökade kostnader från entreprenörer. Översyn av kostnader pågår.
- Färre grundskoleplatser än beräknat kommer att levereras fram till och med 2026. Enligt prognos kommer vi att leverera 7 969 platser, jämfört med 8 760 platser. I huvudsak beror det på att Grundskoleförvaltningen har valt att pausa ett större byggprojekt och att ytterligare ett större byggprojekt avbrutits på grund av omtag i detaljplanearbetet.
- Prognosen visar att vi kommer att leverera 1 490 platser i stället för 1 499 under 2023, det vill säga något färre platser än beräknat. Orsaken är att ett projekt som var planerat för 2023 är framskjutet till 2024 på grund av överklagande av upphandling, plus behov av asbestsanering.
- Portföljen för gymnasie- och grundskolan består av sammantaget 393 ny- och reinvesteringsprojekt

- Beslutad budget uppgår till 6 072 mnkr och prognosen till 6 210 mnkr, vilket indikerar kommande ekonomiska avvikelser inom flera av projekten.
- Totalt har 61 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 359 mnkr.
- Nyinvesteringskostnaden för projekt som har beräknad slutbesiktning under 2023 är lägre jämfört med 2022 och 2021, men förväntas öka under 2024.
- Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 74 mnkr
- Rutinen för hanteringen inhyrningsprojekt är förändrad vilket innebär att dessa fortsättningsvis inte kommer belasta investeringsbudgeten.
- Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leverans anses god.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Stadsfastighetsförvaltningen ser prisökningar generellt inom alla områden, en effekt av pandemin och kriget i Ukraina. Inflationen påverkar nyckeltalen framåt och projektkalkylerna ligger högt jämfört med de skolor som framställts hitintills. Höga transport- och energikostnader samt materialbrist är faktorer som direkt påverkar byggsektorn. De ökade nyckeltalen medför att beställande nämnd återremitterar ärenden för kostnadseffektiviserande åtgärder. Hyreskostnaderna för projekten blir höga, dessutom påverkas de kraftigt av den höjda internräntan. Höga projektkostnader leder även till att tidsplanen för genomförandet skjuts framåt i tiden eftersom analys och avvikelshantering kommer krävas. Det är därför viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar målmedvetet med kostnadsstyrning. Detta görs genom ett avdelningsövergripande arbete i projektet ”sänkta produktionskostnader”. Arbetet ska resultera i en strategi som kommer implementeras under våren 2024. Likaså krävs ett nära samarbete med beställande verksamhet, vilket vi upprätthåller i styrgrupp.

Bedömning ur ekologisk dimension

I planen för 2021 ingår tre skolor, i planen 2022 finns 11 skolor och i planen 2023 finns för närvarande 2 skolor.

Klimatbudgetprojektet Gårdstensskolan har genomfört tidiga klimatberäkningar som visar att det går att leva upp till klimatbudgeten för grundskolor. En klimatberäkning för Gårdstensskolan idrottshall visar att det är möjligt att nå nära en halverad klimatpåverkan jämfört med Boverkets schabloner (vi saknar egna referensvärden för idrottshallar).

Sammanfattningsvis bidrar portföljen gymnasie- och grundskola till att målen nås.

Bedömning ur social dimension

Projekteringsarbete pågår för Nya Gårdstensskolan F-6 som kommer att byggas som Skola som arena. Skola som arena ska fungera som en mötesplats för barn och ungdomar i socialt utsatta områden och är en del i arbetet med Jämlig stad. Det ska hjälpa elever skapa sig en aktiv fritid, genom att öppna skolans lokaler efter lektionstid så att de som bor eller verkar i

området kan delta i eller leda kostnadsfria aktiviteter på skolan. Idag finns Skola som arena på cirka 20 skolor där staden behöver arbeta mycket aktivt med att motverka och förebygga otrygghet i skolornas närområde.

Sjumilaskolan, anpassning av skolgård är snart genomförd. Omfattning av projektet kommer från elevinflytande på Sjumilaskolan kring hur skolgårdsområdet kan nyttjas. Bland annat har eleverna önskat ytor för att kunna sitta och koppla av på, ytor för dans och spela teater, fler ytor för gungor och verksamheten önskar en samlingsplats utomhus då det idag saknas på skolan. I socialt utsatta områden blir skolor och skolgårdar särskilt viktiga eftersom många är trångbodda med torftiga gårdar mellan husen och få har egna trädgårdar med möjlighet till lek och rekreation. Även detta perspektiv är en del av Stadens bidrag för att motverka skillnader i livsvillkor och hälsa utifrån Jämlik stad.

Förvaltningen har under året tagit fram en Anvisning för barns delaktighet i byggprocessen (Grundskola). Anvisningen syftar till att säkerställa att tjänstepersoner hämtar in elevers perspektiv när staden bygger och utvecklar skolmiljöer. Sedan barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 finns en lagstadgad skyldighet att i enlighet med artikel 12, så långt det är möjligt, låta barn uttrycka sin mening och få den respekterad. Anvisningen ska implementeras under sista halvan av 2023. Förvaltningen har i sina tekniska krav och anvisningar (TKA) för omklädningsrum, krav på både könade och könsneutrala omklädningsrum, med möjlighet till dusch och ombyte i avskildhet. Fyra nya skolor har fått den typen av omklädningsrum med varierande utformning och just nu pågår arbete med att utvärdera dessa och att i samarbete med grundskoleförvaltningen se över om/hur skrivningarna behöver anpassas för att på bästa sätt möta alla elevers behov. I dialog med Ungdomsfullmäktige har det även framkommit önskemål om möjlighet till ökad kroppslig integritet även i de könade omklädningsrummen. Stadsfastighetsförvaltningen har genomfört dialoger med elever om hur de upplever omklädningsrummen, men inväntar vidare inspel från grundskoleförvaltningen för att uppdatera TKA.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-11-20).

Bilagor


1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter
 - 1.1. Investering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17)
 - 1.2. Re- och ersättningsinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17)
 - 1.3. Inhyrning gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17)

Ärendet

Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskolefastigheter. Ärendet omfattar detaljerad information om antal pågående projekt samt portföljens ekonomi. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt.


Beskrivning av ärendet

Övergripande gymnasiet och grundskoleportföljen

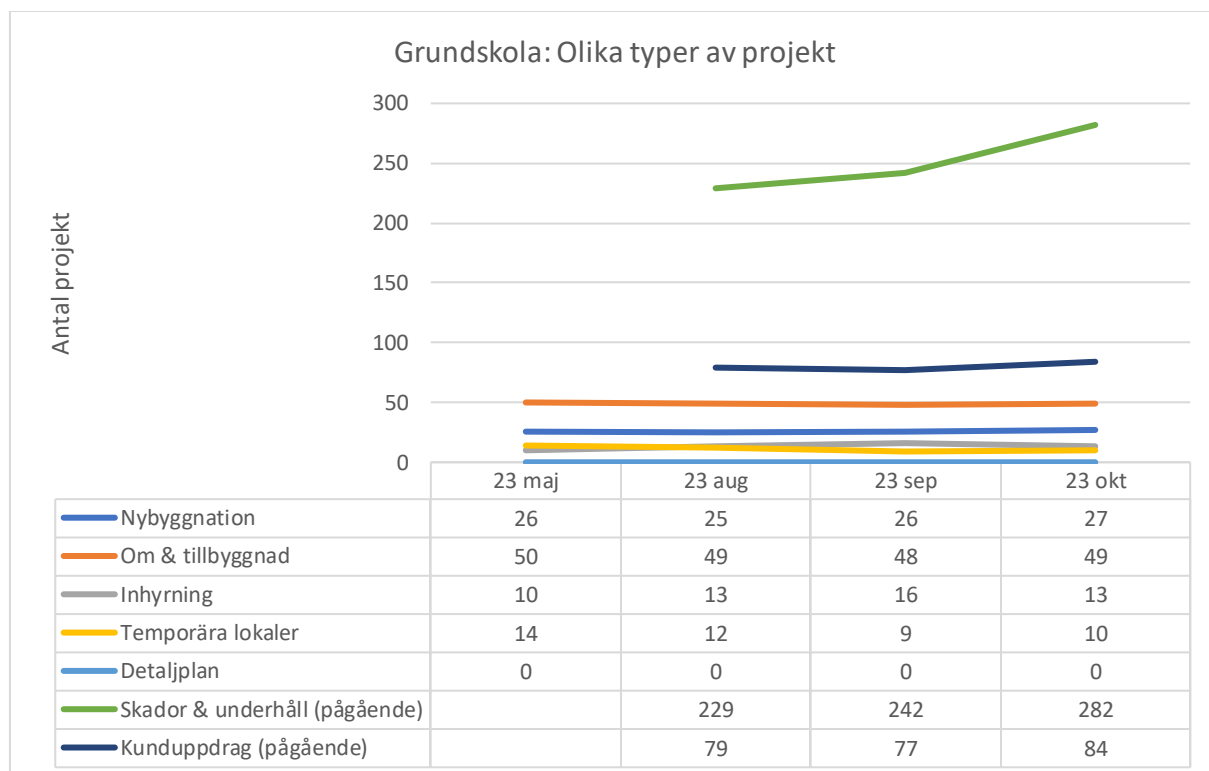

Antal investeringsprojekt, de vill säga nybyggnation och om- och tillbyggnadsprojekt ligger på en jämn nivå över tid. Samma sak med inhyrningsprojekt. Däremot sjunker antal projekt kopplade till temporära lokaler, på grund av att några av projekten är färdiga och har levererats, alternativt avbrutits för att behovet inte finns längre.

Det är en tydlig ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat underhåll, vilket är helt normalt eftersom vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som kommer att genomföras under 2024/2025.

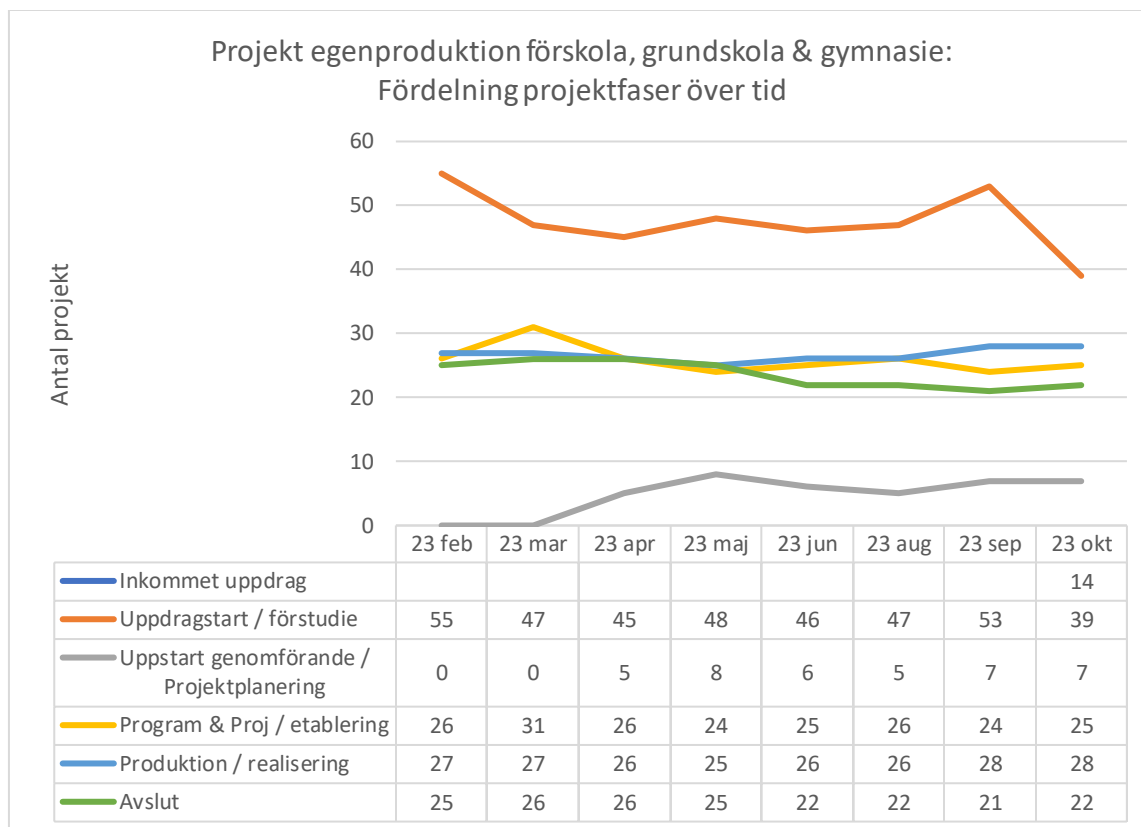

I grafen ovan ingår alla investeringsprojekt, dvs egenproduktion för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs förskola, grundskola & gymnasie.


Projektmetodiken har ändrats något, vilket innebär att projektfaser byter namn och att nya tillkommer. ”Inkommet uppdrag” är en ny projektfas som innebär att projektet har just kommit in och arbetet inte är uppstartat. Dessa projekt ingick tidigare i ”uppdragstart”.

Vi ser en ökning av antalet projekt som ligger som ”inkommet uppdrag” och som ”uppdragstart”, alternativt i förstudie. Totalt 53 projekt i oktober. Flertalet av dessa nya projekt är kopplade till detaljplanearbete.

Det är också en ökande trend med projekt i fasen ”uppstart genomförande”, respektive ”projektplanering”. Det innebär att vi har ett investeringsbeslut och har startat i gång genomförandet av projektet.

Antal projekt i ”program & projektering” respektive ”etablering”, har legat på samma nivå sedan i våras. Det är en svagt ökande trend med antal projekt i ”produktion / realisering”.

Antal projekt som ligger för att avslutas har minskat sedan i våras. Detta ser vi som positivt eftersom det beror på en riktad insats för att stänga projekt som är avslutade.

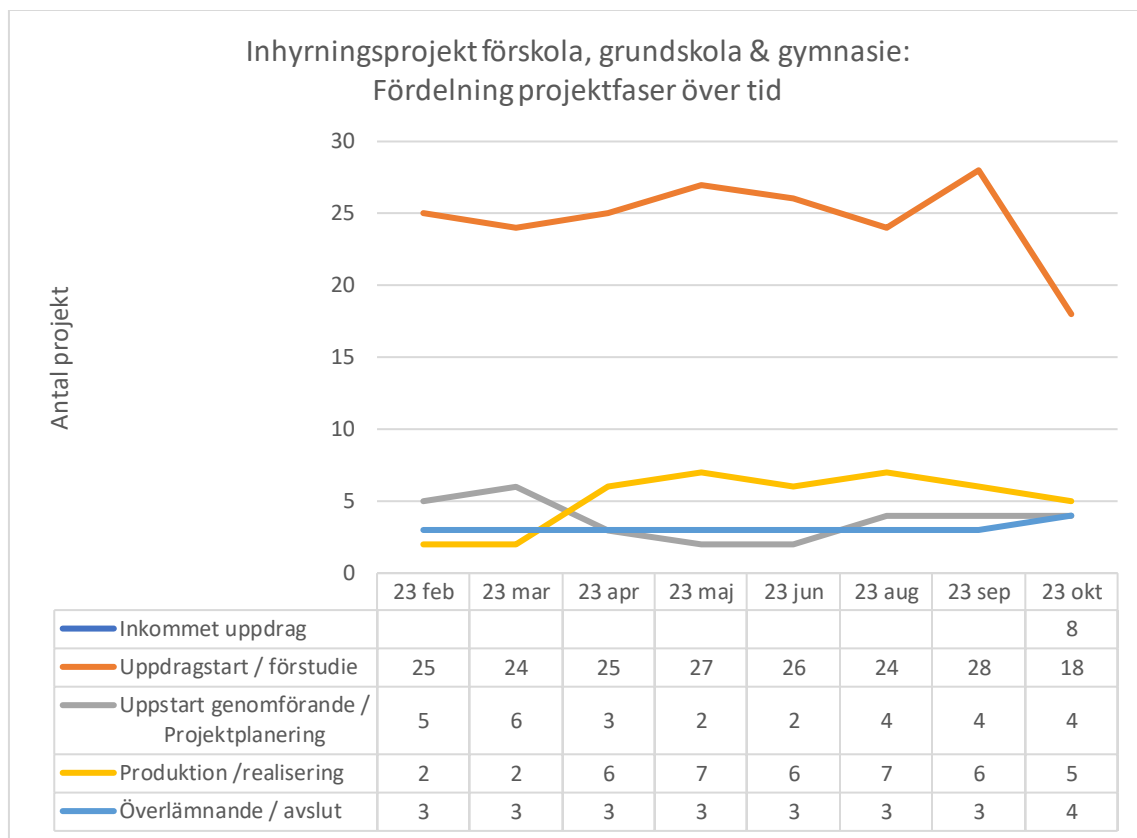


I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt, inklusive temporära lokaler, för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs förskola, grundskola & gymnasie.

Projektmetodiken har ändrats något, vilket innebär att projektfaser byter namn och att nya tillkommer. ”Inkommet uppdrag” är en ny projektfas som innebär att projektet har just kommit in och arbetet är inte uppstartat. Dessa projekt ingick tidigare i “uppdragstart”.

Det är något lägre antal projekt som ligger som ”inkommet uppdrag” och som “uppdragstart”, alternativt i förstudie, i oktober jämfört med september. Totalt 24 projekt i oktober jämfört med 28 i september.

Det är relativt få inhyrningsprojekt för förskola, grundskola och gymnasium jämfört med egenproduktion. Det är 39 inhyrningsprojekt, jämfört med 135 projekt för egenproduktion. Antal projekt i respektive projektfas har legat på en jämn nivå under en längre tid.

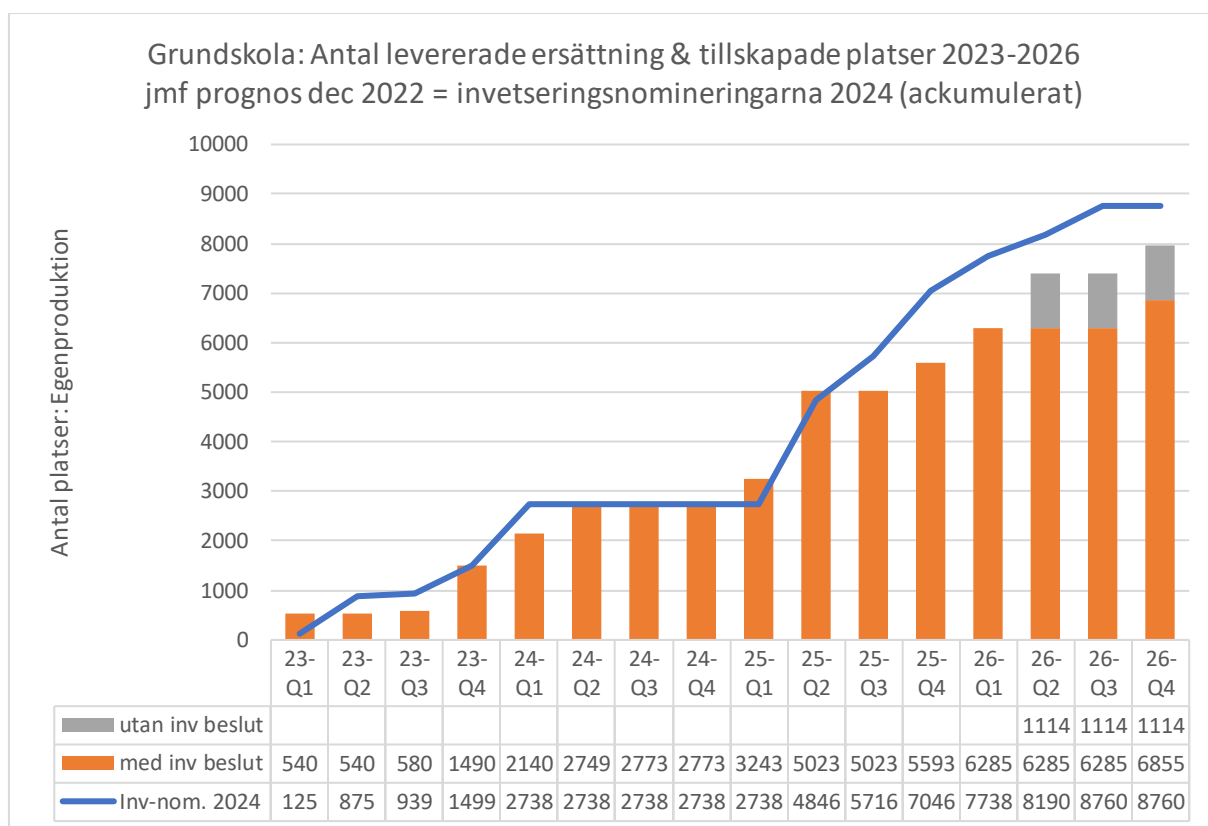

Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat. Projekt utan investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker. I grafen ingår både ersättningsplatser och tillskapade platser.

Färre platser än beräknat kommer att levereras fram till och med 2026, jämfört med prognos per december 2022, de vill säga investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 7969 platser, jämfört med 8760 platser.

Orsaken till detta är att GSF har valt att pausa ett projekt, Frejaskolan, som skulle ha gett 200 ersättningsplatser 2026 Q3. Dessutom har Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall, avbrutits på grund av omtag i detaljplanearbetet. Brudbergsskolan skulle ha levererat 760 tillskapade platser 2025 Q4, enligt prognosen som sattes i december. Antal platser har dessutom justerats ned något i några av de övriga projekten.

Prognosen visar också att vi kommer att leverera 1490 platser i stället för 1499 under 2023, det vill säga något färre platser än beräknat. Orsaken är att Ekmanska sjukhemmet som var planerad för 2023 är framskjutet till 2024 på grund av överklagande av upphandling och att det fanns ett behov av asbestsanering som inte ingick i projektet från start.

Ett större projekt som var planerad för 2025 Q2, flyttats fram till 2026 Q2. Det är Eriksboskolan F-6 med 428 platser. Projektet har ännu inget investeringsbeslut och kräver beslut i KF, därmed är tidplanen fortfarande osäker.


Stadsfastighetsförvaltningen har löpande dialog med grundskoleförvaltningen om att säkerställa behovet av platser.

Leveransplan Q4 2023 till 2024

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 Inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG4 överlämning godkänd slutbesiktning
Bergsjöskolan utökning produktionskök	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2023-12-31		
Förstudiebeställning, verksamhetsanpassningar för idrott, hus C Ryaskolan	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Planera förstudie	2024-01-15		
Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-02-01		
Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök evakuering	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2024-01-22		
Kålltorpsskolan solavskärmning	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2024-10-01		
Lerlyckeskolan ersättning nybyggnad F-6	A1 (nybyggnad)	Förstudie	2024-01-01		
Näsets skolan om- tillbyggnad	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2024-12-03		
Rävebergsskolan F-3 utredning matsal	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2023-11-01		
Styrsöskolan verksamhetsanpassningar folkbiblioteket	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Planera förstudie	2023-11-13		
Västerhedsskolan - F3 utökning till F6	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2023-12-24		
Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt- genomförande	ok	2023-11-28	
Bräckeskolan - Investering Etapp 2	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-02-23	
Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-06-15	
Lundens skolan lokalanpassning	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-02-01	

Noleredsskolan F-6	A1 (nybyggnad)	Projekt- genomförande	ok	2024-04-22	
Ryaskolan - Kompletterande anpassningar hus A, B och C	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2023-11-01	
Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2023-11-01	
Toleredsskolan anpassning hus A2 och A3	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt- genomförande	ok	2024-07-01	
Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla Trulsegården F-3, ombyggnad angöring	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-05-01	2024-09-02
Utbynässkolan - verksamhetsanpassningar hus A (bruna villan)	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt- genomförande	ok	2023-12-30	
Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt- genomförande	ok	ok	2023-11-28
Gärdsåsskolan - tillkommande verksamhetsönskemål utöver beslutade åtgärder i hus A	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-04-04
Gärdsåsskolan Huvudprojekt om- nybyggnad- och tillbyggnad FS 2016 (exkl G &B)	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-04-02
Gärdsåsskolan hus A Tomställd del anpassning till evakueringslokaler	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-03-24
Lundbyskolan nybyggnad idrottshall	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-03-04
Lundbyskolan. ny 7-9 skola, anpassad grundskola och kulturskola samt idrottshallar IOFF	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2023-12-15
Lundensskolan paviljonger	Inhyrning - Temporära lokaler	Produktion	ok	ok	2023-12-04
Påvelundsskolan Evakueringspaviljonger	Inhyrning - Temporära lokaler	Produktion	ok	ok	2024-05-23

Sannaskolan anpassning hus A och B årsrk 7-9	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-07-29
Sannaskolan anpassning SU-enhet (komplettering till befintligt uppdrag)	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-05-31
Torslandaskolan F-6	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-08-30
Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo.	Inhyrning - Temporära lokaler	Produktion	ok	ok	2023-12-18

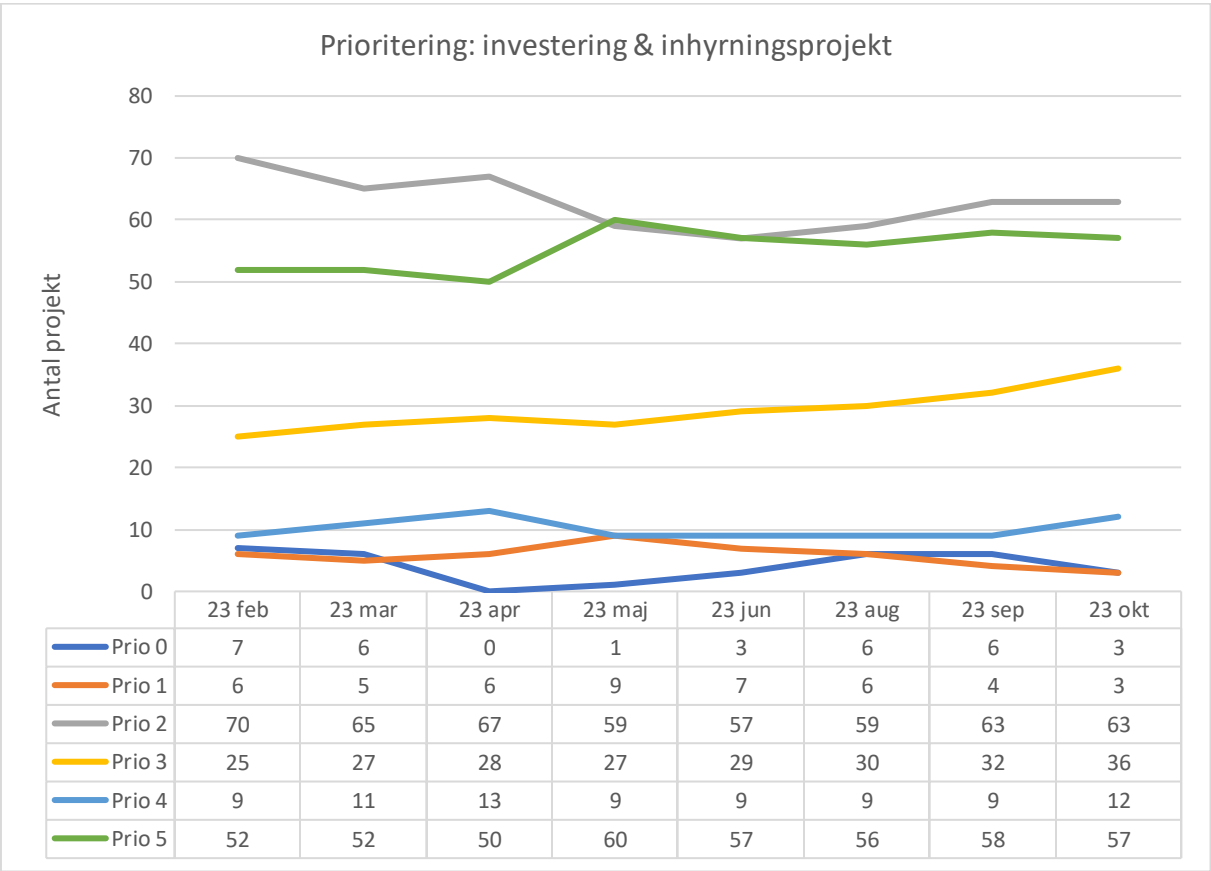

I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt, inklusive temporära lokaler, för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs förskola, grundskola & gymnasie.

Prioritetsnivå	Hela staden-perspektiv
5	Är i produktion / avslutningsfas

4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt.
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering


Antal högt prioriterade projekt ökar, vilket innebär projekt med prioritet 3 och 4, samtidigt som antal lågt prioriterade projekt med prioritet 1 minskar. Risken med ökat antal högt prioriterade projekt är att dessa projekt kan ta resurser från de projekt som ska gå i normalfart, de vill säga projekt med prioritet 2. Vi är i nuläget inte i en situation där de högt prioriterade projekten tar resurser från de projekt som går i normalfart.

Löpande dialog förs med kundförvaltningar, där prioritering sätts när kundförvaltningen beställer in projekt, och på prioriteringsmöten med kundförvaltning. På prioriteringsmötet fångas det upp om projekt behöver en annan prioritet, jämfört med det projektet hade när det en gång beställdes.

Ekonomi

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2023 som levererades i mars och augusti.

Ny- och reinvestering

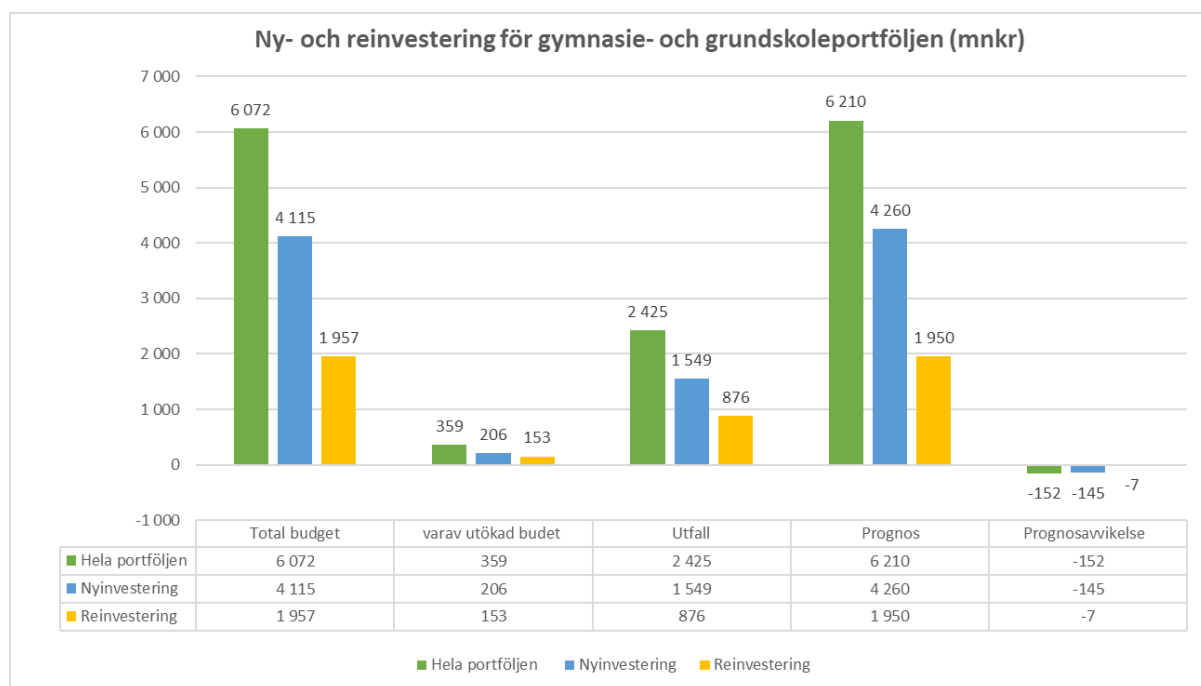

Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna.


Portföljen för gymnasie- och grundskolan består av sammantaget 393 projekt varav 84 är nyinvesteringsprojekt och 309 är reinvesteringsprojekt. Totalt har portföljen ett upparbetat utfall om 2 425 mnkr vilket motsvarar 39 procent av total prognos. Sett utifrån finansiering uppgår upparbetat inom nyinvesteringen till 36 procent och till 45 procent inom reinvesteringsportföljen. Avvikelsen mellan upparbetat och prognos beror på att över hälften av projekten inom nyinvestering fortfarande befinner sig i uppstart, förstudie eller projekteringsfas vilket innebär att projekten ännu inte arbetat upp något betydande utfall. Gårdsten- och Noleredsskolan kan nämnas som exempel där båda sedan tidigare har en beslutad budget på runt 300 mnkr vardera men ännu inte är i genomförandefas. Inom reinvestering är det många projekt som är beställda och budgeterade för genomförande under 2024 eller 2025. I dessa finns inget eller marginellt upparbetat utfall ännu, vilket också bidrar till avvikelsen. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1:1 och 1:2.

Beslutad budgeten för hela portföljen uppgår till 6 072 mnkr. Prognosen för portföljen är 6 210 mnkr vilket medför en negativ prognosavvikelse mot totalt beslutad budget om cirka 150 mnkr. Sett per enskilt projekt finns det prognosavvikelser i strax över 30 projekt och avvikelsen uppgår då till närmare 300 mnkr. Skillnaden beror på att i portföljen finns det ett 100-tal projekt som prognostiseras lämna ett överskott, vilket kompenserar underskottet som helhet. Flertal av avvikelserna kommer sannolikt att innebära budgetavvikelser för stadsfastighetsnämnden att ta ställning till, främst inom nyinvestering.


Skälen till avvikelsen mellan budget och prognos varierar men en bidragande anledning är rådande marknadsläget med en ökad prisbild och kalkyler som visar på nyckeltal som skiljer sig avsevärt mot tidigare år. Arbeta med att identifiera orsak till avvikelserna har genomförts

under året. Åtgärder kopplat till avvikelserna kommer adresseras och mynna ut i en strategi under våren 2024.

Projektledarna arbetar ständigt med kostnadsbesparingar både i större och mindre projekt, vilket redovisas i styrgrupp innan en avvikelse godkänns på delegation alternativt rekommenderas nämnden att godkänna. Gårdstensskolan, Noleredsskolan och Askimsskolan är stora betydande projekt där omfattande arbete lagts ner för att kostnadsreducera projektbudgeten och att minska kommande kostnadsavvikelser.

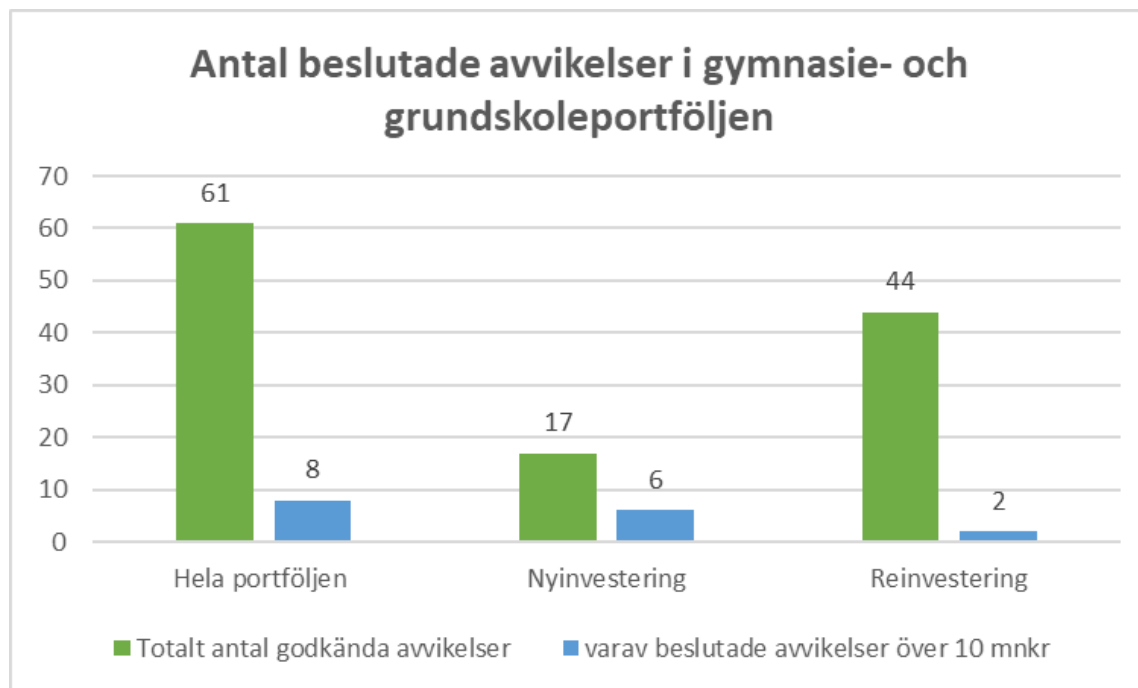

Sammantaget har 61 budgetavvikelser om totalt 359 mnkr godkänts i portföljerna, antingen av nämnd eller på delegation. Av avvikelserna i portföljen som godkänts överstiger 8 av dem 10 mnkr. Större delen av antal avvikelser är mindre avvikelser i reinvesteringsprojekt som tas på delegation. Procentuellt har 16 procent av portföljens projekt avvikelsehanterats.

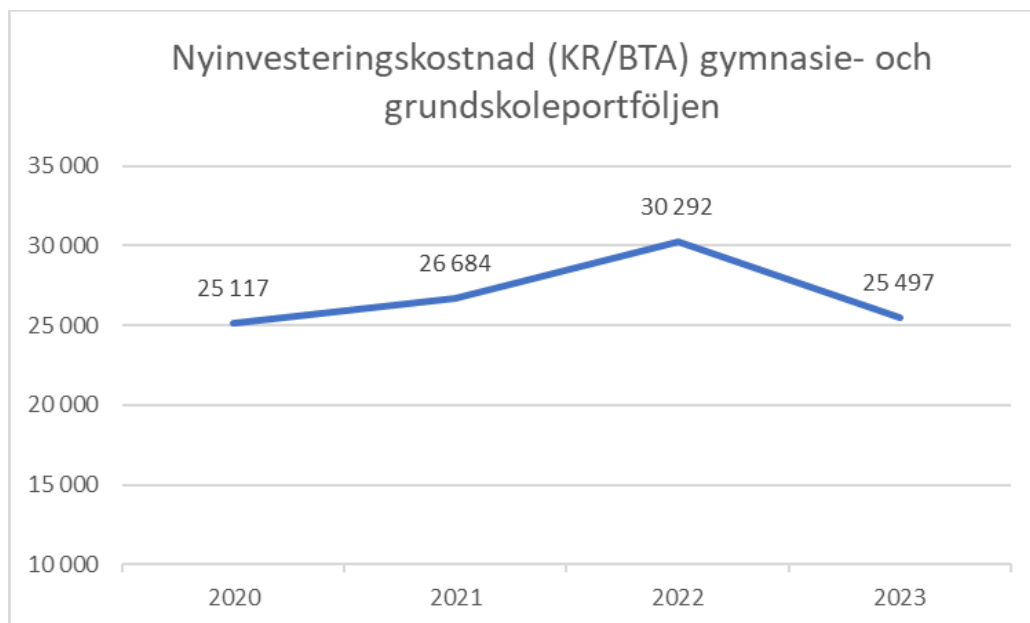


Grafen visar utvecklingen av grundskolans nyinvesteringskostnad per bruttoarea. Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020-2022, samt på prognos för projekt som har planerad slutbesiktning under 2023. Kostnaden per bruttoarea ökade under 2022 för att sedan falla tillbaka under 2023. Ett antagande är att berörda projekt upphandlades under 2020 i samband med pandemins start, en orolig tid med mycket spekulationer. Det påverkade marknaden och anbudet blev högre. En ytterligare faktor är att endast två projekt slutbesiktigades under 2022 vilket gör underlaget mer känsligt om något projekt sticker ut. I detta fall är ett av projekten av mindre karaktär (jämfört med en hel skola) vilket innebär att alla ”dyra” installationer såsom storkök etc. fördelas på färre kvm, vilket påverkar KR/BTA.

Inhyrning

Under hösten har ekonomiavdelningen förändrat sin rutin för hur kostnaden för projektledares tid i inhyrningsprojekt hanteras. Tidigare har projekt med utfall överstigande 4 PBB (212 tkr) hanterats som investering i annans fastighet vilket inte är förenligt med de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning förespråkar. Fortsättningsvis kommer stadsfastighetsförvaltningen följa rådets rekommendationer och redovisa inhyrningsprojekt som en driftskostnad. Undantag är ombyggnation i annans fastighet eller etablering av temporära lokaler där projektledarens tid hanteras inom investeringen och skrivs av på kontraktstiden. Dessa projekt redovisas efter genomförandebeslut tillsammans med övriga investeringar i bilaga 1:1 alternativt 1:2. Inhyrningsprojekt som enbart består av upparbetad tid för projektledare hanteras som en driftskostnad redovisas i bilaga 1:3.

Totalt finns 17 pågående inhyrningsprojekt i portföljen och upparbetad summa uppgår till 2 405 tkr. Flertalet av projekten saknar budget samt prognos i bilagan. Arbetet med uppdatering pågår.

Investeringsrelaterade driftskostnader

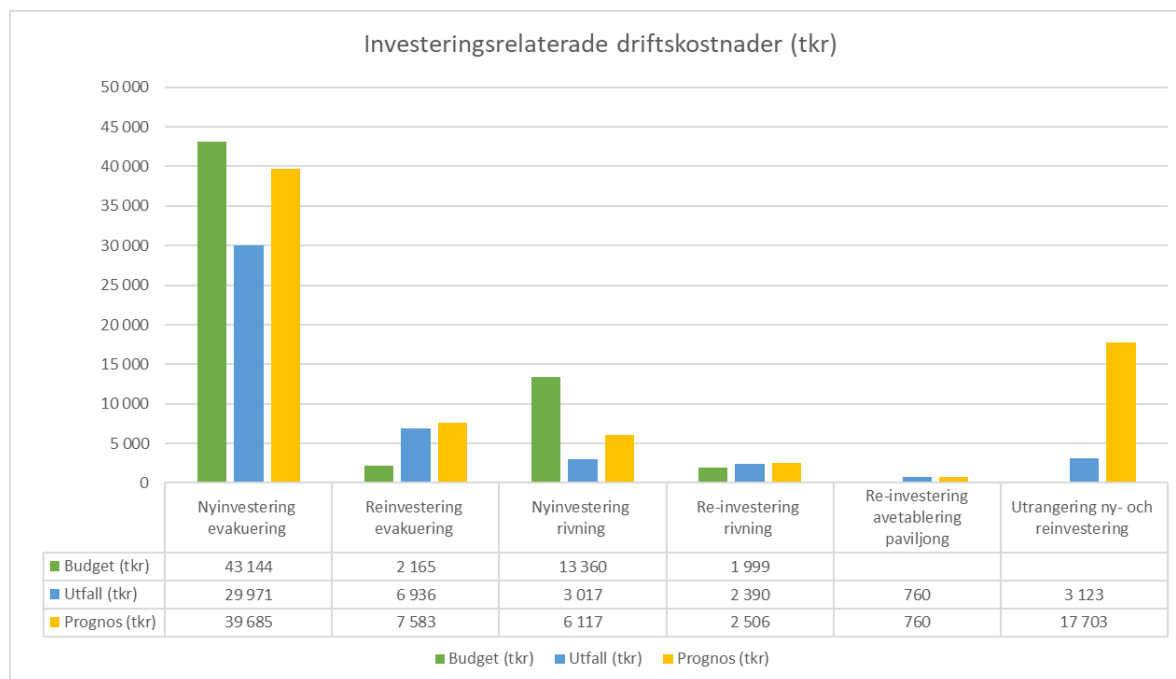

Totalt prognos för 2023 i investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 74 mnkr. Upparbetat till idag är 46 mnkr. Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande nämnd utifrån självkostnadshyresprincipen.

Förvaltningens bedömning

Måluppfyllelsen för portföljen avseende leverans anses god.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

Projektportfölj nyinvestering, gymnasie- och grundskolefastigheter 2023-10-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	1 271	757	1 260
Gymnasie- och grundskola	4 115	1 549	4 260
Summa utbildningsportföljen	5 386	2 306	5 520
BMSS	641	188	637
ÄVO	228	64	219
Övrigt	114	26	113
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	983	278	969
Summa totalt båda portföljerna	6 369	2 584	6 489

*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2023 som levererades i mars och augusti.

**De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan	16	1	12	17	1	1	48
Gymnasie- och grundskolan	23	10	17	31	3	0	84
BMSS	11	0	12	11	0	1	35
ÄVO	2	2	5	0	1	0	10
Övrigt	1	0	3	6	0	51	61
Summa antal	56	16	49	65	5	53	238

Prio	Förklaring av prioritering - Hela staden perspektiv
5	Är i produktion/ avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-1019/18, SFF-2023-00438	Eriksboskolan F-6 nybyggnad	Angered	6 500	5 500	12 000	11 582	12 001	Beslut om genomförande i nämnd i november	Program och projektering	2026-05-25	2
230-0201/18	Nya Gårdstensskolan idrottshall	Angered	0	0	0	706	110 080	Projekt ska avvikelshanteras som helhet. Vid godkänd avvikelse uppdateras budget i enlighet med beslut.	Uppstart	1900-01-00	3
230-0201/18	Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad	Angered	285 000	0	285 000	13 068	364 624	Arbetar med systemhandlingar för att ta fram kalkyl. Styrgrupp nov	Program och projektering	2026-12-15	2
1618/21	Rävebergsskolan F-3 utredning matsal	Angered	0	0	0	71	79	Kalkylarbete pågår	Förstudie	1900-01-00	2
230-0477/15	Gunnilse ny grundskola 4-9 vid Gunnilse centrum (Reviderat uppdrag)	Angered	0	0	0	1	0	Förstudie tidigat skede	Förstudie	1900-01-00	2
230-1644/21	Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö	Angered	7 000	0	7 000	238	7 000		Projektgenomförande: Etablering	2024-06-13	3
2199/22 NYTT: SFF -2023-00475	Bergumsskolan F-9 verksamhetsanpassningar	Angered	750	0	750	45	715		Förstudie	2025-12-19	3
2212/21	Frölundaskolan hus F - ombyggnad till grundskola	Askim-Frölunda-Högsbo	5 000	3 850	8 850	8 736	8 850		Produktion	2022-12-21	5
2143/21	Västerhedsskolan - F3 utökning till F6	Askim-Frölunda-Högsbo	1 400	800	2 200	1 124	2 200		Förstudie	1900-01-00	2
2023-01464	Frölundaskolan dörrbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	2 040	200	2 240	259	2 240		Förstudie	1900-01-00	4
230-0521/16	Askimskolan ny -ombyggnad	Askim-Frölunda-Högsbo	228 000	0	228 000	73 297	255 957		Produktion	2025-12-22	5
230-1434/21	Hovåsskolan utökning	Askim-Frölunda-Högsbo	250	0	250	242	600		Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01214 (förskola) samt SFF-2023-00856 (grundskola)	Trollängsskolan - utökning grundskola samt ny förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	5	0	Detaljplaneskede	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
230-0741/18	Internationella skolan - ISGR Guldheden nybyggnad	Centrum	215 000	58 000	273 000	35 038	273 000		Produktion	2025-06-02	5
2023-00148	Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar	Centrum	0	0	0	33	0		Förstudie	1900-01-00	2
2023-00128	Hvitfeldska utbyggnad matsal och tillagning	Centrum	0	0	0	31	0		Uppdragsstart	1900-01-00	2
2023-01780	Landalaskolan F-3 - förstudie till anpassad grundskola F-6	Centrum	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-01811	Norra Hamngatan 8, Elevhälsa Centrum GSF - Verksamhetsanpassning	Centrum	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
N230-0541/22	Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök evakuering	Centrum	150	0	150	30	150		Genomföra förstudie	1900-01-00	4
N230-0541/22	Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök	Centrum	420	0	420	287	420		Genomföra förstudie	1900-01-00	4
N230-0580/19	Schillerska gymnasiet ventilation	Centrum	750	0	750	526	620		Förstudie	1900-01-00	2
230-0013/17	Götabergsskolan - Ombyggnad Kemisal	Centrum	8 300	0	8 300	0	3 632		[Pausat] Program och projektering	1900-01-00	1
N230-0637/14	Toleredsskolan - utökning elever	Lundby	132 600	38 000	170 600	139 839	142 913		Produktion	2022-07-07	5
230-0391/17	Bräckeskolan - Hus H	Lundby	85 000	30 000	115 000	90 680	104 801		Produktion	2024-02-29	5
SFF-2023-00729 och 230-0789/16	Lundbyskolan. ny 7-9 skola, anpassad grundskola och kulturskola samt idrottshallar IOFF	Lundby	370 700	18 800	389 500	338 596	389 500	Besiktning nov 2023. Inflytt januari 2024	Produktion	2023-11-27	5
SFF-2023-00731 och 230-0789/16	Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del del av hus A (aula)	Lundby	40 000	6 200	46 200	39 334	46 152		Produktion	2023-02-01	5
SFF-2023-00735	Lerlyckeskolan F-6 evakuering samt provisorisk expansion i centrala Lundby	Lundby	0	0	0	63	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	4
SFF-2023-01730	Regnbågsgatan, grundskola - nybyggnation	Lundby	0	0	0	3	0		Planera förstudie	1900-01-00	2
N230-0391/17	Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3	Lundby	42 000	0	42 000	5 053	42 000		Program och projektering	1900-01-00	2
230-0815/21 / SFF-2023-00120	Toleredsskolan anpassning hus A2 och A3	Lundby	57 000	0	57 000	205	57 000	förskjuten i tidsplan	Projektgenomförande: Etablering	2026-12-07	3
230-1145/20 och SFF-2023-00418	Toleredsskolan nybyggnad kök, matsal och mindre idrottshall (Hus H)	Lundby	67 500	0	67 500	25	67 500	förskjuten i tidsplan	Projektplanering	2028-06-26	1
N230-0391/17	Bräckeskolan - Investering Etapp 2	Lundby	93 000	0	93 000	3 073	92 739		Program och projektering	1900-01-00	2
230-0789/16	Lundbyskolan nybyggnad idrottshall	Lundby	152 000	0	152 000	138 351	149 353		Produktion	2023-11-24	5
1186/22	Kärrdalsskolan provisorisk expansion	Lundby	3 100	0	3 100	438	3 100		Projektering	2024-08-08	5
N230-0490/21	Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B	Majorna-Linné	48 000	12 000	60 000	50 819	59 409		Produktion	2023-05-15	5
230-0423/20	Majornas Gymnasium Västra vux - Anpassning i samband med UH-projekt	Majorna-Linné	4 000	432	4 432	4 407	4 433		Produktion	1900-01-00	5
N230-0490/21	Sannaskolan 7-9 anpassning skolgård	Majorna-Linné	0	0	0	0	0		[Pausat] Inkommet uppdrag	1900-01-00	2

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-0441/21	Sannaskolan anpassning SU-enhet (komplettering till befintligt uppdrag)	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	43	2 000		Produktion	2024-05-31	5
0888/22	Hagaskolan förstudie utökning av kök och matsal	Majorna-Linné	500	0	500	191	191		Förstudie	1900-01-00	2
N230-0490/21	Sannaskolan anpassning hus A och B årsk 7-9	Majorna-Linné	70 000	0	70 000	41 588	68 200		Produktion	2024-06-28	5
1650/21	Bärbyskolan förstudie storkök och matsal	Norra Hisingen	0	0	0	59	80	avvikelse initierad	Förstudie	1900-01-00	3
230-0779/19	Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad	Norra Hisingen	300 000	0	300 000	14 822	300 000		Program och projektering	2026-05-29	2
SFF-2023-01930	Bärbyskolan F-6 -anpassning storkök och matsal samt textilslöjdsbyggnad	Norra Hisingen	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
230-1023/18	Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3	Norra Hisingen	108 313	0	108 313	86 674	92 818		Produktion	2023-02-27	5
230-0698/14	Tångensskolan F-6 Paviljong Adapteo.	Norra Hisingen	7 050	0	7 050	2 434	7 050		Produktion	2024-07-31	5
N230-0982/21	Näsets skolan om-tillbyggnad	Västra Göteborg	2 000	166	2 166	2 259	2 166		Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01029	Åkeredsskolan tillfälliga lokaler för idrottsundervisning	Västra Göteborg	0	0	0	26	0	faktureras verksamhet?	Avslutat	1900-01-00	4
2214/21	Frejaskolan permanent utökning	Västra Göteborg	0	0	0	11	0		[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00	1
SFF-2023-00861	Styrsöskolan verksamhetsanpassningar folkbiblioteket	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		Planera förstudie	1900-01-00	4
SFF-2023-01970	Önneredsskolan F-9 ny, om-till och nybyggnation i ny detaljplan	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	4
SFF-2023-01956	Kulturskola, Grundskoleförvaltningen - inhyrning förråd	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
0980/22	Tynnaredsskolan anpassning till evakueringslokal	Västra Göteborg	16 000	0	16 000	4 792	16 000		Projektgenomförande: Etablering	2023-12-13	2
SFF-2023-00719	Åkeredsskolan	Västra Göteborg	306 999	0	306 999	27 690	306 996	Entreprenad pågår.	Program och projektering	2025-06-03	3
0495/17	Vättedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad	Västra Göteborg	600	0	600	347	490	Inväntar beslut fr, grundskoleförvaltningen	Förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01219	Nya Påvelundsskolan utbyggnad	Västra Göteborg	310 500	0	310 500	35 135	297 582		Produktion	2025-05-29	5
0982/22	Näsets skolan paviljonger	Västra Göteborg	6 350	0	6 350	516	6 350		Produktion	2024-07-31	4
SFF-2023-00032	Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C	Västra Hisingen	52 400	413	52 813	9 669	52 399		Program och projektering	2025-07-01	2
SFF-2023-01469	Noleredsskolan F-6	Västra Hisingen	329 000	0	329 000	4 703	355 000	Arbetar med systemhandlingar för att ta fram kalkyl	Projektgenomförande: Etablering	2026-11-27	3

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-0259/16	Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla Trulsegården F-3, ombyggnad angöring	Västra Hisingen	4 350	0	4 350	2 299	12 000		Program och projektering	2024-09-03	2
SFF-2023-01472	Förstudiebeställning, verksamhetsanpassningar för idrott, hus C Ryaskolan	Västra Hisingen	0	0	0	1	0		Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01842	Almqvistgatan och Jättestensskolan - Ny grundskola och utökning av befintlig kapacitet	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	4
SFF-2023-00455	Sjumilaskolan - anpassning skolgård	Västra Hisingen	3 000	0	3 000	2 605	3 000		Uppstart	1900-01-00	3
230-0850/21	Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö övre delen	Västra Hisingen	14 998	0	14 998	300	14 998		Program och projektering	2028-05-30	2
N230-0827/18	Ryaskolan - Nybyggnad hus G	Västra Hisingen	67 999	0	67 999	67 331	67 999		Avslut projekt	2022-11-30	5
230-0827/18	Ryaskolan - Kompletterande anpassningar hus A, B och C	Västra Hisingen	4 400	0	4 400	327	4 400		Program och projektering	2025-06-15	2
SFF-2023-01713	Torslandaskolan F-6	Västra Hisingen	285 000	0	285 000	185 265	254 700		Produktion	2024-06-12	5
230-1070/21	Ekmanska sjukhemmet anpassning till grundsärskola	Örgryte-Härlanda	32 000	8 500	40 500	6 290	39 500	Förskjuten tidsplan mellan 2023 och 2024	Produktion	2024-07-01	5
1147/22	Änässkolan solavskärmning	Örgryte-Härlanda	130	35	165	49	165	styrgrupp 23 okt	Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-00946	Smörgatan ny F-6 skola och idrottshall	Örgryte-Härlanda	500	0	500	61	500		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01240	Kålltorpsskolan solavskärmning	Örgryte-Härlanda	2 144	0	2 144	77	2 144		Förstudie	1900-01-00	2
230-0627/16	Lundensskolan lokalanpassning	Örgryte-Härlanda	12 900	0	12 900	8 361	12 900		Program och projektering	1900-01-00	2
SFF-2023-00319	Lundensskolan paviljonger	Örgryte-Härlanda	13 781	3 300	17 081	13 040	17 081		Produktion	2023-08-10	5
N230-0187/12	Gärdsåsskolan Huvudprojekt om-nybyggnad- och tillbyggnad FS 2016 (exkl G &B)	Östra Göteborg	52 000	20 000	72 000	51 232	72 002		Produktion	2023-11-30	5
230-0187/12	Gärdsåsskolan - tillkommande verksamhetsönskemål utöver beslutade åtgärder i hus A	Östra Göteborg	10 000	0	10 000	10 136	10 245	Avvikelse initierad	Produktion	2023-11-30	5
2023-00157	Karduansmakaregatan 23 EfUS utbyggnad	Östra Göteborg	0	0	0	7	0		[Pausat] Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01961	Utbynässkolan F-3 - ombyggnad kök och matsal	Östra Göteborg	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
230-1643/21	Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" anpassning storkök	Östra Göteborg	350	0	350	341	350		Förstudie	1900-01-00	3

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-1643/21	Kortedala/Bergsjön "Talldungeskolan" anpassning storkök	Östra Göteborg	300	0	300	282	300		Förstudie	1900-01-00	3
2023-00967	Bergsjöskolan utökning produktionskök	Östra Göteborg	350	0	350	42	350		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-00362	Bergsjöskolan - anpassning utemiljö	Östra Göteborg	6 800	0	6 800	5 529	6 800		Uppstart	1900-01-00	3
FF-2023-00335	Utbynässkolan - verksamhetsanpassningar hus A (bruna villan)	Östra Göteborg	18 000	0	18 000	102	18 000	Upphandling inför projektering under hösten	Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00	2
230-0187/12	Gårdsåsskolan hus A Tomställd del anpassning till evakueringslokaler	Östra Göteborg	12 300	0	12 300	8 410	12 263		Produktion	2023-11-30	5
230-1643/21	Kortedala/Bergsjön anpassning av 4 st storkök i 4 st skolor	Östra Göteborg	150	0	150	0	53		Förstudie	1900-01-00	3
0789/22 & SFF-2023-00312	Lokaler till anpassad gymnasieskola	Övrigt	250	0	250	150	0	Projektet pausas.	Planera förstudie	1900-01-00	4

Projektportfölj reinvestering, gymnasie- och grundskolefastigheter 2023-10-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	718	213	710
Grundskola	1 957	876	1 950
Summa utbildningsportföljen	2 675	1 089	2 660
BMSS	223	25	221
ÄVO	404	90	374
Strategiska och övriga	556	146	526
Summa boende, strategiska och övriga fastigheter	1 183	261	1 121
Summa totalt båda portföljerna	3 858	1 350	3 781

**Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2023 som levererades i mars och augusti.*

***De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget*

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0225/18	Tretjärnsskolan: Brandåtgärder	Angered	1 600	650	2 250	2 031	2 350		Genomförande	2022-11-02
N230-0243/20	Nytorpsskolan - Förstudie hus A, B invändigt	Angered	300	450	750	471	450		Förstudie	1900-01-00
N230-2180/21	Bergsgårdsskolan - byte 4st DUCar	Angered	800	250	1 050	1 021	1 050		Projektering	1900-01-00
N230-1837/22	Björsaredsskolan - Utvändigt underhåll	Angered	1 500	0	1 500	0	3 000		Projektering	2024-10-31
N230-0221/22 SFF-2023-00332	Blå Stället - Genomförande av avloppsbrist vid matsal och teatern	Angered	1 000	0	1 000	951	1 212		Genomförande	2023-09-29
N230-1158/21	Assaredsskolan - Byte ventilation i idrottshall	Angered	600	0	600	556	600		Projektering	2023-11-30
N230-1388/21	Angeredsgymnasiet - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	2 000	0	2 000	1 899	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-1846/22	Vättleskolan - Byte av lekutrustning, flaggstänger	Angered	700	0	700	0	700		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1848/22	Vättleskolan - Byte av 3 st hissar (Hus A, Hus C och Hus E) 24	Angered	750	0	750	0	750		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2019/22	Kristinaskolan - byte ventilation	Angered	800	0	800	6	800		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01962	Angeredsgymnasiet -Fördjupande förstudie totalrenovering -ny modell	Angered	1 000	0	1 000	118	1 000		Genomföra förstudie	1900-01-00
N230-2014/22	Römosseskolan - Byte yttertak	Angered	900	0	900	0	900		Projektering	2024-10-31
N230-2406/21	Rävebergsskolan - Lekutrustning , sittmöbler, grus	Angered	1 000	0	1 000	20	1 000		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N 230-2006/22	Kristinaskolan EL-underhåll	Angered	1 550	0	1 550	66	1 550		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1834/22	Björsaredsskolan - Markprojekt, byte av trätrall, lekredskap, grusyta	Angered	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1845/22	Nytorpsskolan - markprojekt	Angered	1 800	0	1 800	0	1 800		Projektering	1900-01-00
N230-1844/22	Hammarkullsskolan/Förskola - Byte av bergvärme & ventilation i del av skolan	Angered	2 100	0	2 100	0	2 100		Projektering	1900-01-00
N230-1841/22	Röseredsskolan - Installation värmepump och duc hus C	Angered	3 700	0	3 700	133	3 700		Projektering	2024-11-01
1660/22	Angeredsgymnasiet -Upprättande av funktion	Angered	5 000	0	5 000	0	5 000		Genomförande	2026-12-17
N230-2009/22	Römosseskolan - Invändiga åtgärder	Angered	6 000	0	6 000	1	6 000		Projektering	2024-10-31
SFF-2023-00996	Bergumskolan - Tillfällig matsal	Angered	775	0	775	187	650		Projektgenomförande: Etablering	2023-08-14
SFF-2023-00999	Bergumskolan - åtgärd efter vattenskada i hus I (i)	Angered	800	0	800	489	650		Projektavslut	1900-01-00
0875/22	Nytorpsskolan verksamhetsanpassningar - förstudie	Angered	500	0	500	267	270		Projektering	1900-01-00
N230-1388/21	Tretjärnsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 000	0	1 000	706	734		Projektering	2023-10-31
N230-2403/21	Hammarkullsskolan - DUC byte vita villan(fritids)	Angered	2 142	0	2 142	83	1 874		Projektering	2024-12-31
N230-2162/22	Nya Lövgårdesskolan - byte av vikvägg i idrottssalen	Angered	1 450	0	1 450	826	1 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01001	Hammarkullsskolan - byte gymnastikgolv efter takläcka	Angered	1 400	0	1 400	234	800		Projektplanering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1596/20	Tretjärnsskolan - ventilation	Angered	2 500	0	2 500	1 775	1 768		Genomförande	1900-01-00
N230-1388/21	Nya Gunnilseskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 500	0	1 500	527	669		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0415/19	Gårdstensskolan - separera idrottshall	Angered	3 000	0	3 000	1 775	1 775		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0312/19	Frölundaskolan Hus A - Byte av Ventilationsaggregat	Askim-Frölunda-Högsbo	500	2 772	3 272	3 205	3 272		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2333/21 SFF-2023-01702	Flatåsskolan - markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	2 600	2 600	5 200	39	2 600		Projektering	1900-01-00
N230-1084/21	Flatås Gård 6 - Renovering av ytskikt inne	Askim-Frölunda-Högsbo	11 300	1 825	13 125	12 773	13 125		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01011	Frölundaskolan-Byte av ventilationsaggregat i Hus E	Askim-Frölunda-Högsbo	600	1 500	2 100	13	750		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2334/21 SFF-2023-01701	Frölundaskolan - markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	2 600	1 500	4 100	695	2 600		Projektering	1900-01-00
N230-1303/21	Askimsskolan Hus C, invändiga och utvändiga åtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	7 300	0	7 300	227	9 174		Genomförande i huvudprojektet	1900-01-00
SFF-2023-01087	Flatås Gård -kunduppdrag låssystem och kundbelysning	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	469	500		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
N230-2330/21	Flatåsskolan- byte av duc och styrskap	Askim-Frölunda-Högsbo	1 700	0	1 700	1 473	1 700		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01088	Flatås Gård 6 - reinvestera avloppstam i källare	Askim-Frölunda-Högsbo	1 200	0	1 200	870	1 200		Projektgenomförande: Realisering	2023-08-15
N230-2338/21	Sisjöskolan-ducbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	14	500		Genomförande	1900-01-00
N230-2244/22	Flatåsskolan-Byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	0	500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2001/22	Lindåsskolan-Byte av RME panna 350 kw i Hus A	Askim-Frölunda-Högsbo	700	0	700	0	700		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1965/22	Sisjöskolan- Markåtgärder och lekutrustning	Askim-Frölunda-Högsbo	700	0	700	0	700		Inför projekt	1900-01-00
N230-1954/22	Brottkärrsskolan-Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	800	0	800	0	800		Inför projekt	1900-01-00
N230-1959/22	Södra Dragspelsgata-Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000	0	1 000	0	1 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-2152/22	Brottkärrssskolan - duc-byte	Askim-Frölunda-Högsbo	1 300	0	1 300	0	1 300		Uppdragsstart	2024-12-31
N230-2077/22	Brottkärrsskolan-Byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	1 500	0	1 500	0	1 500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2091/22	Nygårdsskolan- Byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	1 700	0	1 700	0	1 700		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2090/22	Lindåsskolan- byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	2 000	0	2 000	0	2 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1963/22	Lindåsskolan-Markåtgärder och lekutrustning	Askim-Frölunda-Högsbo	5 500	0	5 500	0	5 500		Projektering	1900-01-00
N230-1789/20	Högsbogårdsskolan, invändiga och utvändiga åtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	7 000	0	7 000	239	7 000		Projektering	1900-01-00
N230-2332/21	Hovåsskolan - Invändiga och utvändiga åtgärder Hus D	Askim-Frölunda-Högsbo	7 500	0	7 500	564	7 500		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2331/21	Flatåsskolan - fasadrenovering och fönsterbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	31 000	0	31 000	5 622	31 000		Produktion och avslut	2024-09-30
N230-2336/21	Hovåsskolan-byte av värmeledningar och avloppsrör	Askim-Frölunda-Högsbo	5 700	0	5 700	6	5 685		Projektering	2024-12-09
N230-1962/22	Högsbogårdsskola-Markåtgärder och lekutrustning	Askim-Frölunda-Högsbo	1 300	0	1 300	0	1 200		Inför projekt	1900-01-00
N230-1964/22	Nygårdsskolan-Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	3 200	0	3 200	0	0		Projektering	1900-01-00
N230-1302/21	Flatåsskolan- byte av ventilationsaggregat	Askim-Frölunda-Högsbo	6 200	0	6 200	2 317	2 700		Produktion och avslut	2023-09-04
N230-1946/22	Sisjöskolan -Invändiga åtgärder och byte av belysningsarmaturer	Askim-Frölunda-Högsbo	7 500	0	7 500	4	0		Projektering	1900-01-00
N230-1645/20	Frölundaskolan Hus A, C, D & E - Tak- och fasadåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	27 400	0	27 400	12 219	15 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1271/21	Göteborgsskolan - Fasadrenovering	Centrum	9 500	12 230	21 730	18 973	21 730		Produktion	2023-10-23
N230-0220/16	Internationella skolan - Ny ventilationslösning hus A,B,D	Centrum	21 900	7 100	29 000	32 736	32 726	avvikelsen initierad, styrgrupp nov	Avslut	2018-11-30
N230-1634/20 SFF-2023-01669	Katrinelundsgymnasiet - Klassrumsrenovering och tillhörande åtgärder	Centrum	9 750	6 150	15 900	15 897	15 897		Genomförande	1900-01-00
N230-2418/21	Buråsskolan - Utvändigt underhåll	Centrum	3 551	5 630	9 181	476	9 181		Projektering	2024-11-27
N230-1595/21	Samskolan - Invändigt underhåll	Centrum	6 500	4 500	11 000	1 567	6 500		Produktion och avslut	2024-05-31
N230-0190/21	Katrinelundsgymnasiet - UTE-åtgärder tak, fönster, dörrar	Centrum	12 350	4 000	16 350	11 304	11 352		Genomförande	1900-01-00
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Ventilationsåtgärder mekanisk ventilation	Centrum	5 000	2 500	7 500	6 484	6 600		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2401/21 och SFF-2023-01995	Katrinelundsgymnasiet - Byte till ledljus i byggnaden	Centrum	1 100	800	1 900	954	1 100		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1605/21	Samskolan - Återställning annexet	Centrum	980	400	1 380	1 353	1 372		Genomförande	1900-01-00
N230-0940/21	Guldhedsskolan - Förstudie hus A,B,C,D	Centrum	500	350	850	989	989	Avvikelsehanering är initiserad.	Efter projekt	1900-01-00
N230-0500/17	Aschebergsgymn/Vasa vux Försk. Modernisering ventilation	Centrum	32 800	0	32 800	3 461	45 447		Produktion	1900-01-00
N230-1168/22	Burgården Hus A Metodkök option 5 - metodmatsal	Centrum	924	0	924	924	964		Genomförande	1900-01-00
N230-1118/21	Schillerska Gymnasiet - fönsterrenovering	Centrum	4 000	0	4 000	492	4 002		Produktion och avslut	2025-10-16
N230-0229/22	Burgården Hus C - Dränering av byggnaden.	Centrum	9 500	0	9 500	9 814	9 500	avvikelse är initiserad	Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00468	Katrinelundsgymnasiet - re investering av avlopp	Centrum	570	0	570	868	570	avvikelse är initiserad	Projektplanering	2023-12-20
N230-1436/21	Burgården Hus A - Renovering av metodkök för VUX och GS	Centrum	28 300	0	28 300	28 315	28 300		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0146/18	Viktoriaskolan (Tyska skolan) Utredning ventilationen	Centrum	500	0	500	125	500		Projektering	1900-01-00
1722/22	Burgården Hus A - Byte till LED ljus i restaurang Animalen	Centrum	500	0	500	0	500		Uppdragsstart	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-00078	Schillerska Gymnasiet - re-investering av idrottshusets tak och div väggar	Centrum	1 000	0	1 000	420	1 000		Genomförande	2023-12-01
N230-2435/21	Buråsskolan - Hissombyggnad 23	Centrum	688	0	688	67	688		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01801	Hvitfeldska Gymnasiet Södra Akut dränering	Centrum	650	0	650	0	650		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-2242/21	Internationella skolan - Utökning fjärrvärme A,B,D,F	Centrum	750	0	750	1	750		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2012/22	Internationella skolan - Ny fjärrvärmeanslutning A,B,D,F	Centrum	750	0	750	0	750		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0151/21	Mossebergsskolan - Ombyggnad vent byte belysning mm	Centrum	1 000	0	1 000	160	1 000		Projektering	2024-08-30
N230-1091/21	Schillerska gymnasiet -stenbelägga mark utanför entrén.	Centrum	1 000	0	1 000	0	1 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-1598/21	Buråsskolan - Fönsterrenovering	Centrum	1 030	0	1 030	0	1 030		Produktion och avslut	2024-11-29
N230-1074/21	Aschebergsgymnasiet - Lägga om ytskikt på innegården samt renovera lekplats för FSF	Centrum	2 500	0	2 500	1 406	2 500		Projektering	1900-01-00
N 230-2005/22	Internationella skolan EL hus E och F - underhåll 24	Centrum	1 200	0	1 200	0	1 200		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1332/21	Samskolan - Elunderhåll	Centrum	1 300	0	1 300	95	1 300		Projektering	1900-01-00
N230-2010/22	Buråsskolan - Markåtgärder	Centrum	1 300	0	1 300	0	1 300		Inför projekt	1900-01-00
N230-2365/21	Schillerska Gymnasiet - byte av två fläktar.	Centrum	1 500	0	1 500	0	1 500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0346/18	Burgården Hus A - Diverse fasadåtgärder	Centrum	2 500	0	2 500	833	2 500		Genomförande	2023-10-19
N230-2020/22	Viktoriaskolan - Markåtgärder	Centrum	2 000	0	2 000	0	2 000		Projektering	1900-01-00
N 230-2004/22	Götabergsskolan-ISGR EL-underhåll 24	Centrum	2 100	0	2 100	0	2 100		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1849/22	Mossebergsskolan - Byte belysning och målning - PU 2024	Centrum	2 300	0	2 300	0	2 300		Projektering	2024-11-30
N230-2421/21	Viktoriaskolan - Byte belysning invändigt	Centrum	2 900	0	2 900	0	2 900		Projektering	2023-12-01
SFF-2023-02015	Hvitfeldska matsal - ytskikt inne och ute	Centrum	5 000	0	5 000	0	5 000		Projektering	2024-11-04
N230-2008/22	Götabergsskolan/ISGR - Invändiga ytskikt	Centrum	5 600	0	5 600	0	5 600		Projektering	2024-12-09
1595/21	Samskolan invändiga åtgärder	Centrum	6 500	0	6 500	0	6 500		Uppdragsstart	2024-05-31
N230-2018/22	Götabergsskolan/ISGR - Byte ventilation	Centrum	7 000	0	7 000	3	7 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1141/21	Johannebergsskolan - Reinvestering tillagningskök	Centrum	13 500	0	13 500	19	13 500		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01994	Hvitfeldska Gymnasiet Södra - Genomförande av ytskikt	Centrum	17 200	0	17 200	0	17 200		Projektplanering	2026-12-01
N230-1083/21	Burgården Hus C - Invändig ytskiktsrenovering och byte av installationer	Centrum	46 290	0	46 290	18 733	46 290		Produktion och avslut	2024-07-01
N230-0580/19	Schillerskagymnasiet - Byte av SRÖ	Centrum	1 100	0	1 100	1 052	1 052		Genomförande	1900-01-00
N230-1075/21	Burgården Hus A - Byte av ljusarmatur vån 5 + vid biblioteket	Centrum	650	0	650	582	581		Genomförande	2022-11-20
N230-0730/21 SFF-2023-02105	Aschebergsgymnasiet -Förstudie på byggåtgärder under planerat ventilationsutbyte	Centrum	1 000	0	1 000	690	837		Förstudie	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1388/21	Guldhedsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Centrum	1 000	0	1 000	748	820		Projektering	1900-01-00
N230-0413/21	Burgården Hus A - Aniara ventilation bygga om luftfördelningen	Centrum	500	0	500	85	241		Produktion och avslut	2024-04-01
N230-2224/21	Burgården Hus A + B Förstudie inför underhållsåtgärder	Centrum	500	0	500	155	200		Förstudie	1900-01-00
N230-0734/21	Schillerska Gymnasiet - Förstudie angående byggåtgärder i samband med ventilationsbyte	Centrum	500	0	500	135	160		Förstudie	1900-01-00
N230-1086/21	Hvitfeldtska Södra - renovering av VA	Centrum	4 500	0	4 500	3 200	3 219		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ	Centrum	3 500	0	3 500	2 003	2 050		Genomförande	1900-01-00
N230-2088/21	Burgården Hus A - Ombyggnad av bandplåttak	Centrum	8 000	0	8 000	2 138	4 000		Produktion och avslut	2023-09-29
N230-0298/18	Schillerska Gymnasiet - Modernisering ventilationssystem	Centrum	9 600	0	9 600	73	100		[Pausat] Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00730 och 230-0789/16	Lundbyskolan - Re-Investering, anpassning av befintlig del	Lundby	25 500	23 200	48 700	41 330	48 628		Produktion och avslut	2023-04-26
N230-0169/18	Rambergsskolan – Bygg, VVS och styr, el samt invändigt underhåll	Lundby	25 600	7 920	33 520	25 202	35 217		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, dagvatten och brunnar	Lundby	2 200	1 500	3 700	2 621	3 700		Projektering	1900-01-00
N230-0234/20	Bjurslättsskolan - förstudie storkök, stammar och dränering	Lundby	600	200	800	815	812	Fortsatt utredning beslutad, ombokning till genomförande	Förstudie	1900-01-00
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, underhåll av skolgårdsyta.	Lundby	6 400	0	6 400	6 596	12 800	avvikelse är initierad	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0680/17	Lerlyckeskolan- Ventilationsåtgärd. byte av fläktar	Lundby	1 300	0	1 300	1 321	1 326	avvikelse initierad	Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01076	Rambergsskolan - Byte golv i matsal	Lundby	550	0	550	494	550		Genomförande	1900-01-00
N230-0792/22	Rambergsskolan - Renovering av resterande fönster	Lundby	1 500	0	1 500	1 048	1 500		Produktion och avslut	2023-06-30
N230-1978/22	Bjurslättsskolan - Byte hydraulhiss - PU 2024	Lundby	800	0	800	4	800		Projektering	2024-11-30
N230-1980/22	Bjurslättsskolan - Renovering av omklädningsrum	Lundby	800	0	800	2	800		Genomförande	2024-10-31
0	Lindholmens Gymnasium Hus ÄRAN - ytskikt korridor och klassrum, våning 2	Lundby	835	0	835	0	835		Genomförande	2024-12-31
N230-1946/21	Rambergsskolan - Renovering av vaktmästarbostad	Lundby	3 000	0	3 000	1 708	3 000		Produktion och avslut	2023-06-05
N230-1974/22	Rambergsskolan - Invändig renovering idrottshall	Lundby	5 600	0	5 600	0	5 600		Projektering	2024-12-31
SFS 1784/22	Stora Holm (Fiktiv objekt) -Lagringsplats för PA-mark	Lundby	6 000	0	6 000	276	6 000		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-01933	Polhemsgymnasiet Hus Anglia -Ytskikt golv och vägg	Lundby	6 000	0	6 000	165	6 000		Projektering	2025-04-15
N230-1538/20	Bräckeskolan - reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 2	Lundby	18 000	0	18 000	121	18 000		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1538/20	Bräckeskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 3	Lundby	61 000	0	61 000	3	61 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00139	Toleredsskolan - Reinvestering hus A2 och A3 i samband med anpassning projekt (21188)	Lundby	67 000	0	67 000	74	67 000		Uppdragsstart	2026-12-07
N230-2405/21	Bjurslättsskolan - Duc- byte	Lundby	540	0	540	416	410		Projektering	2023-10-31
N230-0815/21 och SFF-2023-00139	Toleredsskolan - innemiljöåtgärder	Lundby	600	0	600	69	150		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-2400/21	Kärrdalsskolan - DUC byte	Lundby	1 530	0	1 530	306	805		Projektering	2023-12-30
N230-1128/21	Stora Holm - Utbyte av gatubelysning (kvicksilver) och fasadbelysning	Lundby	2 000	0	2 000	961	961		Produktion och avslut	2022-10-22
N230-0339/19	Kungsladugårdsskolan - Ventilationsåtgärder och invändigt underhåll	Majorna-Linné	44 700	9 950	54 650	69 259	99 475	avvikelse är initierad, nämndbeslut i november	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1057/21	Fjällskolan - Invändiga åtgärder	Majorna-Linné	8 500	9 000	17 500	16 513	17 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0426/18	Fjällskolan - Fasad- och fönsterrenovering	Majorna-Linné	12 000	6 500	18 500	18 604	22 210	Avvikelsen är initierad, avvaktar hantering	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0491/21	Sannaskolan - Reinvestering hus B	Majorna-Linné	12 500	6 400	18 900	17 601	18 900		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01732	Fjällskolan - Nytt ÄV-hus	Majorna-Linné	3 000	500	3 500	163	3 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0768/21	Karl Johansskolan - SRÖ	Majorna-Linné	2 640	340	2 980	3 171	3 200	avvikelse är initierad	Genomförande	1900-01-00
N230-0618/18	Nordhemsskolan - Relining dagvattenledningar	Majorna-Linné	2 500	0	2 500	3 643	3 660	avvikelse är initierad, avslutas inom kort.	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0776/22	Hagaskolan - Kompletterande invändiga och utvändiga åtgärder	Majorna-Linné	5 600	0	5 600	6 067	6 200	avvikelse är initierad,	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0331/18	Nordhemsskolan - invändigt underhåll	Majorna-Linné	40 500	0	40 500	13 057	40 590		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1062/21	Hagaskolan - kunduppdrag, verksamhetsförändring klassrum, grupprum, fritidshem	Majorna-Linné	746	0	746	791	800	Ska faktureras verksamheten	Projektering	1900-01-00
N230-1062/21	Hagaskolan - Invändiga åtgärder	Majorna-Linné	3 500	0	3 500	3 505	3 525		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0867/22	Kungsladugårdsskolan - Takåtgärder	Majorna-Linné	681	0	681	704	704	avvikelse är initierad	Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00650	Kungsladugårdsskolan - Vattenläcka träslöjd och kulturskolan	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	1 136	1 000	avviklse initierad	Genomförande	1900-01-00
N230-2303/21	Nordhemsskolan - Ventilation träslöjd	Majorna-Linné	830	0	830	737	830		Produktion och avslut	2023-10-03
SFF-2023-01523	Kungsladugårdsskolan - Kunduppdrag projekteringar och kostnadsförslag för etapp 8-11	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	199	1 000		Genomföra förstudie	1900-01-00
N230-0536/21	Sannaskolan - Omasfaltering, lekredskap, vegetation	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	26	1 000		Genomförande	1900-01-00
N230-1064/21	Hagaskolan - Utvändiga åtgärder	Majorna-Linné	6 000	0	6 000	4 912	6 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01521	Kungsladugårdsskolan - Etapp 6, verksamhetsanpassning och tillgänglighet, kulturskolan	Majorna-Linné	1 884	0	1 884	794	1 884		Genomförande	1900-01-00
N230-0769/21	Karl Johansskolan - aggregatsbyte	Majorna-Linné	8 500	0	8 500	7 313	8 500		Genomförande	1900-01-00
N230-2041/22	Oscar Fredriksskolan - Markåtgärd	Majorna-Linné	1 700	0	1 700	54	1 700		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-01520	Kungsladugårdsskolan - Etapp 7, verksamhetsanpassning för elevhälsa, personalutrymmen, administration, plan 1, husdel 2	Majorna-Linné	3 016	0	3 016	1 276	3 016		Genomförande	1900-01-00
N230-2034/22	Kungsladugårdsskolan - Markåtgärd	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	0	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-2042/22	Hagaskolan - Dränering	Majorna-Linné	3 800	0	3 800	41	3 800		Projektering	1900-01-00
N230-2307/21	Annedalsskolan - Byte av Tak hus A + B	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	165	5 000		Projektering	1900-01-00
N230-2043/22	Annedalsskolan - Dränering	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	47	5 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01218	Karl Johansskolan - Fortsatt utredning och projektering invändigt underhåll	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	37	5 000		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-01573	Kungsladugårdsskolan - Ytskiktsrenovering och byte av el-installationer, plan 1, husdel 3	Majorna-Linné	6 400	0	6 400	0	6 400		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-2270/21	Sannaskolan – Reinvestering hus A i samband med SLK projekt	Majorna-Linné	8 500	0	8 500	1 100	8 500		Produktion och avslut	2024-05-31
N230-0730/16 - NYTT Diariennr: N230-0767/21	Karl Johansskolan - Renovering tak, fasad, fönster	Majorna-Linné	39 500	0	39 500	31 559	39 500		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-02005	Majorna VUX idrottshall	Majorna-Linné	8 000	0	8 000	2	8 000		Projektering	2025-04-15
N230-2038/22	Fjällskolan - Dränering och mark	Majorna-Linné	8 500	0	8 500	19	8 500		Projektering	1900-01-00
N230-2035/22	Sannaskolan - Markåtgärder	Majorna-Linné	9 500	0	9 500	0	9 500		Projektering	1900-01-00
SFF 2023-01090	Karl Johansskolan - Dränering hus A, B och C samt markåtgärder	Majorna-Linné	19 000	0	19 000	219	19 000		Projektering	1900-01-00
N230-0414/22	Kungsladugårdsskolan - Hiss	Majorna-Linné	800	0	800	629	647		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-01084	Annedalsskolan - Kunduppdrag ombyggnad till hemkunskapssal	Majorna-Linné	957	0	957	652	662		Genomförande	1900-01-00
N230-2130/21	Fjällskolan - ventilation kök	Majorna-Linné	1 800	0	1 800	1 339	1 435		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01567	Kungsladugårdsskolan - markåtgärder pga översvämning till grannfastighet. Dränering	Majorna-Linné	725	0	725	0	0		Planering	1900-01-00
N230-2310/21	Oscar Fredriksskolan - Byte av duc	Majorna-Linné	1 500	0	1 500	503	528		Projektering	1900-01-00
N230-0164/20	Majorna Vux total upprustning	Majorna-Linné	106 000	0	106 000	100 721	102 465		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1972/22	Bärbyskolan - Invändig renovering	Norra Hisingen	2 100	2 900	5 000	22	5 000		Projektering	2024-09-01
N230-1986/22	Brunnsboskolan - Invändig renovering	Norra Hisingen	2 300	2 700	5 000	47	5 000		Projektering	2024-09-01
N230-2246/21	Brunnsboskolan - Byte av styr hus CDEFG	Norra Hisingen	1 100	700	1 800	1 430	1 800		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00707	Stora Holm Flyttåtgärder mellan hus C till hus K	Norra Hisingen	610	139	749	93	749		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
N230-0909/15	Utbildningscentrum Stora Holm. Komplettering och konvertering värmesystem	Norra Hisingen	10 000	0	10 000	11 849	11 888	Dialog med miljöförvaltningen pågår,avvikelsebelopp ej fastställt ännu.	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2269/21	Brunnsboskolan - Ombyggnad av vent hus F	Norra Hisingen	1 200	0	1 200	152	1 202		Projektering	1900-01-00
N230-2402/21	Stora Holm -Byte av tak växthus	Norra Hisingen	500	0	500	0	500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2325/21	Skälltorpsskolan - Renovering utemiljö	Norra Hisingen	600	0	600	12	600		Uppdragsstart/planering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1989/22	Skälltorpsskolan 7-9 - Byte inkommande ställverk - PU 2024	Norra Hisingen	700	0	700	2	700		Projektering	2024-12-31
N230-2250/21	Nedergårdsskolan - Byte av styr och ventilationsaggregat	Norra Hisingen	700	0	700	0	700		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-01461	Kärraskolan - Nytt förråd efter vattenskada	Norra Hisingen	750	0	750	44	750		Projektplanering	1900-01-00
SFF-2023-01998	Bärbyskolan - Markprojekt	Norra Hisingen	830	0	830	0	830		Planering	1900-01-00
N230-1975/22	Tångensskolan - Renovering av duschutrymmen	Norra Hisingen	900	0	900	8	900		Genomförande	2024-09-01
N230-1993/22	Olshammarsskolan 1-9 - Markåtgärder	Norra Hisingen	900	0	900	0	900		Inför projekt	1900-01-00
N230-1983/22	Klarebergsskolan F-3 - Byte kokgrytor	Norra Hisingen	1 000	0	1 000	0	1 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1444/21	Olshammarsskolan - Invändig renovering, målning & el	Norra Hisingen	1 100	0	1 100	72	1 100		Projektering	1900-01-00
N230-1493/21	Bärbyskolan - Renovering hus D invändigt ink armaturer	Norra Hisingen	1 200	0	1 200	0	1 200		[Pausat] Projektering	1900-01-00
N230-1987/22	Brunnsboskolan - Markåtgärder	Norra Hisingen	1 300	0	1 300	0	1 300		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-02134	Olshammarsskolan - Belysningsåtgärder	Norra Hisingen	1 350	0	1 350	0	1 350		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
N230-1982/22	Kärraskolan - Byte ventilationsaggregat	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	8	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1443/21	Tångensskolan - Byte av pelletspanna	Norra Hisingen	1 700	0	1 700	67	1 700		Projektering	1900-01-00
N230-1992/22	Ellen Keyskolan - Markåtgärder	Norra Hisingen	2 200	0	2 200	0	2 200		Projektering	1900-01-00
N230-1985/22	Klarebergsskolan F-3 - Markåtgärder	Norra Hisingen	3 500	0	3 500	0	3 500		Projektering	1900-01-00
N230-1988/22	Backaskolan - Frånkoppling media Hus E och F	Norra Hisingen	3 600	0	3 600	26	3 600		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1499/21	Bärbyskolan - Utbyte av oljepanna mot bergvärmepump	Norra Hisingen	3 000	0	3 000	431	2 993		Projektering	2024-12-04
N230-2366/21	Stora Holm -Byte av SRÖ	Norra Hisingen	1 540	0	1 540	1 450	1 508		Projektering	1900-01-00
N230-2326/21	Tångensskolan - Renovering av utemiljö	Norra Hisingen	2 200	0	2 200	2 164	2 164		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1388/21	Tångensskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 000	0	1 000	959	954		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01524	Bärbyskolan - Ducbyte	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	1	1 451		Projektplanering	2024-11-25
SFF-2023-01276	Skälltorpsskolan - Brand i omklädningsrum	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	588	1 300		Projektgenomförande: Realisering	2023-11-02
N230-1497/21	Tångensskolan - Renovering av klimatskal	Norra Hisingen	7 500	0	7 500	6 757	7 200		Produktion och avslut	2022-10-28
N230-0430/20	Brunnsboskolan - Ombyggnad omklädningsrum hus G	Norra Hisingen	6 687	0	6 687	5 403	6 158		Produktion och avslut	2023-07-06
N230-1388/21	Klarebergsskolan F-3 - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 650	0	1 650	506	646		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1295/21	Ängåsskolan-Utvändigaåtgärder, tak , fasad och fönster	Västra Göteborg	2 500	0	2 500	37	2 500	Kommer troligtvis igång 2023	[Pausat] Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2092/22	Förskola Eckragatan 36- duc-byte	Västra Göteborg	600	0	600	0	600		Genomförande	2024-12-31
N230-1293/21	Brännoskolan-Utvändiga och invändiga åtgärder	Västra Göteborg	3 850	0	3 850	3 029	3 850		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2088/22	Dalaskolan- byte av storköksmaskiner	Västra Göteborg	850	0	850	0	850		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1966/22	Ängåsskolan-Markåtgärder och lekutrustning	Västra Göteborg	950	0	950	0	950		Inför projekt	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0443/22	Lilla Fiskebäcksskolan-byte av fläkt och värmepump	Västra Göteborg	1 400	0	1 400	112	1 400		Projektering	2024-05-13
N230-1960/22	Hagenskolan-Markåtgärder och lekutrustningar	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1948/22	Dalaskolan-Invändig målning ytskikt och belysning Hus H	Västra Göteborg	2 000	0	2 000	11	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-1307/21	Nya Påvelundsskolan, markåtgärder	Västra Göteborg	2 000	0	2 000	8	2 000		Produktion och avslut	2025-05-29
N230-2274/22	Brännöskolan-Byte av in- och utvändiga belysningsarmaturer	Västra Göteborg	2 600	0	2 600	150	2 600		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1958/22	Dalaskolan-Markåtgärder, byte av lekutrustning	Västra Göteborg	2 800	0	2 800	42	2 800		Projektering	1900-01-00
N230-1947/22	Kannebäcksskolan-Invändiga åtgärder och byte av belysning	Västra Göteborg	3 500	0	3 500	8	3 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0191/22	Styrsöskolan-byte av ventilationsaggregat	Västra Göteborg	8 400	0	8 400	291	8 400		Projektering	2024-08-30
N230-1296/21	Grevegårdsskolan Hus B-Invändiga och utvändiga åtgärder	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	22	1 600	Kommer troligtvis igång 2023	[Pausat] Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1890/20	Lillebyskolan - Hus A Kök	Västra Göteborg	2 704	0	2 704	158	2 684		Projektering	1900-01-00
N230-1298/21	Kannebäcksskolan- utvändigaåtgärder, tak fasad och fönster	Västra Göteborg	7 000	0	7 000	5 806	6 874		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1388/21	Hagenskolan + Exp. pav. - Modernisering fastighetsstyrning	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	703	778		Produktion och avslut	2022-12-15
N230-2329/21	Dalaskolan - duc-byte	Västra Göteborg	1 530	0	1 530	966	964		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-02121	Nya Påvelundsskolan, Ombyggnad av Hus A, B och C	Västra Göteborg	28 000	0	28 000	4 233	27 122		Produktion och avslut	2025-05-29
N230-1388/21	Tynneredsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Västra Göteborg	2 000	0	2 000	824	1 110		Produktion och avslut	2022-12-16
N230-1388/21	Ångåsskola - Modernisering fastighetsstyrning	Västra Göteborg	1 700	0	1 700	676	628		Produktion och avslut	2022-12-15
N230-2085/21	Fiskebäcksskolan- ombyggnad av ventilation och värmesystem	Västra Göteborg	8 500	0	8 500	4 547	5 000		Produktion och avslut	2023-08-30
N230-1945/22	Högenskolan-Invändiga åtgärder och byte av belysningsarmaturer	Västra Göteborg	3 700	0	3 700	21	0		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1681/21	Hagenskolan-utvändiga åtgärder på Hus A, B,C och G	Västra Göteborg	13 000	0	13 000	8 350	8 668		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01634	Dalaskolan-renovering söderfasad Hus A	Västra Göteborg	5 800	0	5 800	1 118	0		Uppstart	1900-01-00
N230-0482/20	Näsetsskolan,konvertering av elvärme till bergvärme eller fjärrvärme	Västra Göteborg	9 000	0	9 000	0	0		[Pausat] Projektering	1900-01-00
N230-0017/21	Dalaskolan Hus B,C och D - Renovering tak, fasad och fönster	Västra Göteborg	23 000	0	23 000	12 906	13 127		Produktion och avslut	1900-01-00
0	Åkeredsskolan Reinvesteringsåtgärd skyddsrum	Västra Göteborg	502	0	502	0	502		Planering	2025-06-03
N230-1611/20	Ryaskolan - Reinvestering hus B och C	Västra Hisingen	46 999	1 329	48 328	3 996	46 991		Projektering	2025-07-01

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1940/22 SFF-2023-00123	Skutehagsskolan - Målning byte golv och belysning hus C	Västra Hisingen	2 000	1 100	3 100	22	3 100		Projektering	2024-12-01
N230-2000/22 SFF-2023-01971	Lillebyskolan - Invändig renovering hus C	Västra Hisingen	3 700	1 100	4 800	19	4 800		Projektering	2024-12-01
N230-0682/20	Skutehagen skola - Byte pelletspanna	Västra Hisingen	1 500	450	1 950	1 886	1 945		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1492/21	Trulsegårdsskolan - Byte av styr 3 ducar enligt lista "LPÅ-nomineringar".	Västra Hisingen	540	330	870	798	798		Projektering	1900-01-00
N230-2218/21	Svartedalsskolan - Återställning efter vattenskada	Västra Hisingen	250	250	500	451	550		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0725/15	Jättestensskolan - Byte av ventilation i kök	Västra Hisingen	1 900	0	1 900	5 094	5 113	avvikelse är initiserad	Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00602	Svartedalsskolan - Vattenskada från NO sal	Västra Hisingen	300	0	300	783	1 117	avvikelse är initiserad	Genomförande	1900-01-00
N230-1700/20	Sjumilaskolan - Golv i korridorer hus A	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	1 898	2 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1470/21	Sjumilaskolan - Byte av klinkergolv i hus A	Västra Hisingen	3 500	0	3 500	3 236	3 500		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00455	Sjumilaskolan - anpassning skolgård	Västra Hisingen	3 000	0	3 000	2 706	3 000		Projektplanering	1900-01-00
N230-2044/22	Trulsegårdsskolan - Dränering av gräsyta	Västra Hisingen	600	0	600	0	600		Inför projekt	1900-01-00
N230-2251/21	Skutehagsskolan - Byte av vent LB01 & LB8-10	Västra Hisingen	4 500	0	4 500	240	4 500		Projektering	1900-01-00
N230-0217/22	Ryaskolan - Reinvestering mark	Västra Hisingen	5 900	0	5 900	564	5 900		Projektering	2028-05-30
N230-2249/21	Sjumilaskolan - Byte av fönster och dörrar	Västra Hisingen	15 000	0	15 000	276	15 000		Projektering	1900-01-00
N230-0209/22										
N230-1462/21	Skutehagsskolan - Byte av lekutrustning och renovering av gård	Västra Hisingen	25 500	0	25 500	3 874	25 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0771/21	Ryaskolan - Byte av styr hus A, B och C	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	1 242	1 500		Genomförande i huvudprojektet	2022-11-30
N230-1301/21	Hagenskolan-värme och ventilationsåtgärder	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	1 362	1 984		Produktion och avslut	2024-06-03
N230-0611/22	Nordlyckeskolan - Byte av spillvattenrör	Västra Hisingen	600	0	600	382	382		Genomförande	1900-01-00
N230-2247/21	Sjumilaskolan - Byte av all styr	Västra Hisingen	2 500	0	2 500	1 917	2 114		Projektering	1900-01-00
N230-1803/20	Lillebyskolan - Underhåll av klimatskal	Västra Hisingen	6 700	0	6 700	4 976	5 950		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2319/21	Ånässkolan - Byte av belysning	Örgryte-Härlanda	4 500	1 000	5 500	158	5 396		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01075	Torpaskolan - Invändig renovering	Örgryte-Härlanda	4 500	0	4 500	788	45 000	Fördjupad utredning pågår, genomförandestart under 2024/2025	Projektering	2026-11-25
N230-0579/22	Torpaskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Örgryte-Härlanda	1 200	0	1 200	28	1 204		Genomförande	2025-01-31
N230-1865/22	Kålltorpsskolan - Hissrenovering 24	Örgryte-Härlanda	750	0	750	0	750		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1864/22	Nya Lundensskolan - Fettavskiljare	Örgryte-Härlanda	1 000	0	1 000	0	1 000		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-00951	Bagaregårdsskolan - Kunduppdrag anpassning suterrängplan	Örgryte-Härlanda	1 045	0	1 045	0	1 045		Uppstart	1900-01-00
N 230-1968/22	Böskolan EL-underhåll - PU 2024	Örgryte-Härlanda	4 500	0	4 500	0	4 500		Projektering	2024-11-30

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1895/22	Ånässkolan - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	5 000	0	5 000	307	5 000		Genomförande	1900-01-00
N230-1060/21	Kärralundsskolan - Utvändiga åtgärder	Örgryte-Härlanda	6 000	0	6 000	298	6 000		Projektering	2024-10-31
N230-1863/22	Kärralundsskolan - Dränering	Örgryte-Härlanda	6 700	0	6 700	103	6 700		Projektering	1900-01-00
N230-1867/22	Ånässkolan - Dränering	Örgryte-Härlanda	7 300	0	7 300	342	7 300		Projektering	1900-01-00
N230-1866/22	Bagaregårdsskolan - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	9 000	0	9 000	32	9 000		Projektering	1900-01-00
N230-2153/22 SFF-2023-00578	Torpaskolan - Dränering och markåtgärder	Örgryte-Härlanda	15 000	0	15 000	297	15 000		Projektering	1900-01-00
N230-2311/21	Bagaregårdsskolan - Invändig renovering	Örgryte-Härlanda	8 500	0	8 500	105	8 500		Projektering	2024-08-30
N230-0684/17	Bagaregårdsskolan - Klimat- och energiförbättring	Örgryte-Härlanda	10 500	0	10 500	6 673	10 418		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2321/21	Kärralundsskolan - Byte av duc	Örgryte-Härlanda	1 100	0	1 100	413	866		Projektering	1900-01-00
N230-1388/21	Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning	Örgryte-Härlanda	2 000	0	2 000	1 399	1 567		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1794/22	Kålltorpsskolan - Byte ventilationsaggregat	Örgryte-Härlanda	1 300	0	1 300	0	800		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1055/21	Nya Lundensskolan - Invändiga åtgärder HUS C gymnastiken	Örgryte-Härlanda	5 000	0	5 000	1 119	4 500		Projektering	2024-03-01
N230-2312/21	Nya Lundensskolan - Byte av duc	Örgryte-Härlanda	2 400	0	2 400	803	857		Projektering	1900-01-00
N230-2320/21	Kålltorpsskolan - Byte av belysning 23	Örgryte-Härlanda	5 000	0	5 000	498	5		Projektering	1900-01-00
N230-0187/12	Gårdsåsskolan - Reinvesteringsåtgärder i samband med LS projekt	Östra Göteborg	85 000	10 000	95 000	86 835	95 001		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0366/17	Sandeklevsskolan - Hus A kompletterande åtgärder	Östra Göteborg	9 920	4 650	14 570	14 319	14 534		Genomförande	1900-01-00
N230-0366/17	Sandeklevsskolan - Hus A ventilation, belysning och invändig renovering	Östra Göteborg	7 350	2 950	10 300	10 294	10 300		Genomförande	1900-01-00
NYTT diarienummer N230-1546/22 / GAMMALT diariennr N230-0567/18	Gårdsmosseskolan - energisparåtgärder	Östra Göteborg	2 350	1 650	4 000	3 348	4 000		Produktion och avslut	2023-10-16
N230-1059/21	Talldungeskolan - Fönsterbyte hus A	Östra Göteborg	6 400	1 160	7 560	7 531	7 560		Produktion och avslut	2023-09-19
N230-1970/22	Ramsdalsskolan - Varukyla	Östra Göteborg	750	0	750	0	750		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1220/22	Gårdsåsskolan – Tillkommande åtgärder i skyddsrum i samband med SLK projekt-ska vara underprojekt	Östra Göteborg	920	0	920	138	920		Projektering	2023-11-30
N230-1788/22	Fjällboskolan - Byte ventilationsaggregat	Östra Göteborg	1 000	0	1 000	0	1 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2322/21	Sandeklevsskolan - Markåtgärder	Östra Göteborg	1 200	0	1 200	0	1 200		Projektering	1900-01-00
N230-2015/22	Nylöseskolan/Brandströmska - Takåtgärder	Östra Göteborg	1 400	0	1 400	0	1 400		Uppdragsstart	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1787/22	Ramsdalsskolan - Byte ventilationsaggregat	Östra Göteborg	1 700	0	1 700	13	1 700		Projektering	1900-01-00
N 230- 1967/22	Assaredsskolan - Utvändig belysning byte 24*	Östra Göteborg	1 700	0	1 700	0	1 700		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2309/21	Bergsjöskolan - Renovering hemkunskapssalen	Östra Göteborg	3 500	0	3 500	259	3 500		Projektering	2024-10-06
N230-1731/22	Gårdsmosseskolan - Dränering	Östra Göteborg	4 600	0	4 600	24	4 600		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-00676	Gårdsåsskolan - Tillkommande åtgärder bla omdränering i samband med SLK projekt hus A	Östra Göteborg	9 840	0	9 840	5 000	9 840		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-1724/22	Backegårdsskolan - Undertak och belysning	Östra Göteborg	5 000	0	5 000	0	5 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2007/22	Nylöseskolan/Branströmska EL-underhåll 24	Östra Göteborg	5 000	0	5 000	0	5 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1942/22	Utmarksskolan - Invändiga åtgärder hus F	Östra Göteborg	6 000	0	6 000	109	6 000		Projektering	2024-12-31
N230-1790/22	Mossbergsga friluftsskolan - Dränering	Östra Göteborg	6 300	0	6 300	23	6 300		Projektering	1900-01-00
N230-1789/22	Fjällboskolan - Dränering	Östra Göteborg	6 800	0	6 800	243	6 800		Projektering	1900-01-00
N230-1791/22	Mossbergsga friluftsskolan - Invändiga åtgärder + fönster	Östra Göteborg	7 000	0	7 000	2	7 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1729/22	Sandeklevsskolan - Dränering och markåtgärder	Östra Göteborg	8 000	0	8 000	20	8 000		Projektering	1900-01-00
N230-1733/22	Utmarksskolan - Tak och fasad hus A	Östra Göteborg	9 500	0	9 500	0	9 500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1732/22 SFF- 2023-00579	Talldungeskolan - Dränering	Östra Göteborg	11 300	0	11 300	267	11 300		Projektering	1900-01-00
N230-2308/21	Utbynässkolan - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	2 500	0	2 500	98	2 499	avvikelse är initiserad	Projektering	1900-01-00
N230-0553/21	Solbackeskolan - VVS	Östra Göteborg	4 200	0	4 200	414	4 084		Projektering	1900-01-00
N230-0663/20	Solbackeskolan - Styrning, reglering och övervakning	Östra Göteborg	1 600	0	1 600	16	1 107		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00362	Bergsjöskolan - anpassning utemiljö	Östra Göteborg	6 800	0	6 800	6 080	6 080		Projektplanering	1900-01-00
230-1626/22	Nylöseskolan/Brandsrömska byte hiss	Östra Göteborg	1 500	0	1 500	19	500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2304/21	Fjällboskolan - SRÖ	Östra Göteborg	1 800	0	1 800	556	773		Projektering	1900-01-00
N230-2302/21	Utmarksskolan - Ventilation Hus F och D	Östra Göteborg	3 000	0	3 000	74	1 673		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2313/21	Talldungeskolan - Invändiga åtgärder	Östra Göteborg	8 500	0	8 500	3 236	3 500		Produktion och avslut	2023-08-11

Projektportfölj inhyrning, gymnasie- och grundskolefastigheter 2023-10-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)
Förskola	150	969	150
Gymnasie- och grundskola	11 677	2 405	977
Summa utbildningsportföljen	11 827	3 374	1 127
BMSS	230	152	0
ÄVO	1 363	248	0
Övrigt	1 225	420	0
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	2 818	820	0
Summa totalt båda portföljerna	14 645	4 194	1 127

**Uppgift om budget och prognos saknas i flera av projekten, uppdatering av information pågår i enheterna*

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan	0	1	3	4	2	1	11
Gymnasie- och grundskola	1	0	3	10	3	0	17
BMSS	1	0	0	2	0	0	3
ÄVO	1	2	2	0	0	1	6
Övrigt	2	3	2	4	0	2	13
Summa antal	5	6	10	20	5	4	50

Prio	Förklaring av prioritering - Hela staden perspektiv
5	Är i produktion/ avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-0444/20	Angeredsvinkeln idrottshall	Angered	0	0	0	167		0 Beslut om genomförande i SFN oktober, kontraktswärde 43 230 tkr	Förstudie	2025-02-28	2
230-1618/21	Rävebergsskolan provisorisk expansion	Angered	0	0	0	105		0 Projektet avbryts och faktureras GSF	[Avbrutet] Förstudie	2022-08-08	3
230-1391/21	Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	22		0	Förstudie	1900-01-00	3
2025/21	Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) ersättningslokaler	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	159		0	Uppdragsstart	2024-05-02	2
2023-00148	Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar	Centrum	0	0	0	33		0	Förstudie	1900-01-00	2
SFF 2023-01091	Odinsskolan - Högstadium	Centrum	737	0	737	290		310 Projektet avbryts, fastigheten såld till Hemsö	Förstudie	1900-01-00	1
230-0557/20	Gustaviskolan ytterligare lokaler	Interna projekt, Centrum	0	0	0	126		0	Förstudie	2024-06-27	2
SFF-2023-02061	Bräckeskolan - inhyrning evakueringslokaler	Lundby	0	0	0	0		0	Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
230-1527/21	Centrala Hisingen utbildningslokaler för grundskolor	Lundby	0	0	0	30		0	[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00	1
230-0789/18	Tolken på Lindholmen anpassning	Lundby	0	0	0	339		0	Förstudie	1900-01-00	2
N230-0862/19	Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal	Majorna-Linné	0	0	0	140		0 Projektet avbryts och faktureras GSF	[Pausat] Förstudie	1900-01-00	2
0197/22	Kärre C 16-19 verksamhetsanpassning och omförhandling av hyresavtal	Norra Hisingen	0	0	0	173		0	Överlämnande/Avslut	2023-05-30	5
1224/22	Utredning ny F-6-skola Backaplan	Norra Hisingen	0	0	0	14		0	Uppdragsstart	1900-01-00	2
SFF-2023-00619 230-1650/21	Bärbyskolan - Provisorisk expansion	Norra Hisingen	10 940	0	10 940	584		584 Projektet avbryts och faktureras GSF	[Avbrutet] Projektering	2024-01-10	3

0373/22	Torslandavallen evakueringspaviljonger	Västra Hisingen	0	0	0	83	83 Projektet avbryts och faktureras GSF	[Avbrutet] Uppdragsstart	1900-01-00	2
1145/22	Skårsskolan tillfälliga lokaler	Örgryte-Härlanda	0	0	0	50	0	[Pausat] Förstudie	1900-01-00	1
2023-00355	Gamlestadsvägen 18 skolbibliotekscentral	Östra Göteborg	0	0	0	89	0	Förstudie	2023-12-15	2
