



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-26

Diarienummer SFF-2023-00179

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se

Projektportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 2024

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för projektportföljen gymnasie- och grundskolefastigheter.
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för gymnasie- och grundskola i sin helhet enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om leverans och tollgateplan för grundskoleprojekt under 2024 enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande

Sammanfattning

Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi för gymnasie- och grundskolefastigheter.

- Generell överkapacitet av grundskoleplatser i nutid och närtid, men utmaningar att tillgodose behoven i de centrala delarna av centrum och Hisingen.
- Fortsatt behov av fler platser för anpassad grundskola (grundsärskola). Löpande samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Stadsfastighetsförvaltningen pågår för att hitta lämpliga lösningar som tillgodoser behoven.
- Färre grundskoleplatser än beräknat kommer att levereras fram till och med 2027. Enligt prognos kommer vi att leverera 6 279 platser, jämfört med 7 702 platser. I huvudsak beror det på att Grundskolenämnden har begärt att Stadsfastighetsförvaltningen tillsammans med Grundskoleförvaltningen ser över projektkostnaden för ett större projekt, vilket gör att projektet kommer att levereras vid ett senare tillfälle, samt att ytterligare ett större byggprojekt har avbrutits på grund av omtag i detaljplanearbetet.
- Prognosen visar också att vi kommer att leverera 1 219 platser i stället för 693 under 2024, det vill säga fler platser än beräknat. Orsaken är att ett projekt med 56 tillskapade platser har tillkommit och att ett större projekt med 470 platser kommer att levereras ett år tidigare än beräknat i investeringsnomineringarna för 2024.
- Vi har fått nya riktlinjer för friytor för förskola och grundskola, man har sänkt kraven för friyta i innerstaden vilket innebär att det kommer att bli enklare att bygga där, men samtidigt ökat kraven för friyta i ytterstaden vilket i sin tur innebär att vi får problem i en del projekt. Översyn pågår för pågående projekt.

- Portföljen för gymnasie- och grundskolan består av sammantaget 374 projekt, varav 87 nyinvesteringsprojekt, 272 reinvesteringsprojekt och 15 inhyrningsprojekt.
- Beslutad budget uppgår till 6 013 mnkr och prognosen till 6 180 mnkr, vilket indikerar kommande ekonomiska avvikelser inom flera projekt.
- Totalt har 56 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 382 mnkr
- Nyinvesteringskostnaden för projekt som har beräknad slutbesiktning under 2023 är lägre jämfört med 2022 och 2021, men ökar under 2024 och 2025.
- Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 105 mnkr
- Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leverans anses god.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. Likaså har internräntan som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader gått upp från 1 till 2,25 procent. Inflationen påverkar nyckeltalen framåt och projektkalkylerna ligger högt jämfört med de skolor som framställts hitintills. Höga transport- och energikostnader samt materialbrist är faktorer som direkt påverkar byggsektorn.

Det har medfört en påtaglig hyreshöjning för stadsfastigheters hyresgäster. Göteborgs Stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget. De ökade nyckeltalen medför att beställande nämnd återremitterar ärenden för kostnadseffektiviserande åtgärder. Höga projektkostnader leder även till att tidsplanen för genomförandet skjuts framåt i tiden eftersom analys och avvikelsehantering kommer krävas. Det är därför av största vikt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att i största möjliga mån hålla nere kostnaderna. Det kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet vilket idag sker i portföljernas styrgrupper. Stadsfastigheter har en uttalad ambition att tillhandahålla fastigheter som möter hyresgästernas behov till lägsta möjliga självkostnad. Det ska uppnås genom att agera som en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och förvaltning. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att sänka produktionskostnaderna som kommer att presenteras under våren 2024.

Bedömning ur ekologisk dimension

Implementeringen av de årliga planerna för minskad klimatpåverkan i byggprojekt har bidragit till att närma oss stadens klimatmål, men en halverad klimatpåverkan i all nybyggnation bedöms uppnås först 2027–2028. Vår bedömning är att vi kan nå 70 procent minskad klimatpåverkan i nybyggnation till 2030 med teknik som bedöms finnas tillgänglig på marknaden detta år. För att nå 90 procent minskad klimatpåverkan för ny- och ombyggnation på totalen krävs att vi undviker att riva och bygga nytt i möjligaste mån och troligen även någon form av kompensatorisk åtgärd.

Stadsfastighetsförvaltningen saknar idag krav på klimatberäkningar för ombyggnationer. Det är svårare i och med att projekten skiljer sig mycket åt. Vi har inte någon referensnivå att jämföra med i dessa projekt. Samarbete pågår med Framtiden byggutveckling kring ett klimatberäkningsverktyg i ROT-projekt.

Utbildningslokaler med klimatkrav som färdigställdes 2023 har i genomsnitt ca 25 % lägre klimatpåverkan än referensnivån 2020. Projekterade utbildningslokaler 2023, som väntas färdigställas omkring 2024-2025, beräknas i genomsnitt ha 40 % lägre klimatpåverkan än referensnivån.

Sen tidigare vet vi att det går att leva upp till en halverad klimatpåverkan för förskolor i och med genomförandet av första Hoppet-förskolan på Backa Kyrkogata 11. Nu vet vi att det är möjligt att nå ännu längre om vi kan bevara stora byggdelar såsom grund och stomme. Förskolan på Friedländersgata, där bottenplattan återbrukas, beräknas ha ungefär 70 % lägre klimatpåverkan än referensnivån 2020.

I klimatbudgetprojektet Nya Gårdstensskolan har tidiga klimatberäkningar genomförts som visar att det går att leva upp till klimatbudgeten för grundskolor. En klimatberäkning för tillhörande idrottshall visar att det är möjligt att nå nära en halverad klimatpåverkan jämfört med Boverkets schabloner (vi saknar egna referensvärden för idrottshallar). Inom planerna för minskad klimatpåverkan ingår sammanlagt nio förskoleprojekt och åtta grundskoleprojekt som arbetar utefter en klimatbudget.

Utöver detta jobbar fyra förskolor och två grundskolor med betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan, fyra förskolor med cellglasgrund och tre förskolor preliminärt med utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Därtill ingår flera förskolor och grundskolor med återbruksfokus inklusive en förlängningsrenovering av en förskola med fokus på återbruk av installationer. Från och med planen 2023 ska samtliga förskole- och grundskoleprojekt som har befintliga byggnader på tomten jobba med återbruk enligt en höjd lägsta nivå.

Sammanfattningsvis bidrar portföljen till att målen nås.

Bedömning ur social dimension

Sjumilaskolan, anpassning av skolgård är genomförd. Omfattning av projektet kommer från elevinflytande på Sjumilaskolan kring hur skolgårdsområdet kan nyttjas. Bland annat har eleverna önskat ytor för att kunna sitta och koppla av på, ytor för dans och spela teater, fler ytor för gungor och verksamheten önskar en samlingsplats utomhus då det idag saknas på skolan. I socialt utsatta områden blir skolor och skolgårdar särskilt viktiga eftersom många är trångbodda med torftiga gårdar mellan husen och få har egna trädgårdar med möjlighet till lek och rekreation. Även detta perspektiv är en del av Stadens bidrag för att motverka skillnader i livsvillkor och hälsa utifrån Jämlig stad.

Förstudier har startats för Högsbogårdsskolan och Torpaskolan. Förstudierna avser verksamhetsanpassningar i samband med reinvesteringar. Det man kommer att utreda är framför allt tillgänglighetsanpassningar, men även förstärkta ljuskällor ljudisolering, stegljuddämpande golvmattor

På Bergsgårdsskolan har en förändrad elevsammansättning med en förändrad tyngdpunkt mot yngre barn. Projektet håller på just nu att genomföras med anpassad utemiljö och förbättrad tillgänglighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-03-18).

Bilagor


1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter
 - 1.1. Nyinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2024-02-12)
 - 1.2. Re- och ersättningsinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2024-02-12)
 - 1.3. Inhyrning gymnasie- och grundskola (daterad 2024-02-12)
2. Leverans och tollgateplan för grundskoleprojekt under 2024

Ärendet

Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskolefastigheter. Ärendet omfattar detaljerad information om antal pågående projekt, planerade leveranser samt portföljens ekonomi. Portföljen omfattar nyinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt.


Beskrivning av ärendet

Övergripande gymnasiet och grundskoleportföljen

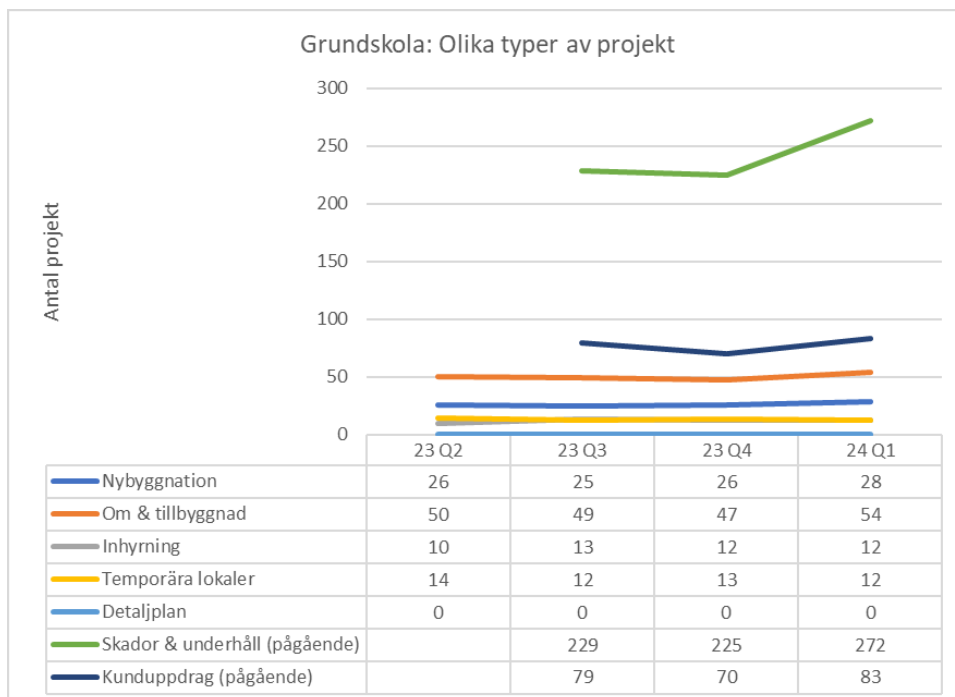

Antal nybyggnationsprojekt ligger på en jämn nivå över tid, däremot är det en ökning av om- och tillbyggnadsprojekt sedan årsskiftet, där det i de flesta fall är mindre verksamhetsanpassningar. Flertalet av verksamhetsanpassningarna syftar till att öka kapaciteten i kök och matsalar i ett flertal skolor.

Vi ser en ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat underhåll, vilket är helt normalt eftersom vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som kommer att genomföras under 2024/2025. Det är också en uppgång av antal kunduppdrag som har beställts av Grundskoleförvaltningen.

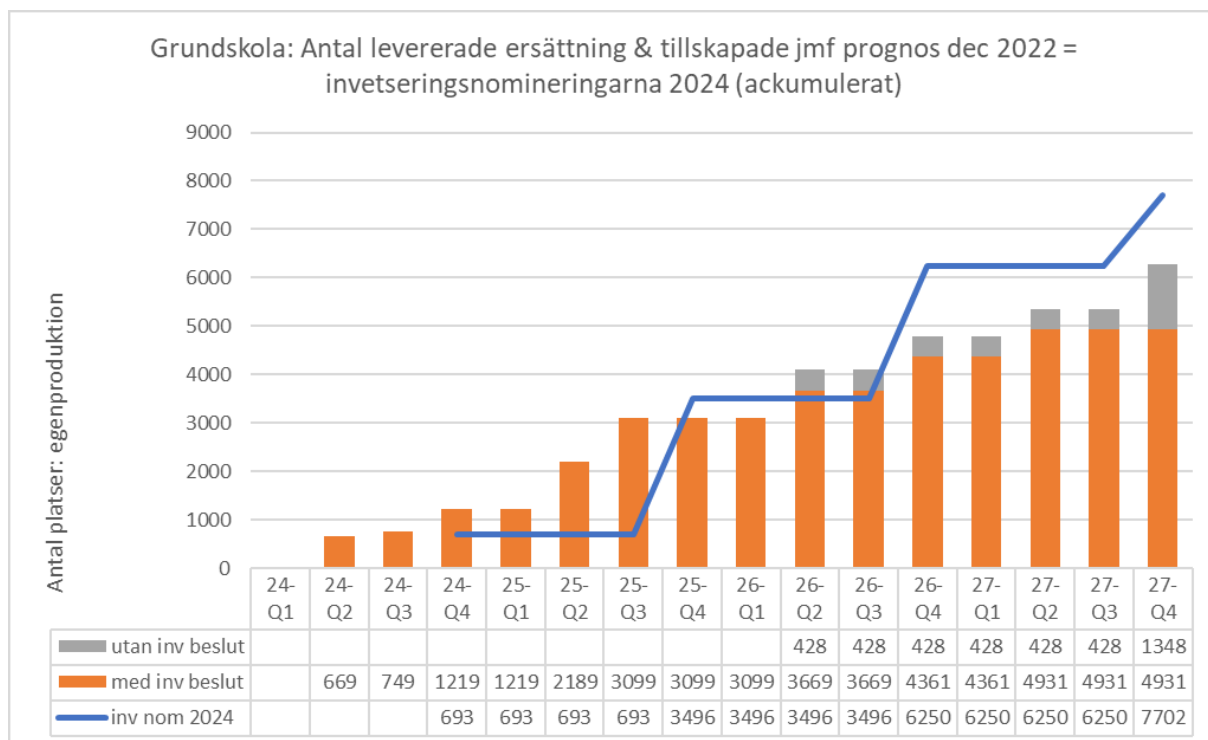

Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat. Projekt utan investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker. I grafen ingår både ersättningsplatser och tillskapade platser.

Färre platser än beräknat kommer att levereras fram till och med 2027, jämfört med prognos per december 2022, de vill säga investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 6 279 platser, jämfört med 7 702 platser. Orsakerna listas nedan.

GSF har valt att avbryta Olshammarsskolan anpassad grundskola, som skulle ha tillskapat 25 platser under 2025.


Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall, har avbrutits på grund av omtag i detaljplanearbetet. Brudbergsskolan skulle ha levererat 760 tillskapade platser 2025.

Vättnedalsskolan var planerat att leverera 570 platser 2026, men Grundskolenämnden har begärt att Stadsfastighetsförvaltningen tillsammans med Grundskoleförvaltningen ser över projektkostnaden, vilket gör att projektet kommer att levereras vid ett senare tillfälle.

Dessutom har antal platser justerats ned något i några av de övriga projekten.

Prognosen visar också att vi kommer att leverera 1 219 platser i stället för 693 under 2024, det vill säga fler platser än beräknat. Orsaken är att Styröskolan med 56 tillskapade platser har tillkommit och att Askimsskolan med 470 platser kommer att levereras ett år tidigare än beräknat i investeringsnomineringarna för 2024.

Stadsfastighetsförvaltningen har löpande dialog med grundskoleförvaltningen om att säkerställa behovet av platser.

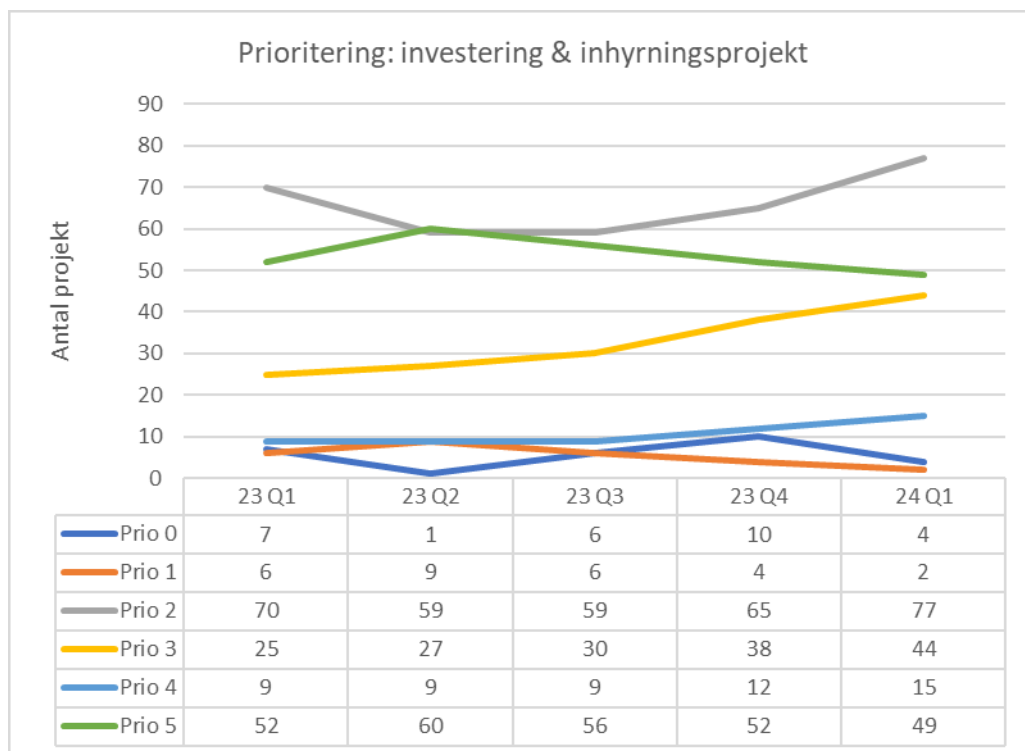

I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt, inklusive temporära lokaler, för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs förskola, grundskola & gymnasie.

Prioritetsnivå	Hela staden-perspektiv
5	Är i produktion / avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt.
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Antal högt prioriterade projekt ökar, vilket innebär projekt med prioritet 3 och 4, samtidigt som antal lågt prioriterade projekt med prioritet 1 minskar.

I nuläget har grundskolan merparten av projekt med prioritet 4, 11 projekt av 14, det vill säga projekt med högsta prioritet. Projekten med högst prioritet kan delas in i två kategorier, en kategori är evakuering på grund av om och tillbyggnad i ordinarie skollokaler, den andra är mindre

verksamhetsanpassningar. Hälften av verksamhetsanpassningarna, det vill säga fyra projekt, är att utöka antal platser för anpassad grundskola, det som tidigare benämndes som särskola.


Utbildningsförvaltningen har ett projekt med den högsta prioriteringen. Det är en interimslösning för att på kort tid tillskapa platser för anpassad gymnasieskolan vid Stora Holm. Detta innan permanenta lokaler står klara för att möta det ökande behovet av platser på det individuella programmet.

Löpande dialog förs med kundförvaltningar, där prioritering sätts när kundförvaltningen beställer in projekt, och på prioriteringsmöten med kundförvaltning. På prioriteringsmötet fångas det upp om projekt behöver en annan prioritet, jämfört med det projektet hade när det en gång beställdes. Vi ser ännu ingen större risk med att antalet högt prioriterade projekt ökar men bevakar frågan.

Ekonomi

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti.

Ny- och reinvesteringar samt inhyrningsprojekt

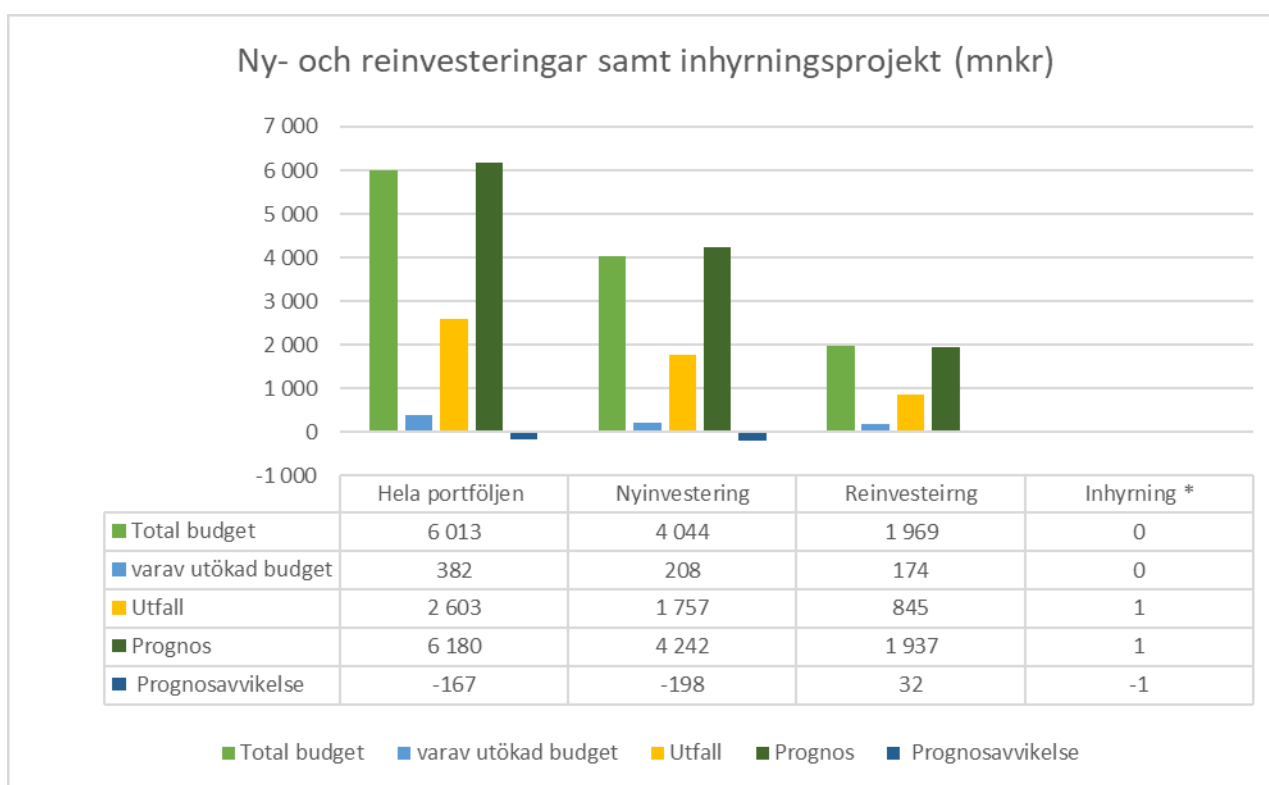

Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna 1:1, 1:2 och 1:3

* Indata för budget och prognos saknas för inhyrningsprojekten


Portföljen för gymnasie- och grundskolan består av sammantaget 374 projekt varav 87 nyinvesteringsprojekt, 272 reinvesteringsprojekt och 15 inhyrningsprojekt. Totalt för portföljen finns ett upparbetat utfall om 2 603 mnkr vilket motsvarar 42 procent av total prognos. Inom nyinvestering uppgår upparbetat utfall mot prognos till 41 procent och inom reinvesteringsportföljen till 44 procent. Avvikelsen mellan upparbetat utfall och prognos beror på att projekten befinner sig i olika faser, några är i uppstart, vissa ska snart avslutas medan andra strax ska påbörja projektering. Detta ses som helt

normalt inom portföljen.


Inom inhyringsportföljen saknas uppgift om både budget och prognos vilket medfört att redovisad prognos är lagd utifrån upparbetat utfall. Det innebär att ingen korrekt ekonomisk information kan räknas fram. Arbetet med att se över rutiner för inhyringsprojekten kommer ske under våren.

Beslutad budgeten för hela portföljen uppgår till 6 013 mnkr. Prognosen för portföljen är 6 180 mnkr vilket är drygt 170 mnkr högre än beslutad budget. Sett per enskilt projekt finns det i dagsläget negativa prognosavvikelser i ett 36 projekt motsvarande närmare 350 mnkr. Det finns även ett hundratals projekt som avviker positivt mot prognos vilket kompenserar underskottet som helhet. Flera av de större prognosavvikelserna medför sannolikt kommande ärenden för stadsfastighetsnämnden att ta ställning till, främst inom nyinvestering. Likaså avviker ett tiotal projekt redan nu i utfall mot beslutad budget, vilket innebär att dessa håller på att hanteras eller kommer hanteras inom det närmaste. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1:1 och 1:2 och 1:3.

Skälen till avvikelsen mellan budget och prognos varierar men en bidragande anledning är rådande marknadsläge med ökade produktionskostnader. Arbeta med att identifiera orsak till avvikelsena har genomförts under året. Åtgärder kopplat till avvikelsena kommer adresseras och mynna ut i en strategi under våren 2024.

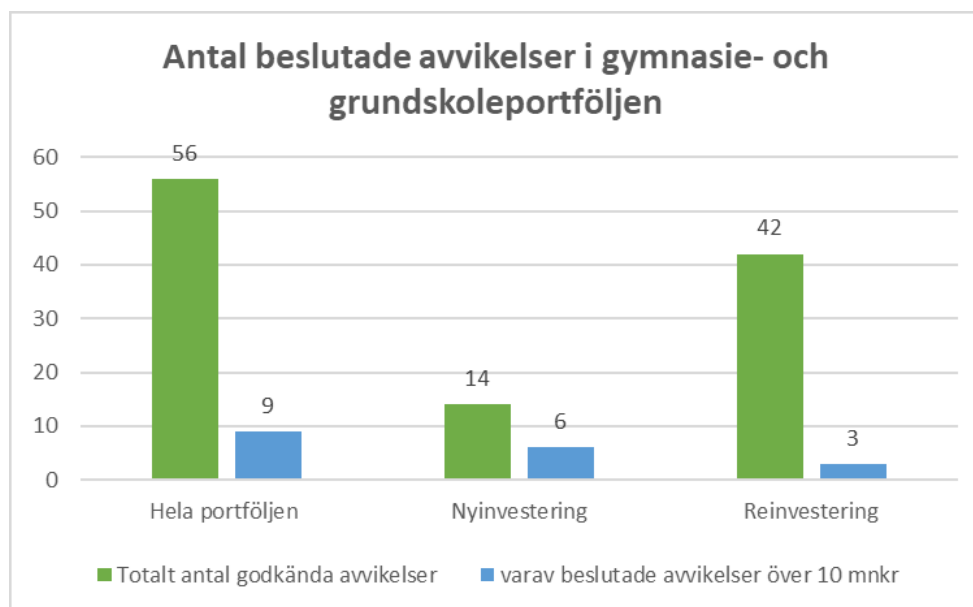


Sammanlagt har 56 budgetavvikelser om totalt 382 mnkr godkänts i portföljerna, antingen av nämnd eller på delegation. Av avvikelsena i portföljen som godkänts överstiger 9 av dem 10 mnkr. Större delen av antal avvikelser är mindre avvikelser i reinvesteringsprojekt som tas på delegation. Procentuellt har 15 procent av portföljens projekt avvikelshanteras. I nuläget ser förvaltningen att färre avvikelser hanteras jämfört med tidigare rapportering.

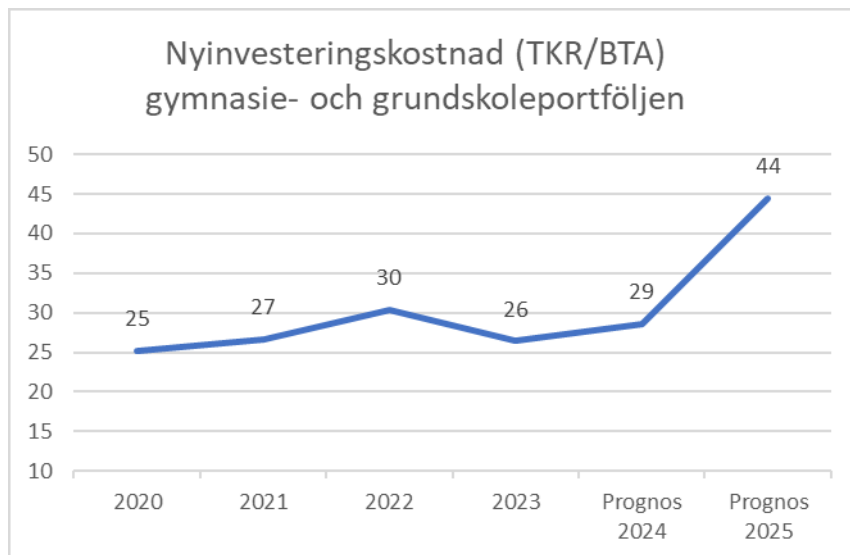

Grafen visar utvecklingen av grundskolans nyinvesteringskostnad per bruttoarea. Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020-2022, samt på prognos för projekt som slutbesiktigats under 2023. Kostnaden per bruttoarea ökade under 2022 för att sedan falla tillbaka under 2023. Ett antagande är att berörda projekt upphandlades under 2020 i samband med pandemins start, en markansmässig instabil tid med mycket spekulationer. Det påverkade marknaden och anbudet blev högre. En ytterligare faktor är att endast två projekt slutbesiktigades under 2022 vilket gör underlaget mer känsligt om något projekt sticker ut. I detta fall är ett av projekten av mindre karaktär (jämfört med en hel skola) vilket innebär att alla "dyra" installationer såsom storkök etc. fördelas på färre kvm, vilket påverkar KR/BTA.

Prognosen för 2025 är än så länge betydligt högre än tidigare år, dels på grund av att endast ett projekt, Internationella skolan har planerat slutbesiktning aktuellt år. Dels för att projektet är förhållandevis kostsamt vilket kan härledas till att skolan ligger på en tomt med flera omkringliggande byggnader i centrum, vilket har krävt omfattande sprängningsarbeten.

Investeringsrelaterade driftskostnader

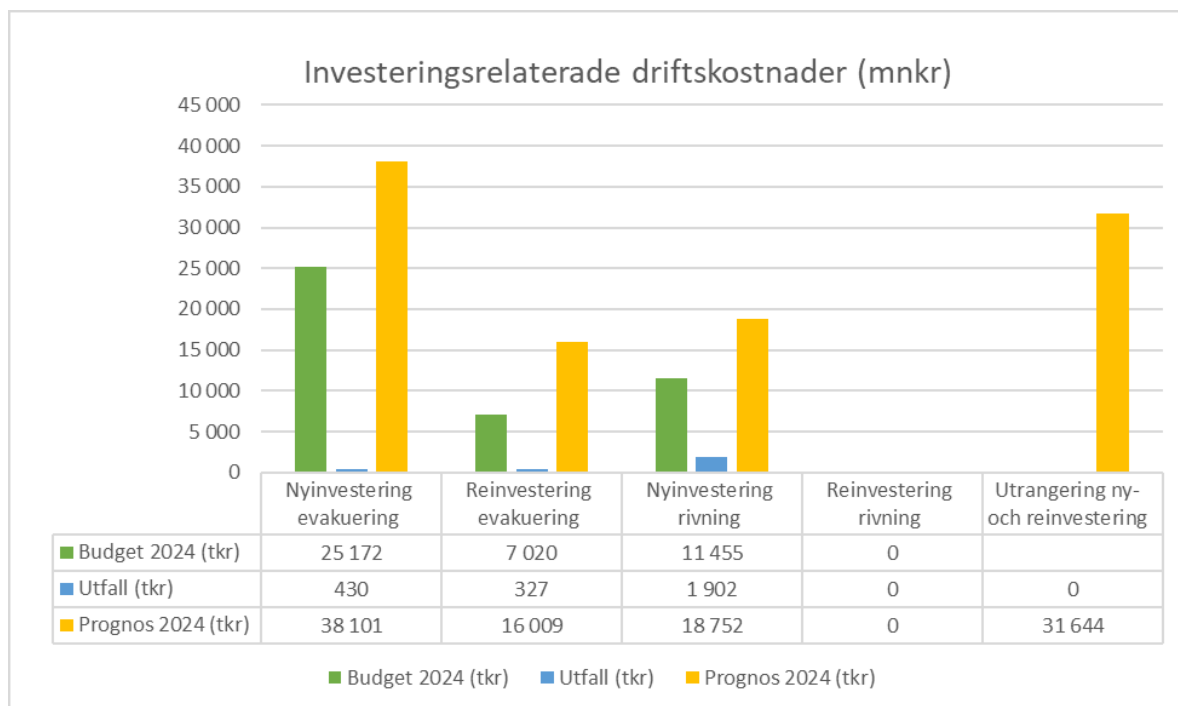

Totalt prognos för 2024 för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår i dagsläget till 105 mnkr och utfallet uppgår till 2,7 mnkr. Under 2023 uppgick kostnadsutfallet inklusive utrangeringar till 80 mnkr. Förvaltningen ser en succesiv ökning under de senaste åren vilket rimmar med byggkostnadsindex. Det är fortfarande tidigt på året och arbetet med att uppdatera aktuella prognoser är fortlöpande vilket innebär att den prognosticerade volymen kan komma att öka. Större under året kommande projekt är evakuering och rivning av Gunnestorpsskolan samt evakuering, rivning och utrangering av Noleredsskolan. Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande nämnd vid årets slut utifrån självkostnadshyresprincipen.

Förvaltningens bedömning

Måluppfyllelsen för portföljen avseende leverans anses god.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

Projektportfölj nyinvestering, gymnasie- och grundskolefastigheter 2024-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	1 071	533	1 046
Gymnasie- och grundskola	4 044	1 757	4 242
Summa utbildningsportföljen	5 115	2 290	5 288
BMSS	594	109	517
ÄVO	239	71	234
Övrigt***	170	54	166
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	1 003	234	917
Summa totalt båda portföljerna	6 118	2 525	6 205

*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti.

**De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget

*** I övrigt ingår solcellsprojekten med en budget och prognos på 50 mnkr

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan	14	2	17	28	1	1	63
Gymnasie- och grundskolan	23	8	22	30	1	3	87
BMSS	4		10	18		2	34
ÄVO	2	1	5	1	1		10
Övrigt	1		1	4		54	60
Summa antal	44	11	55	81	3	60	254

Prio	Förklaring av prioritering - Hela staden perspektiv
5	Är i produktion/ avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-00723	Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö	Angered	7 000	0	7 000	730	6 922		Projektgenomförande: Etablering	2024-06-13	3
2199/22 NYTT: SFF-2023-00475	Bergumsskolan F-9 verksamhetsanpassningar	Angered	750	0	750	466	750		Förstudie	2025-12-19	3
230-1019/18, SFF-2023-00438	Eriksboskolan F-6 nybyggnad	Angered	6 500	5 500	12 000	11 778	12 008	Beslut bordlagt i KF 29 februari 2024	Program och projektering	2026-05-25	2
230-0477/15	Gunnilse ny grundskola 4-9 vid Gunnilse centrum (Reviderat uppdrag)	Angered	0	0	0	3	0	Tidigt skede, avvikelse initierad	Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-03150	Långmosseskolan F-3, anpassningar anpassad grundskola	Angered	500	0	500	8	500		Inkommet uppdrag	1900-01-00	4
230-0201/18 & SFF-2023-010 99	Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad	Angered	285 000	0	285 000	22 377	395 913	Arbetet med att sänka produktionskostnad pågår	Program och projektering	2026-12-15	2
230-0201/18	Nya Gårdstensskolan idrottshall	Angered	0	0	0	754	117 596	Projektet kommer att avvikelsehanteras i nämnd i samband med att huvudprojektet (se ovan rad) tas upp.	Uppstart	1900-01-00	3
1618/21	Rävebergsskolan F-3 utredning matsal	Angered	0	0	0	79	79	Avvaktar avstämning med GSF om projetet ska genomföras, annars faktureras verksamhten	Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-00755	Askimskolan ny -ombyggnad	Askim-Frölunda-Högsbo	228 000	0	228 000	106 915	254 100	Prognos högre än budget, har passerat styrgrupp, planerad avvikelsehantering i aprilnämnd.	Produktion	2025-12-22	5
2023-01464	Frölundaskolan dörrbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	2 240	0	2 240	305	2 240		Program och projektering	1900-01-00	4
2212/21	Frölundaskolan hus F - ombyggnad till grundsärskola	Askim-Frölunda-Högsbo	5 000	3 850	8 850	8 742	8 850	Avslutas ekonomiskt inom kort.	Avslut projekt	2022-12-21	5
230-1434/21	Hovåsskolan utökning	Askim-Frölunda-Högsbo	250	0	250	244	600		Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-02147	Högsbogårdsskolan - verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	395	0	395	2	395		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
230-1391/21	Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	22	0	Avvikelse initierad	Förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01214 (förskola) samt SFF-2023-00856 (grundskola)	Trollängsskolan - utökning grundskola samt ny förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	36	500	Detaljplan/ förstudie	Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-02135	Västerhedsskolan - F3 utökning till F6	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200	0	2 200	1 471	2 200		Förstudie	1900-01-00	3
2023-00128	Hvitfeldska utbyggnad matsal och tillagning	Centrum	0	0	0	31	0	Avvikelse initierad	Uppdragsstart	1900-01-00	2
230-0741/18	Internationella skolan - ISGR Guldheden nybyggnad	Centrum	215 000	58 000	273 000	81 916	273 000		Produktion	2025-06-02	5

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
N230-0541/22 och SFF-2023-01676	Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök	Centrum	6 350	0	6 350	320	6 350		Projektplanering	2025-11-28	4
SFF-2023-04175	Katrinelundsgymnasiet - ombyggnad anpassad gymnasieskola	Centrum	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
N230-0580/19	Schillerska gymnasiet ventilation	Centrum	750	0	750	541	620	Beslut om vidare projektering.	Garantiförvaltning	1900-01-00	2
SFF-2024-00205	Backaplan, Ny Grundskola och anpassad skola 7-9	Lundby	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF 2023-03143	Bjurslättskolan, Anpassningar till anpassad grundskola	Lundby	240	0	240	5	240		Planera förstudie	1900-01-00	4
SFF-2023-02191	Bräckeskolan - Hus H	Lundby	85 000	30 000	115 000	100 740	104 192		Produktion	2024-02-29	5
N230-0391/17	Bräckeskolan - Investering Etapp 2	Lundby	93 000	0	93 000	3 392	92 096		Program och projektering	1900-01-00	2
N230-0391/17	Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3	Lundby	42 000	0	42 000	5 784	41 366		Program och projektering	1900-01-00	2
SFF-2023-02061	Bräckeskolan - tempL evakueringslokaler	Lundby	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2023-00735	Centrala Lundby provisorisk expansion	Lundby	0	0	0	7	0	Avvikelse initierad	Inkommet uppdrag	1900-01-00 -	
1186/22	Kärddalsskolan provisorisk expansion	Lundby	3 100	0	3 100	511	3 100		Projektering	2024-08-08	5
SFF-2023-00735	Lerlyckeskolan F-6 evakuering samt provisorisk expansion i centrala Lundby	Lundby	1 000	0	1 000	222	350	Projektet kommer inför genomförande delas i två projekt. Avser dels evakuering 2/3, dels expansion 1/3.	Planera förstudie	1900-01-00	4
SFF-2023-02103	Londongatan Ny grundskola och idrottshall	Lundby	0	0	0	3	0	Avvikelse initierad	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
230-0789/16	Lundbyskolan nybyggnad idrottshall	Lundby	152 000	0	152 000	148 833	152 000	Anläggning är överförd till IOFF, Projektet finns kvar tills det avslutas ekonomiskt i dec-24	Produktion	2023-11-24	5
SFF-2023-00731 och 230-0789/16	Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del av hus A (aula)	Lundby	40 000	6 200	46 200	39 228	46 200	Verksamheten har flyttat in (hösten -23). Avslutas ekonomiskt hösten-24	Produktion	2023-02-01	5
SFF-2023-00729 och 230-0789/16	Lundbyskolan. ny 7-9 skola, anpassad grundskola och kulturskola samt idrottshallar IOFF	Lundby	370 700	18 800	389 500	368 769	389 500	Verksamheten har flyttat in (terminsstart VT-24). Avslutas ekonomiskt dec-24	Produktion	2023-11-27	5
SFF-2023-01730	Regnbågsgatan, grundskola - nybyggnation	Lundby	500	0	500	122	500	Detaljplan/ förstudie	Planera förstudie	1900-01-00	2
N230-0637/14	Toleredsskolan - utökning elever	Lundby	132 600	38 000	170 600	140 120	142 913	Besiktningsanmärkningar kvarstår	Produktion	2022-07-07	5
230-0815/21 / SFF-2023-00120	Toleredsskolan anpassning hus A2 och A3	Lundby	57 000	0	57 000	545	57 000	Förskjuten i tidsplan pga genomlysning av status på befintliga byggnader. Samkörs med övriga projekt på skolan	Projektgenomförande: Etablering	2026-12-07	3
230-1145/20 och SFF-2023-00418	Toleredsskolan nybyggnad kök, matsal och mindre idrottshall (Hus H)	Lundby	67 500	0	67 500	58	67 500	Förskjuten i tidsplan pga genomlysning av status på befintliga byggnader, samkörs med övriga projekt på skolan.	Projektgenomförande: Etablering	2028-06-26	1
SFF-2023-02149	Toleredsskolan, ersättning Hus A1	Lundby	550	0	550	12	550	Samkörs med övriga projekt på toleredsskolan	Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-03255	Annedalsskolan, SU-grupp - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	225	0	225	1	225		Inkommet uppdrag	1900-01-00	4
0888/22 SFF-2023-00434	Hagaskolan förstudie utökning av kök och matsal	Majorna-Linné	500	0	500	280	280	Förstudie klar. Ska bokas över till genomförandeprojekt	Garantiförvaltning	1900-01-00	2

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-00434	Hagaskolan utökning av kök och matsal	Majorna-Linné	0	0	0	0	0		Uppstart	1900-01-00 -	
N230-0490/21	Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B	Majorna-Linné	48 000	14 000	62 000	57 554	59 409		Produktion	2023-05-15	5
N230-0490/21	Sannaskolan anpassning hus A och B årsk 7-9	Majorna-Linné	70 000	0	70 000	51 555	69 328		Produktion	2024-06-28	5
230-0441/21	Sannaskolan anpassning SU-enhet (komplettering till befintligt uppdrag)	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	48	2 000		Produktion	2024-05-31	5
230-1023/18	Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3	Norra Hisingen	108 313	0	108 313	89 286	99 472		Produktion	2023-02-27	5
SFF-2023-01779	Brunnsboskolan F-9, anpassningar för anpassad grundskola	Norra Hisingen	150	0	150	23	143		Planera förstudie	1900-01-00	4
SFF-2023-03273	Brunnsboskolan F-9, Utökad matsalskapacitet	Norra Hisingen	600	0	600	20	404		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01930	Bärbyskolan F-6 -anpassning storkök och matsal samt textilslöjdsbyggnad	Norra Hisingen	3 969	0	3 969	0	3 969		Uppstart	1900-01-00 -	
SFF-2023-01930	Bärbyskolan F-6 -anpassning storkök och matsal samt textilslöjdsbyggnad Förstudie	Norra Hisingen	250	0	250	153	263		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
230-0779/19	Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad	Norra Hisingen	300 000	0	300 000	24 915	300 001		Produktion	2026-06-18	2
230-0698/14	Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo.	Norra Hisingen	7 050	0	7 050	6 916	7 050		Produktion	2024-07-31	5
SFF-2023-01219	Nya Påvelundsskolan utbyggnad	Västra Göteborg	310 500	0	310 500	48 854	303 564		Produktion	2025-05-29	5
N230-0982/21	Näsetskolan om-tillbyggnad	Västra Göteborg	2 000	265	2 265	2 272	2 272	Avvikelse 7 tkr	Förstudie	1900-01-00	2
0982/22	Näsetskolan paviljonger	Västra Göteborg	6 350	0	6 350	583	6 350	Avser en expansion för 150 elever.	Produktion	2024-07-31	5
SFF-2023-00861	Styrsöskolan verksamhetsanpassningar folkbiblioteket	Västra Göteborg	1 719	115	1 834	58	1 834		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00	4
0980/22	Tynneredsskolan anpassning till evakueringslokal	Västra Göteborg	16 000	0	16 000	10 897	16 000	Avlstas ekonomiskt under 2024	Projektgenomförande: Etablering	2023-12-13	2
0495/17- SFF-2023-00851	Vättedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad	Västra Göteborg	600	0	600	411	480		Förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-00719	Åkeredsskolan	Västra Göteborg	307 000	0	307 000	61 713	306 826		Produktion	2025-06-03	5
SFF-2023-01970	Önneredsskolan F-9 ny, om-till och nybyggnation i ny detaljplan	Västra Göteborg	450	0	450	23	450	Detaljplan/ förstudie	Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01842	Jättestensskolan och Almqvistgatan - Ny grundskola och utökning av befintlig kapacitet	Västra Hisingen	850	0	850	17	800		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-04202	Lillebyskolan F-6, Verksamhetsanpassning kök och matsal	Västra Hisingen	150	0	150	1	150		Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01469	Noleredsskolan F-6	Västra Hisingen	329 000	0	329 000	8 489	360 000		Projektgenomförande: Etablering	2027-05-31	2
230-0850/21	Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö övre delen	Västra Hisingen	15 000	0	15 000	300	14 995		Program och projektering	2028-05-30	2
230-0827/18	Ryaskolan - Kompletterande anpassningar hus A, B och C	Västra Hisingen	4 400	0	4 400	345	4 399		Produktion	2025-06-15	2

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-00032	Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C	Västra Hisingen	52 000	4 065	56 065	10 042	56 007		Produktion	2025-07-01	2
SFF-2023-00455	Sjumilaskolan - anpassning skolgård	Västra Hisingen	3 000	0	3 000	2 877	2 877	Avslutas ekonomiskt hösten 2024.	Avslutat	1900-01-00	3
SFF-2023-01713	Torslandaskolan F-6	Västra Hisingen	285 000	0	285 000	219 405	254 700		Produktion	2024-06-12	5
230-0259/16	Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla Trulsegården F-3, ombyggnad angöring	Västra Hisingen	4 350	0	4 350	2 533	12 350	Kommer utföras under sommaren 2024 och sommaren 2025.	Program och projektering	2026-09-01	2
230-1070/21	Ekmanska sjukhemmet anpassning till grundskolor	Örgryte-Härlanda	32 000	8 500	40 500	12 699	40 500	Förskjuten tidsplan mellan 2023 och 2024	Produktion	2024-09-02	5
SFF-2023-01240	Kålltorpsskolan solavskärmning	Örgryte-Härlanda	2 144	0	2 144	78	2 144		Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01368	Lundensskolan lokalanpassning	Örgryte-Härlanda	12 900	0	12 900	10 858	12 900		Program och projektering	1900-01-00	2
SFF-2023-00946	Smörgatan ny F-6 skola och idrottshall	Örgryte-Härlanda	500	0	500	460	285		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-02182	Torpaskolan - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	460	0	460	15	460		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01257	Änåsskolan solavskärmning	Örgryte-Härlanda	2 050	0	2 050	160	2 050		Projektplanering	1900-01-00	2
SFF-2023-00362	Bergsjöskolan - anpassning utemiljö	Östra Göteborg	6 800	0	6 800	6 080	6 080	Projekt klart, avslutas ekonomiskt sep 2024.	Avslutat	2023-09-19	3
2023-00967	Bergsjöskolan utökning produktionskök	Östra Göteborg	350	650	1 000	588	1 000		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-02864	Fjällboskolan F-3, Anpassningar	Östra Göteborg	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
230-0187/12	Gärdsåsskolan - tillkommande verksamhetsönskemål utöver beslutade åtgärder i hus A	Östra Göteborg	10 000	0	10 000	10 136	10 245	Projektet är ett underprojekt. Tillsammans med huvudprojektet kommer båda projekten tillsammans understiga beslutad budget som helhet	Produktion	2023-11-30	5
N230-0187/12	Gärdsåsskolan Huvudprojekt om-nybyggnad- och tillbyggnad FS 2016	Östra Göteborg	51 110	20 000	71 110	61 807	66 976	Projektet slutbesiktigat, avslutas ekonomiskt nov 2024.	Avslut projekt	2023-11-30	5
230-0187/12	Gärdsåsskolan hus A Tomställd del anpassning till evakueringslokaler	Östra Göteborg	12 300	0	12 300	8 508	12 063		Produktion	2023-11-30	5
230-1643/21	Kortedala/Bergsjön "Talldungeskolan" anpassning storkök	Östra Göteborg	375	0	375	320	357		Förstudie	1900-01-00	3
230-1643/21	Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" anpassning storkök	Östra Göteborg	425	0	425	411	425		Förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-03018	Sandeklevsskolan, Anpassningar i kök och matsal	Östra Göteborg	480	0	480	9	480		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
FF-2023-00335	Utbynässkolan - verksamhetsanpassningar hus A (bruna villan)	Östra Göteborg	18 000	0	18 000	105	18 000		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00	5
SFF-2023-01961	Utbynässkolan F-3 - ombyggnad kök och matsal	Östra Göteborg	500	0	500	5	500	Samkörs med bruna villan	Genomföra förstudie	1900-01-00	2
0789/22 & SFF-2023-00312	Lokaler till anpassad gymnasieskola	Övrigt	250	0	250	237	250	Inhyrningsspåret är pausat för tillfället. Fokus på temörar lösning på Stora holm 20 platser.	Planera förstudie	1900-01-00	3

Projektportfölj reinvestering gymnasie- och grundskolefastigheter 2024-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	860	250	833
Gymnasie- och grundskola	1 969	845	1 937
Summa utbildningsportföljen	2 829	1 095	2 770
BMSS	236	15	238
ÄVO	436	90	372
Strategiska och övriga	586	177	498
Summa boende, strategiska och övriga fastigheter	1 258	282	1 108
Summa totalt båda portföljerna	4 087	1 377	3 878

**Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti.*

***De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget*

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1388/21	Angeredsgymnasiet - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	2 000	0	2 000	1 928	2 000		Projektering	1900-01-00
1660/22	Angeredsgymnasiet - Upprättande av funktion	Angered	5 000	0	5 000	0	5 000		Genomförande	2026-12-17
N230-2180/21	Bergsgårdsskolan - byte 4st DUCar	Angered	800	250	1 050	1 145	1 050	Avvikelse (95 tkr)	Projektering	1900-01-00
N230-1834/22	Björaredsskolan - Markprojekt, byte av trätrall, lekredskap, grusyta	Angered	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1837/22	Björaredsskolan - Utvändigt underhåll	Angered	1 500	0	1 500	3	3 000		Projektering	2024-10-31
N230-0221/22 och SFF-2023-00332	Blå Stället - Genomförande av avloppsbrist vid matsal och teatern	Angered	1 000	1 772	2 772	1 122	1 350		Genomförande	2023-09-29
N230-0415/19	Gårdstenskolan - separera idrottshall	Angered	3 000	0	3 000	1 776	1 775		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01001	Hammarkullsskolan - byte gymnastikgolv efter takläcka	Angered	1 400	0	1 400	736	800	Avslutas ekonomisk inom kort	Avslutat	2023-11-30
N230-2403/21	Hammarkullsskolan - DUC byte vita villan(fritids)	Angered	2 142	0	2 142	939	1 874		Projektering	2024-12-31
N230-1844/22	Hammarkullsskolan/Förskola - Byte av värmesystem & ventilation i del av skolan	Angered	2 100	0	2 100	22	2 100		Projektering	1900-01-00
N230-1388/21	Nya Gunnilseskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 500	0	1 500	584	690		Produktion och avslut	1900-01-00
0	Nytorpsskolan - Förlängningsrenovering	Angered	85 000	0	85 000	4	85 000		Uppstart	1900-01-00
N230-1845/22	Nytorpsskolan - markprojekt	Angered	1 800	0	1 800	0	1 800		Projektering	1900-01-00
N230-2014/22 nytt dnr SFF 2023-02385	Römosseskolan - Byte yttertak	Angered	900	0	900	1	900		[Pausat] Projektering	2024-10-31
N230-1841/22	Röseredsskolan - Installation värmepump och duc hus C	Angered	3 700	0	3 700	133	3 693		Projektering	2024-11-01
N230-1388/21	Tretjärnsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 000	0	1 000	708	733		Projektering	2023-10-31
N230-1596/20	Tretjärnsskolan - ventilation	Angered	2 500	0	2 500	1 775	1 775		Genomförande	1900-01-00
N230-1848/22	Vättleskolan - Byte av 3 st hissar (Hus A, Hus C och Hus E) 24	Angered	750	0	750	21	750		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1846/22	Vättleskolan - Byte av lekutrustning, flaggstänger	Angered	700	0	700	12	1 050		Produktion och avslut	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1847/22	Vättleskolan - Renovering ytskikt i gymnastiksal och omkl rum	Angered	1 500	0	1 500	18	1 520		Projektering	2024-08-26
SFF-2023-03563	Nordlyckeskolan - Byte värmepanna - PU 2025	Angered, Västra Hisingen	1 700	0	1 700	54	1 700		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-02214	Askimsskolan Hus C, invändiga och utvändiga åtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	7 300	0	7 300	227	9 174		Genomförande i huvudprojektet	1900-01-00
N230-2152/22	Brottkärrsskolan - duc-byte	Askim-Frölunda-Högsbo	1 300	0	1 300	0	1 275		Uppdragsstart	2024-12-31
N230-2077/22	Brottkärrsskolan-Byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	1 500	0	1 500	0	1 500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1954/22	Brottkärrsskolan-Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	800	0	800	0	800		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-01088	Flatås Gård 6 - reinvestera avloppstam i källare	Askim-Frölunda-Högsbo	1 200	0	1 200	1 089	1 089		Projektgenomförande: Överlämning	1900-01-00
N230-1084/21	Flatås Gård 6 - Renovering av ytskikt inne	Askim-Frölunda-Högsbo	11 300	1 825	13 125	13 095	13 095		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2331/21	Flatåsskolan - fasadrenovering och fönsterbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	31 000	0	31 000	7 790	31 000		Produktion och avslut	2024-09-30
N230-2333/21 SFF-2023-01702	Flatåsskolan - markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	5 200	2 600	7 800	4 954	5 200		Projektering	1900-01-00
N230-2330/21	Flatåsskolan- byte av duc och styrska	Askim-Frölunda-Högsbo	1 700	0	1 700	1 570	1 700		Projektering	1900-01-00
N230-1302/21	Flatåsskolan- byte av ventilationsaggregat	Askim-Frölunda-Högsbo	6 200	0	6 200	2 593	2 850		Produktion och avslut	2023-09-04
N230-2244/22	Flatåsskolan-Byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	0	500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0312/19	Frölundaskolan Hus A - Byte av Ventilationsaggregat	Askim-Frölunda-Högsbo	500	3 472	3 972	3 644	3 972		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01011	Frölundaskolan-Byte av ventilationsaggregat i Hus E	Askim-Frölunda-Högsbo	600	150	750	662	729		Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-2332/21	Hovåsskolan - Invändiga och utvändiga åtgärder Hus D	Askim-Frölunda-Högsbo	13 200	3 300	16 500	928	16 500		Projektering	1900-01-00
N230-1962/22	Högsbogårdsskola-Markåtgärder och lekutrustning	Askim-Frölunda-Högsbo	1 300	0	1 300	194	1 200		Inför projekt	1900-01-00
N230-1789/20	Högsbogårdsskolan, invändiga och utvändiga åtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	7 000	0	7 000	239	7 000		Projektering	1900-01-00
N230-2090/22	Lindåsskolan- byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	2 000	0	2 000	0	2 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2001/22	Lindåsskolan-Byte av RME panna 350 kw i Hus A	Askim-Frölunda-Högsbo	700	0	700	0	700		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1963/22	Lindåsskolan-Markåtgärder och lekutrustning	Askim-Frölunda-Högsbo	5 500	0	5 500	0	5 500		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2091/22	Nygårdsskolan- Byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	1 700	0	1 700	0	1 700		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1964/22	Nygårdsskolan-Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	3 200	0	3 200	0	3 200		Projektering	1900-01-00
N230-1965/22	Sisjöskolan- Markåtgärder och lekutrustning	Askim-Frölunda-Högsbo	700	0	700	0	700		Inför projekt	1900-01-00
N230-2338/21	Sisjöskolan-ducbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	261	500		Genomförande	1900-01-00
N230-1959/22	Södra Dragspelsgata-Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	1 000	0	1 000	0	1 000		Inför projekt	1900-01-00
1074/21 och SFF-2023-01948	Aschbergsgymnasiet - Markåtgärder utemiljön och renovering av garagebärighet	Centrum	26 000	0	26 000	0	26 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0500/17	Aschebergsgymn/Vasa vux Försk. Modernisering ventilation	Centrum	32 800	0	32 800	3 461	70 447		Produktion	1900-01-00
N230-1074/21	Aschebergsgymnasiet - Lägga om ytskikt på innegården samt renovera lekplats för FSF	Centrum	2 500	0	2 500	1 447	2 500		Projektering	1900-01-00
N230-0730/21 SFF-2023-02105	Aschebergsgymnasiet - Förstudie på byggåtgärder under planerat ventilationsutbyte	Centrum	1 000	4 000	5 000	883	5 000		Förstudie	1900-01-00
N230-0413/21	Burgården Hus A - Aniara ventilation bygga om luftfördelningen	Centrum	500	0	500	93	340		Produktion och avslut	2024-04-01
N230-1075/21	Burgården Hus A - Byte av ljusarmatur vån 5 + vid biblioteket	Centrum	650	0	650	588	585		Genomförande	2022-11-20
1722/22	Burgården Hus A - Byte till LED ljus i restaurang Animalen	Centrum	500	0	500	2	500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0346/18	Burgården Hus A - Diverse fasadåtgärder	Centrum	2 500	0	2 500	833	2 500		Genomförande	2025-11-20
N230-2088/21	Burgården Hus A - Ombyggnad av bandplåttak	Centrum	8 000	0	8 000	3 532	7 000		Produktion och avslut	2024-09-19
N230-1436/21	Burgården Hus A - Renovering av metodkök för VUX och GS	Centrum	28 300	60	28 360	28 359	28 377		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0229/22	Burgården Hus C - Dränering av byggnaden.	Centrum	9 500	0	9 500	10 055	9 500	Avvikelse initierad (555 tkr)	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1083/21	Burgården Hus C - Invändig ytskiktsrenovering och byte av installationer	Centrum	46 290	0	46 290	26 823	46 290		Produktion och avslut	2024-07-01
N230-1388/21	Guldhedsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Centrum	1 000	0	1 000	852	945		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03572	Gustaviskolan - Mattbyte	Centrum	1 050	0	1 050	0	1 050		Uppstart	1900-01-00
N230-1271/21	Götabergsskolan - Fasadrenovering	Centrum	9 500	12 230	21 730	22 285	22 330	Avvikelse initierad, styrgrupp 11/3, Nämnd 24/4 (555 tkr)	Produktion	2023-11-15
N230-2018/22	Götabergsskolan/ISGR - Byte ventilation	Centrum	7 000	0	7 000	7	7 000		Projektering	1900-01-00
N230-2008/22 nytt dnr SFF 2023- 02426	Götabergsskolan/ISGR - Invändiga ytskikt	Centrum	5 600	0	5 600	2	5 600		Projektering	2024-12-09
N 230-2004/22 nytt dnr SFF 2023-02456	Götabergsskolan-ISGR EL-underhåll 24	Centrum	2 100	0	2 100	0	2 100		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-01994	Hvitfeldtska Gymnasiet Södra - Genomförande av ytskikt	Centrum	17 000	0	17 000	321	17 298		Projektplanering	2026-02-19
SFF-2024-00009	Hvitfeldtska matsal - ytskikt inne och ute	Centrum	5 000	0	5 000	53	1 553		Projektering	2024-11-04
N230-1086/21	Hvitfeldtska Södra - renovering av VA	Centrum	4 500	0	4 500	3 200	3 220		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ	Centrum	3 500	0	3 500	2 015	2 013		Genomförande	1900-01-00
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Ventilationsåtgärder mekanisk ventilation	Centrum	5 000	2 500	7 500	6 595	6 693		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03576	Johannebergsskolan - Byte av c-kyla - PU2025	Centrum	1 000	0	1 000	0	1 000		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03661	Johannebergsskolan - Byte DUC - PU 2025	Centrum	1 800	0	1 800	0	1 800		Uppstart	1900-01-00
N230-1141/21 och SFF-2023-29329	Johannebergsskolan - Reinvestering tillagningskök	Centrum	13 500	0	13 500	33	13 500		Projektering	1900-01-00
N230-1795/22	Johannebergsskolan - Utvändigt underhåll	Centrum	900	0	900	8	900		Inför projekt	1900-01-00
N230-2401/21 och SFF-2023-01995	Katrinelundsgymnasiet - Byte till ledljus i byggnaden	Centrum	1 100	800	1 900	1 520	1 800		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1634/20 SFF-2023-01669	Katrinelundsgymnasiet - Klassrumsrenovering och tillhörande åtgärder	Centrum	9 750	6 150	15 900	15 899	15 924		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-00468	Katrinelundsgymnasiet - re investering av avlopp	Centrum	570	600	1 170	1 152	1 170		Projektplanering	2023-12-20
N230-0190/21	Katrinelundsgymnasiet - UTE-åtgärder tak, fönster, dörrar	Centrum	12 350	4 000	16 350	11 335	11 352		Genomförande	1900-01-00
N230-1849/22	Mossebergsskolan - Byte belysning och målning - PU 2024	Centrum	2 300	0	2 300	3	2 300		Projektering	2024-11-30

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0151/21	Mossebergsskolan - Ombyggnad vent byte belysning mm	Centrum	1 000	0	1 000	196	1 000		Projektering	2024-08-30
N230-2365/21	Schillerska Gymnasiet - byte av två fläktar.	Centrum	1 500	0	1 500	0	1 500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1118/21 / SFF-2023-02831	Schillerska Gymnasiet - fönsterrenovering	Centrum	4 000	1 500	5 500	541	5 500		Produktion och avslut	2024-09-30
N230-0298/18	Schillerska Gymnasiet - Modernisering ventilationssystem	Centrum	9 600	0	9 600	73	100		[Pausat] Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00078	Schillerska Gymnasiet - re-investering av idrottshusets tak och div väggar	Centrum	1 000	0	1 000	672	1 000		Genomförande	2023-12-01
N230-1091/21	Schillerska gymnasiet - stenbelägga mark utanför entrén.	Centrum	1 000	0	1 000	0	1 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-1978/22, SFF-2023-02358	Bjurslätsskolan - Byte hydraulhiss - PU 2024	Lundby	800	0	800	10	800		Projektering	2024-11-30
N230-2405/21	Bjurslätsskolan - Duc- byte	Lundby	540	0	540	494	510		Projektering	2023-10-31
SFF-2023-02017	Bjurslätsskolan - Fuktskada Hus B	Lundby	1 000	864	1 864	926	1 000		Genomförande	1900-01-00
N230-1980/22	Bjurslätsskolan - Renovering av omklädningsrum	Lundby	800	0	800	50	800		Genomförande	2024-09-02
N230-1538/20	Bräckeskolan - reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 2	Lundby	18 000	0	18 000	123	18 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01872	Bräckeskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 3	Lundby	61 000	0	61 000	4	61 000		Projektering	1900-01-00
N230-2400/21	Kärddalsskolan - DUC byte	Lundby	1 530	0	1 530	557	739		Projektering	2023-12-30
N230-0680/17	Lerlyckeskolan- Ventilationsåtgärd. byte av fläktar	Lundby	1 300	0	1 300	1 321	1 321	Avvikelse initierad (21 tkr)	Produktion och avslut	1900-01-00
1717/22	Lindholmens Gymnasium Hus ÄRAN - ytskikt korridor och klassrum, våning 2	Lundby	835	0	835	119	835		Genomförande	2024-12-31
SFF-2023-00730 och 230-0789/16	Lundbyskolan - Re-Investering, anpassning av befintlig del	Lundby	25 500	23 200	48 700	44 876	48 578		Produktion och avslut	2023-04-26
SFF-2023-01933	Polhemsgymnasiet Hus Anglia - Ytskikt golv och vägg	Lundby	6 000	2 500	8 500	353	8 500		Projektering	2025-04-15
N230-0169/18	Rambergsskolan – Bygg, VVS och styr, el samt invändigt underhåll	Lundby	25 600	7 920	33 520	25 208	35 241		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, dagvatten och brunnar	Lundby	2 200	1 500	3 700	3 440	3 700		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, underhåll av skolgårdsyta.	Lundby	6 400	0	6 400	6 683	6 676	Juridisk tvist pågår. En korrekt bedömning av ekonominsk avvikelse kan göras när tvisten är avgjord.	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1974/22	Rambergsskolan - Invändig renovering idrottshall, omkl rum	Lundby	5 600	0	5 600	77	5 535		Projektering	2024-12-31
N230-1128/21	Stora Holm - Utbyte av gatubelysning (kvicksilver) och fasadbelysning	Lundby	2 000	0	2 000	964	973		Produktion och avslut	2022-10-22
SFS 1784/22	Stora Holm (Fiktiv objekt) - Lagringsplats för PA-mark	Lundby	6 000	0	6 000	3 282	6 000		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-00139	Toleredsskolan - Reinvestering hus A2 och A3 i samband med anpassning projekt (21188)	Lundby	67 000	0	67 000	543	67 000		Projektering	2026-12-07
N230-2307/21	Annedalsskolan - Byte av Tak hus A + B	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	186	5 000		Projektering	1900-01-00
N230-2043/22	Annedalsskolan - Dränering	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	373	5 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2038/22	Fjällskolan - Dränering och mark	Majorna-Linné	8 500	0	8 500	19	8 500		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01732	Fjällskolan - Nytt ÄV-hus	Majorna-Linné	3 000	500	3 500	877	3 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2040/22	Fjällskolan - Omläggning av golvet i köket	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	4	3 500		Projektering	1900-01-00
N230-2130/21	Fjällskolan - ventilation kök	Majorna-Linné	1 800	0	1 800	1 503	1 553		Projektering	1900-01-00
N230-2042/22	Hagaskolan - Dränering	Majorna-Linné	3 800	0	3 800	41	3 800		Projektering	1900-01-00
N230-1062/21	Hagaskolan - Invändiga åtgärder	Majorna-Linné	3 500	1 400	4 900	4 834	4 900		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1062/21	Hagaskolan - kunduppdrag, verksamhetsförändring klassrum, grupprum, fritidshem	Majorna-Linné	746	0	746	791	791	Avvikelse initierad (45 tkr)	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1064/21	Hagaskolan - Utvändiga åtgärder	Majorna-Linné	6 000	1 840	7 840	6 613	7 840		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03992										
N230-0769/21	Karl Johanssskolan - aggregatsbyte	Majorna-Linné	8 500	0	8 500	7 664	7 700		Genomförande	2023-06-30
SFF 2023-01090	Karl Johanssskolan - Dränering hus A, B och C samt markåtgärder	Majorna-Linné	19 000	0	19 000	539	19 000		Projektering	1900-01-00
N230-0730/16 - NYTT Diariernr: N230-0767/21	Karl Johanssskolan - Renovering tak, fasad, fönster	Majorna-Linné	39 500	0	39 500	34 041	39 500		Produktion och avslut	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-01521	Kungsladugårdsskolan - Etapp 6, verksamhetsanpassning och tillgänglighet, kulturskolan	Majorna-Linné	1 884	0	1 884	1 441	1 884		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-01520	Kungsladugårdsskolan - Etapp 7, verksamhetsanpassning för elevhälsa, personalutrymmen, administration, plan 1, husdel 2	Majorna-Linné	3 016	0	3 016	2 220	3 020		Genomförande	1900-01-00
N230-0414/22	Kungsladugårdsskolan - Hiss	Majorna-Linné	800	0	800	629	649		Genomförande	1900-01-00
N230-2034/22	Kungsladugårdsskolan - Markåtgärd	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	0	2 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-00650	Kungsladugårdsskolan - Vattenläcka träslöjd och kulturskolan	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	1 136	1 136	Avvikelse initierad (136 tkr)	Genomförande	1900-01-00
N230-0339/19	Kungsladugårdsskolan - Ventilationsåtgärder och invändigt underhåll	Majorna-Linné	44 700	54 950	99 650	77 059	99 650		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-01573	Kungsladugårdsskolan - Ytskiktsrenovering och byte av el-installationer, plan 1, husdel 3	Majorna-Linné	6 400	0	6 400	0	6 400		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
SFF-2023-02005	Majorna VUX idrottshall	Majorna-Linné	8 000	0	8 000	126	8 000		Projektering	2024-10-30
N230-0164/20	Majorna Vux total upprustning	Majorna-Linné	106 000	0	106 000	101 657	101 740		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2303/21, Nytt diariernr. SFF-2023-03461	Nordhemsskolan - Ventilation träslöjd	Majorna-Linné	850	60	910	904	902		Produktion och avslut	2023-11-09
N230-0331/18	Nordhemsskolan - invändigt underhåll	Majorna-Linné	40 500	0	40 500	13 340	40 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0618/18	Nordhemsskolan - Relining dagvattenledningar	Majorna-Linné	2 500	0	2 500	3 643	3 643	Avvikelse är initierad (1143 tkr) avslutas inom kort.	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2041/22	Oscar Fredriksskolan - Markåtgärd	Majorna-Linné	1 700	0	1 700	54	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-2310/21	Oscar Fredriksskolan - Byte av duc	Majorna-Linné	1 500	0	1 500	503	503		Projektering	1900-01-00
N230-2035/22	Sannaskolan - Markåtgärder	Majorna-Linné	9 500	0	9 500	0	9 500		Projektering	1900-01-00
N230-0536/21	Sannaskolan - Omasfaltering, lekredskap, vegetation	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	26	1 000		Genomförande	1900-01-00
N230-2270/21	Sannaskolan – Reinvestering hus A i samband med SLK projekt	Majorna-Linné	8 500	0	8 500	1 100	8 500		Produktion och avslut	2024-05-31
N230-0491/21	Sannaskolan - Reinvestering hus B	Majorna-Linné	12 500	6 400	18 900	18 898	18 900		Produktion och avslut	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1988/22	Backaskolan - Frånkoppling media Hus E och F	Norra Hisingen	3 600	0	3 600	26	3 600		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2246/21	Brunnsboskolan - Byte av styr hus CDEFG	Norra Hisingen	1 100	700	1 800	1 576	1 791		Projektering	1900-01-00
N230-1986/22	Brunnsboskolan - Invändig renovering	Norra Hisingen	2 300	2 700	5 000	224	4 990		Projektering	2024-09-01
N230-1987/22	Brunnsboskolan - Markåtgärder	Norra Hisingen	1 300	0	1 300	0	1 100		Inför projekt	1900-01-00
N230-2269/21	Brunnsboskolan - Ombyggnad av vent hus F	Norra Hisingen	1 200	0	1 200	152	1 200		Projektering	1900-01-00
N230-0430/20	Brunnsboskolan - Ombyggnad omklädningsrum hus G	Norra Hisingen	6 687	0	6 687	6 031	6 439		Produktion och avslut	2023-07-06
SFF-2023-01524	Bärbyskolan - Ducbyte	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	1	1 451		Projektplanering	2024-11-25
N230-1972/22	Bärbyskolan - Invändig renovering	Norra Hisingen	2 100	2 900	5 000	158	4 955		Projektering	2024-09-01
N230-1493/21	Bärbyskolan - Renovering hus D invändigt ink armaturer	Norra Hisingen	1 200	0	1 200	0	1 200		Projektering	1900-01-00
N230-1499/21	Bärbyskolan - Utbyte av oljepanna mot bergvärmepump	Norra Hisingen	3 000	0	3 000	530	2 991		Projektering	2024-12-04
N230-1992/22	Ellen Keyskolan - Markåtgärder	Norra Hisingen	2 200	0	2 200	5	2 200		Projektering	1900-01-00
N230-1976/22	Hinnebäcksskolan - Markåtgärder	Norra Hisingen	550	0	550	1	550		Inför projekt	1900-01-00
N230-1983/22	Klarebergsskolan F-3 - Byte kokgrytor	Norra Hisingen	1 000	0	1 000	0	1 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1985/22	Klarebergsskolan F-3 - Markåtgärder	Norra Hisingen	3 500	0	3 500	0	3 500		Projektering	1900-01-00
N230-1388/21	Klarebergsskolan F-3 - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 650	0	1 650	587	646		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1982/22	Kärraskolan - Byte ventilationsaggregat	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	45	1 520		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01461	Kärraskolan - Nytt förråd efter vattenskada	Norra Hisingen	750	500	1 250	58	750		Projektplanering	1900-01-00
N230-2250/21	Nedergårdsskolan - Byte av styr och ventilationsaggregat	Norra Hisingen	700	0	700	239	700		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-1444/21	Olshammarsskolan - Invändig renovering, målning & el	Norra Hisingen	1 100	0	1 100	298	1 100		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-02134	Olshammarsskolan - Belysningsåtgärder	Norra Hisingen	1 350	0	1 350	368	1 350		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
N230-1993/22	Olshammarsskolan 1-9 - Markåtgärder	Norra Hisingen	900	0	900	53	900		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-01276	Skälltorpsskolan - Brand i omklädningsrum	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	1 323	1 300		Projektgenomförande: Överlämning	2023-11-22

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1989/22	Skälltorpsskolan 7-9 - Byte inkommande ställverk - PU 2024	Norra Hisingen	700	0	700	8	700		Projektering	2024-12-31
N230-2366/21	Stora Holm -Byte av SRÖ	Norra Hisingen	1 540	0	1 540	1 451	1 451		Projektering	1900-01-00
N230-2402/21	Stora Holm -Byte av tak växthus	Norra Hisingen	500	0	500	0	500		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-00707	Stora Holm Flyttåtgärder mellan hus C till hus K	Norra Hisingen	610	139	749	534	534		Projektgenomförande: Överlämning	1900-01-00
N230-1443/21	Tångensskolan - Byte av pelletspanna	Norra Hisingen	1 700	0	1 700	67	1 700		Projektering	1900-01-00
N230-1388/21	Tångensskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 000	0	1 000	959	1 000		Projektering	1900-01-00
N230-1975/22	Tångensskolan - Renovering av duschtrymmen	Norra Hisingen	900	300	1 200	14	1 114		Genomförande	2024-09-01
N230-0909/15	Utbildningscentrum Stora Holm. Komplettering och konvertering värmesystem	Norra Hisingen	10 000	0	10 000	11 849	11 889	Dialog med miljöförvaltningen pågår,avvikelsebelopp ej fastställt ännu.	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1953/22	Asperö skola-markåtgärder och lekutrustning	Västra Göteborg	950	0	950	0	950		Inför projekt	1900-01-00
N230-1293/21	Brännoskolan-Utvändiga och invändiga åtgärder	Västra Göteborg	3 850	0	3 850	3 374	3 850		Produktion och avslut	2023-08-11
N230-1956/22	Brännöskola- Markåtgärder och lekutrustning	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	0	1 300		Inför projekt	1900-01-00
N230-2274/22	Brännöskolan-Byte av in- och utvändiga belysningsarmaturer	Västra Göteborg	2 600	0	2 600	2 107	2 600		Produktion och avslut	2023-11-20
N230-2329/21	Dalaskolan - duc-byte	Västra Göteborg	1 530	0	1 530	1 150	1 204		Genomförande	1900-01-00
N230-2088/22	Dalaskolan- byte av storköksmaskiner	Västra Göteborg	850	0	850	0	850		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0017/21	Dalaskolan Hus B,C och D - Renovering tak, fasad och fönster	Västra Göteborg	23 000	0	23 000	12 945	13 127		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-02290	Dalaskolan Hus E – Belysningsbyte, invändig gammalt N230-1948/22	Västra Göteborg	2 000	0	2 000	184	1 620		Projektering	1900-01-00
N230-1958/22	Dalaskolan-Markåtgärder, byte av lekutrustning	Västra Göteborg	2 800	0	2 800	45	2 800		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01634	Dalaskolan-renovering söderfasad Hus A	Västra Göteborg	5 800	0	5 800	1 339	5 800		Projektplanering	1900-01-00
N230-1944/22	Donsö skola-Invändiga och utvändiga åtgärder	Västra Göteborg	7 500	0	7 500	69	7 550		Projektering	1900-01-00
N230-2085/21	Fiskebäcksskolan- ombyggnad av ventilation och värmesystem	Västra Göteborg	8 500	0	8 500	5 488	5 614		Produktion och avslut	2023-08-30
SFF-2023-0206	Förskola Eckragatan 36- duc-byte	Västra Göteborg	8 000	0	8 000	0	8 000		Genomförande	2024-12-31

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1388/21	Hagenskolan + Exp. pav. - Modernisering fastighetsstyrning	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	703	703		Produktion och avslut	2022-12-15
N230-1960/22	Hagenskolan-Markåtgärder och lekutrustningar	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	2	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1681/21	Hagenskolan-utvändiga åtgärder på Hus A, B,C och G	Västra Göteborg	13 000	0	13 000	8 359	8 668		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03568	Hällsviksskolan - Mattbyte	Västra Göteborg	1 700	0	1 700	0	1 700		Uppstart	1900-01-00
N230-1961/22	Högenskola-Markåtgärder och lekutrustning	Västra Göteborg	950	0	950	0	950		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-1945/22	Högenskolan-Invändiga åtgärder och byte av belysningsarmaturer	Västra Göteborg	3 700	0	3 700	21	3 700		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1298/21	Kannebäcksskolan-utvändigaåtgärder, tak fasad och fönster	Västra Göteborg	7 000	0	7 000	6 097	6 874		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1947/22	Kannebäcksskolan-Invändiga åtgärder och byte av belysning	Västra Göteborg	3 500	0	3 500	44	3 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0443/22	Lilla Fiskebäcksskolan-byte av fläkt och värmepump	Västra Göteborg	1 400	0	1 400	115	1 400		Projektering	2024-05-13
N230-1890/20	Lillebyskolan - Hus A Kök	Västra Göteborg	2 704	0	2 704	173	2 073		Projektering	1900-01-00
N230-1307/21	Nya Påvelundsskolan, markåtgärder	Västra Göteborg	2 000	0	2 000	8	2 000		Produktion och avslut	2025-05-29
SFF-2023-02121	Nya Påvelundsskolan, Ombyggnad av Hus A, B och C	Västra Göteborg	28 000	0	28 000	7 570	27 734		Produktion och avslut	2025-05-29
N230-0482/20	Näsetsskolan,konvertering av elvärme till bergvärme eller fjärrvärme	Västra Göteborg	9 000	0	9 000	0	0		[Pausat] Projektering	1900-01-00
N230-1952/22	Påvelundsskolan F-6-Fasadåtgärder Hus B	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	11	1 000		Inför projekt	1900-01-00
N230-0191/22	Styrsöskolan-byte av ventilationsaggregat	Västra Göteborg	8 400	0	8 400	367	8 400		Projektering	2024-08-30
N230-1388/21	Tynneredsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Västra Göteborg	2 000	0	2 000	920	1 144		Produktion och avslut	2022-12-16
0	Åkeredsskolan Reinvesteringsåtgärd skyddsrum	Västra Göteborg	502	0	502	0	502		Genomförande	2025-06-03
N230-1388/21	Ångåsskola - Modernisering fastighetsstyrning	Västra Göteborg	1 700	0	1 700	676	676		Produktion och avslut	2022-12-15
N230-1966/22	Ångåsskolan-Markåtgärder och lekutrustning	Västra Göteborg	950	0	950	0	950		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-03559	Björlandaskolan - byte ventilationsaggregat - PU 2025	Västra Hisingen	4 000	0	4 000	0	4 000		Uppstart	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1301/21	Hagenskolan-varme och ventilationsåtgärder	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	1 962	1 958		Produktion och avslut	2024-06-03
N230-0725/15	Jättestensskolan - Byte av ventilation i kök	Västra Hisingen	1 900	0	1 900	5 094	5 114	Avvikelse är initierad (3 194 tkr)	Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03557	Jättestensskolan - Byte DUCar - PU 2025	Västra Hisingen	2 800	0	2 800	0	2 800		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03558	Jättestensskolan - Fasadenovering	Västra Hisingen	2 500	0	2 500	0	2 500		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03667	Jättestensskolan - Utvändig målning	Västra Hisingen	700	0	700	0	700		Uppstart	1900-01-00
N230-2000/22 SFF-2023-01971	Lillebyskolan - Invändig renovering hus C	Västra Hisingen	3 700	1 100	4 800	193	4 711		Projektering	2024-09-27
N230-1803/20	Lillebyskolan - Underhåll av klimatskal	Västra Hisingen	6 700	0	6 700	5 481	6 200		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-0611/22	Nordlyckeskolan - Byte av spillvattenrör	Västra Hisingen	600	0	600	382	382		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-03564	Nordlyckeskolan - Byte belysning - PU 2025	Västra Hisingen	6 600	0	6 600	0	6 600		Uppstart	1900-01-00
N230-0771/21	Ryaskolan - Byte av styr hus A, B och C	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	1 296	1 491		Genomförande i huvudprojektet	2022-11-30
N230-1611/20	Ryaskolan - Reinvestering hus B och C	Västra Hisingen	47 000	1 329	48 329	4 805	48 297		Produktion	2025-07-01
N230-0217/22	Ryaskolan - Reinvestering mark	Västra Hisingen	5 900	0	5 900	600	5 870		Projektering	2028-05-30
N230-2247/21	Sjumilaskolan - Byte av all styr	Västra Hisingen	2 500	0	2 500	2 186	2 114		Projektering	1900-01-00
N230-2249/21 N230-0209/22	Sjumilaskolan - Byte av fönster och dörrar	Västra Hisingen	15 000	0	15 000	408	15 000		Projektering	1900-01-00
N230-1470/21	Sjumilaskolan - Byte av klinkergolv i hus A	Västra Hisingen	3 500	0	3 500	3 351	3 500		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03570	Sjumilaskolan - byte matta och belysning	Västra Hisingen	7 000	0	7 000	0	7 000		Uppstart	1900-01-00
N230-1700/20	Sjumilaskolan - Golv i korridorer hus A	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	1 898	2 000		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03569	Sjumilaskolan - Reinvestering mark - PU 2025	Västra Hisingen	3 000	0	3 000	0	3 000		Uppstart	1900-01-00
N230-0682/20	Skutehagen skola - Byte pelletspanna	Västra Hisingen	1 500	450	1 950	1 932	1 947		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1462/21	Skutehagsskolan - Byte av lekutrustning och renovering av gård	Västra Hisingen	25 500	0	25 500	16 903	25 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2251/21	Skutehagsskolan - Byte av vent LB01 & LB8-10	Västra Hisingen	4 500	0	4 500	240	4 500		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03565	Skutehagsskolan - Byte mattor och belysning	Västra Hisingen	7 300	0	7 300	0	7 300		Uppstart	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1940/22 SFF-2023-00123	Skutehagsskolan - Målning byte golv och belysning hus C	Västra Hisingen	2 000	1 100	3 100	172	3 028		Projektering	2024-08-02
N230-1998/22	Snäckebergsskolan, Flygtornsvägen 2 - Invändigt underhåll	Västra Hisingen	2 800	1 500	4 300	0	4 300		Uppdragsstart	1900-01-00
SFF-2023-00602	Svartedalsskolan - Vattenskada från NO sal	Västra Hisingen	300	0	300	1 052	1 117	Avvikelse initierad, försäkringsärende	Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-03561	Trulsegårdsskolan - Byte c-kyla - PU 2025	Västra Hisingen	1 000	0	1 000	0	1 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2044/22	Trulsegårdsskolan - Dränering av gräsyta	Västra Hisingen	600	0	600	0	600		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-03560	Älvegårdsskolan - byte belysning	Västra Hisingen	3 320	0	3 320	0	3 320		Uppstart	1900-01-00
SFF-2024-00109	Bagaregårdsskolan - Anpassningar av rum	Örgryte-Härlanda	540	0	540	0	540		Uppstart	1900-01-00
N230-2311/21	Bagaregårdsskolan - Invändig renovering	Örgryte-Härlanda	8 500	0	8 500	5 237	8 490		Projektering	2024-08-30
N230-0684/17	Bagaregårdsskolan - Klimat- och energiförbättring	Örgryte-Härlanda	10 500	0	10 500	9 685	10 497		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00951	Bagaregårdsskolan - Kunduppdrag anpassning suterrängplan	Örgryte-Härlanda	1 045	0	1 045	976	1 045		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
N230-1866/22	Bagaregårdsskolan - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	9 000	0	9 000	32	9 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01959	Gamla Lundensskolan - Renovering bjälklag, balk och mur	Örgryte-Härlanda	10 000	0	10 000	139	10 000		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-2320/21 SFF-2023-00333	Kålltorpsskolan - Byte av belysning 23	Örgryte-Härlanda	5 000	0	5 000	2 015	5 000		Projektering	1900-01-00
N230-1793/22	Kålltorpsskolan - Byte av kokgrytor	Örgryte-Härlanda	750	0	750	0	750		Inför projekt	1900-01-00
N230-1794/22	Kålltorpsskolan - Byte ventilationsaggregat	Örgryte-Härlanda	1 300	0	1 300	255	800		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1865/22	Kålltorpsskolan - Hissrenovering 24	Örgryte-Härlanda	750	0	750	20	750		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1388/21	Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning	Örgryte-Härlanda	2 000	0	2 000	1 574	1 567		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2321/21	Kärralundsskolan - Byte av duc	Örgryte-Härlanda	1 100	0	1 100	726	866		Projektering	1900-01-00
N230-1863/22	Kärralundsskolan - Dränering	Örgryte-Härlanda	6 700	0	6 700	103	6 700		Projektering	1900-01-00
N230-1060/21	Kärralundsskolan - Utvändiga åtgärder	Örgryte-Härlanda	6 000	0	6 000	368	6 000		Projektering	2024-10-31
N230-2312/21	Nya Lundensskolan - Byte av duc	Örgryte-Härlanda	2 400	0	2 400	873	880		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1055/21	Nya Lundenskolan - Invändiga åtgärder HUS C gymnastiken	Örgryte-Härlanda	5 000	0	5 000	3 508	4 500		Projektering	2024-03-01
SFF-2023-02676	Nya Lundenskolan - Åtgärder i samband med SLK-uppdrag	Örgryte-Härlanda	7 500	0	7 500	5 849	7 500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2153/22 SFF-2023-00578	Torpaskolan - Dränering och markåtgärder	Örgryte-Härlanda	15 000	0	15 000	4 624	15 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01075	Torpaskolan - Invändig renovering	Örgryte-Härlanda	4 500	0	4 500	1 212	4 500	Fördjupad utredning pågår, genomförandestart under 2024/2025	Projektering	2026-11-25
N230-2319/21 SFF-2023-00971	Ånässkolan - Byte av belysning	Örgryte-Härlanda	4 500	1 000	5 500	4 749	5 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1867/22	Ånässkolan - Dränering	Örgryte-Härlanda	7 300	0	7 300	376	7 300		Projektering	1900-01-00
N230-1895/22	Ånässkolan - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	5 000	0	5 000	405	5 000		Genomförande	1900-01-00
N230-1724/22	Backegårdsskolan - Undertak och belysning	Östra Göteborg	5 000	0	5 000	19	5 000		Projektering	1900-01-00
SFF-2024-00102	Bergsjöskolan - anpassningar avseende demokök och tvättstuga	Östra Göteborg	508	0	508	4	508		Uppstart	1900-01-00
SFF-2024-00101	Bergsjöskolan - El	Östra Göteborg	790	0	790	0	790		Uppstart	1900-01-00
N230-1730/22	Bergsjöskolan - Renovering av omklädningsrum och belysning	Östra Göteborg	6 000	0	6 000	80	6 000		Projektering	2024-10-06
N230-2309/21	Bergsjöskolan - Renovering hemkunskapssalen	Östra Göteborg	3 500	0	3 500	417	3 500		Projektering	2024-10-06
N230-1788/22 SFF-2023-02770	Fjällboskolan - Byte ventilationsaggregat	Östra Göteborg	1 000	0	1 000	0	1 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1789/22	Fjällboskolan - Dränering	Östra Göteborg	6 800	0	6 800	426	6 800		Projektering	1900-01-00
N230-2304/21	Fjällboskolan - SRÖ	Östra Göteborg	1 800	0	1 800	680	623		Projektering	1900-01-00
N230-1731/22	Gårdsmosseskolan - Dränering	Östra Göteborg	4 600	0	4 600	24	4 600		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-03077, N230-1546/22 / N230-0567/18	Gårdsmosseskolan - energisparåtgärder	Östra Göteborg	2 350	2 650	5 000	3 939	5 000		Produktion och avslut	2023-10-16
N230-0187/12	Gärdsåsskolan - Reinvsteringsåtgärder i samband med LS projekt	Östra Göteborg	85 000	10 000	95 000	90 342	91 644		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00676	Gärdsåsskolan - Tillkommande åtgärder bla omdränering i samband med SLK projekt hus A	Östra Göteborg	9 840	0	9 840	9 725	9 840		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1220/22	Gärdsåsskolan – Tillkommande åtgärder i skyddsrum i samband med SLK projekt-ska vara underprojekt	Östra Göteborg	920	0	920	672	920		Projektering	2023-11-30
N230-1790/22	Mossbergsska friluftsskolan - Dränering	Östra Göteborg	6 300	0	6 300	23	6 300		Projektering	1900-01-00
N230-1791/22	Mossbergsska friluftsskolan - Invändiga åtgärder + fönster	Östra Göteborg	7 000	0	7 000	42	7 000		Projektering	1900-01-00
N230-1787/22 SFF-2023-02769	Ramsdalsskolan - Byte ventilationsaggregat	Östra Göteborg	1 700	0	1 700	99	1 700		Projektering	1900-01-00
N230-1970/22 SFF-2023-02723	Ramsdalsskolan - Varukyla	Östra Göteborg	750	0	750	0	750		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1729/22	Sandeklevsskolan - Dränering och markåtgärder	Östra Göteborg	8 000	0	8 000	28	8 000		Projektering	1900-01-00
N230-2322/21	Sandeklevsskolan - Markåtgärder	Östra Göteborg	1 200	0	1 200	0	1 200		Projektering	1900-01-00
N230-0663/20	Solbackeskolan - Styrning, reglering och övervakning	Östra Göteborg	1 600	0	1 600	16	1 366		Projektering	1900-01-00
N230-0553/21	Solbackeskolan - VVS	Östra Göteborg	4 200	0	4 200	416	4 414		Projektering	1900-01-00
N230-1732/22 SFF-2023-00579	Talldungeskolan - Dränering	Östra Göteborg	11 300	0	11 300	486	11 300		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1059/21 SFF-2023-01468	Talldungeskolan - Fönsterbyte hus A	Östra Göteborg	6 400	1 220	7 620	7 593	7 593		Produktion och avslut	2023-09-19
N230-2308/21 SFF-2023-02743	Utbynässkolan - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	2 500	0	2 500	148	2 500		Projektering	1900-01-00
N230-1942/22	Utmarksskolan - Invändiga åtgärder hus F	Östra Göteborg	6 000	0	6 000	257	6 000		Projektering	2024-12-31
N230-1733/22	Utmarksskolan - Tak och fasad hus A	Östra Göteborg	9 500	0	9 500	60	9 500		Projektering	1900-01-00
N230-2302/21 SFF-2023-02739	Utmarksskolan - Ventilation Hus F och D	Östra Göteborg	3 000	0	3 000	366	3 000		Produktion och avslut	1900-01-00

Projektportfölj inhyrning gymnasie- och grundskolefastigheter

2024-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)
Förskola	0	1 118	1 503
Gymnasie- och grundskola	0	1 404	1 405
Summa utbildningsportföljen	0	2 522	2 908
BMSS		0	
ÄVO	1 947	2 601	2 601
Övrigt	1 660	1 086	1 086
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	3 607	3 687	3 687
Summa totalt båda portföljerna	3 607	6 209	6 595

Uppgift om budget och prognos saknas i flera av projekten, avseende prognos har den justerats till motsvarande utfall. Arbete kommer ske under våren med att uppdatera rutiner för inhyrningsprojekten

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan		1	6	4	1	1	13
Gymnasie- och grundskola	1	3		11			15
BMSS				1			1
ÄVO	7	4	2	2			15
Övrigt	1	4	4	4		4	17
Summa antal	9	12	12	22	1	5	61

Prio	Förklaring av prioritering - Hela staden perspektiv
5	Är i produktion/ avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
2025/21	Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG)	Askim-Frölunda-	0	0	0	209	209		Uppdragsstart	2024-05-02	2
2023-00148	Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar	Centrum	0	0	0	111	111		Förstudie	1900-01-00	2
2023-01780	Landalaskolan F-3 - förstudie till anpassad grundskola F-6	Centrum	0	0	0	46	46		Planera förstudie	1900-01-00	4
2023-01780	Landalaskolan F-3 - förstudie till anpassad grundskola F-6	Centrum	0	0	0	46	46		Planera förstudie	1900-01-00	4
SFF-2023-01811	Norra Hamngatan 8, Elevhälsa Centrum GSF - Verksamhetsanpassning	Centrum	0	0	0	22	22		Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01811	Norra Hamngatan 8, Elevhälsa Centrum GSF -	Centrum	0	0	0	22	22		Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-02084	Valand - utred Ny gymnasieskola i centrum	Centrum	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
230-0557/20	Gustaviskolan ytterligare lokaler	Interna projekt, Centrum	0	0	0	175	175		Förstudie	2024-08-26	2
230-0789/18	Tolken på Lindholmen anpassning	Lundby	0	0	0	366	366		Förstudie	1900-01-00	2
N230-0862/19	Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal	Majorna-Linné	0	0	0	140	140	Upphandling undersöker möjlig lösning	[Pausat] Förstudie	1900-01-00	2
0197/22	Kärre C 16-19 verksamhetsanpassning och omförhandling av hyresavtal	Norra Hisingen	0	0	0	193	193	Projektet är avslutat och ska faktureras	Garantiförvaltning	2023-05-30	5
SFF-2023-00312	Stora Holm- anpassa paviljong till gymnasiesärskola	Norra Hisingen	0	0	0	30	30		Inkommet uppdrag	1900-01-00	4
1224/22	Utredning ny F-6-skola Backaplan	Norra Hisingen	0	0	0	14	14		Uppdragsstart	1900-01-00	2
SFF-2023-01956	Kulturskola, Grundskoleförvaltningen -inhyrning förråd	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		Uppstart	1900-01-00	-
SFF-2023-01956	Kulturskola, Grundskoleförvaltningen -inhyrning förråd Förstudie	Västra Göteborg	30	0	30	24	30		Planera förstudie	1900-01-00	2

Bilaga 2. Leverans och tollgate plan för grundskoleprojekt under 2024

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 Inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG4 överlämning godkänd slutbesiktning
Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö	A2 (om- och tillbyggnad)	Projektgenomförande	ok	2023-11-28 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan	2024-06-14
Bergsjöskolan utökning produktionskök	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2023-12-31 Flyttad till maj 2025		
Bergumsskolan F-9 verksamhetsanpassninga	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	23-12-18 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan	24-12-02	
Bjurslättsskolan, Anpassningar till anpassad grundskola	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	24-03-15		
Brunnsboskolan F-9, Utökad matsalskapacitet	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	24-05-05		
Bräckeskolan - Investering Etapp 2	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-02-23	
Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-06-15	
Bärbyskolan F-6 - anpassning storkök och matsal samt textilslöjdsbyggnad	A2 (om- och tillbyggnad)	Projektgenomförande	ok	24-10-02	
Gärdsåsskolan - tillkommande verksamhetsönskemål utöver beslutade åtgärder i hus A	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-04-04
Gärdsåsskolan Huvudprojekt ombyggnad- och	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-04-02

tillbyggnad FS 2016 (exkl G &B)					
Gärdsåsskolan hus A Tomställd del anpassning till evakueringslokale	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-03-24
Hovåsskolan utökning	A1 (nybyggnad)	Förstudie	23-03-21 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan	2024-02-29	
Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Projekt-genomförande	2023-12-11 Investeringsbeslut taget	2024-06-04	
Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök evakuering	Inhyrning - Förstudie	Genomföra förstudie	2024-01-22 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan		
Johannebergsskolan - anpassning Hus C	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt-genomförande	ok	2024-04-30	2024-09-30
Jättestensskolan och Almqvistgatan - Ny grundskola och utökning av befintlig kapacitet	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-05-25		
Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" anpassning storkök	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2024-01-02 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan	2024-10-02	
Kortedala/Bergsjön anpassning av 4 st storkök i 4 st skolor	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2023-05-01 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan	2024-04-01	
Kulturskola, Grundskoleförvaltningen -inhyrning förråd	Inhyrning - Ny inhyrning	Projekt-genomförande	2024-01-22 Investeringsbeslut taget	2024-02-08	
Kålltorpsskolan solavskärmning	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2024-10-01		
Lerlyckeskolan ersättning nybyggnad F-6	A1 (nybyggnad)	Förstudie	2024-01-01 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan		

Lillebyskolan F-6, Verksamhetsanpassning kök och matsal	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Planera förstudie	2024-08-22		
Lundbyskolan nybyggnad idrottshall	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-03-04
Lundbyskolan. ny 7-9 skola, anpassad grundskola och kulturskola samt idrottshallar IOFF	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2023-12-15 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan
Lundensskolan lokalanpassning	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	BP2 ok	2024-02-01 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan	
Lundensskolan paviljonger	Inhyrning - Temporära lokaler	Produktion	ok	ok	2023-12-04 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan
Noleredsskolan F-6	A1 (nybyggnad)	Projektgenomförande	ok	2024-04-22	
Näsets skolan om- tillbyggnad	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2024-12-03		
Påvelundsskolan Evakueringspaviljonger	Inhyrning - Temporära lokaler	Produktion	ok	ok	2024-05-23
Ryaskolan - Kompletterande anpassningar hus A, B och C	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	2023-11-01 TG3 öppnad enl plan	
Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	2023-11-01 TG3 öppnad enl plan	
Rävebergsskolan F-3 utredning matsal	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2023-11-01 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan		
Sandeklevsskolan, Anpassningar i kök och matsal	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-03-28		
Sannaskolan anpassning hus A och B års 7-9	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-07-29
Sannaskolan anpassning SU-enhet	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-05-31

(komplettering till befintligt uppdrag)					
Styrsöskolan verksamhetsanpassningar folkbiblioteket	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Projekt-genomförande Etablering	2023-11-13 Investeringsbeslut taget enligt plan		
Talldungeskolan tillfälliga moduler	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Planera förstudie	2024-01-26 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan		
Toleredsskolan anpassning hus A2 och A3	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt-genomförande Etablering	2024-07-01		
Toleredsskolan, ersättning Hus A1	A1 Förstudie (nybyggnad)	Genomföra förstudie	2024-07-05		
Toleredsskolan - utökning elever	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-04-02
Torslandaskolan F-6	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-08-30
Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla Trulsegården F-3, ombyggnad angöring	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-05-01	2024-09-02
Tynneredsskolan anpassning till evakueringslokal	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt-genomförande	ok	ok	2024-01-11 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan
Tångensskolan F-6 Paviljong Adapteo.	Inhyrning - Temporära lokaler	Produktion	ok	ok	2023-12-18 Flyttad till februari 2024
Tångensskolan nytt våningsplan befintliga moduler	Inhyrning - Temporära lokaler	Projekt-genomförande Etablering	ok	23-10-24 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan	24-04-30
Utbynässkolan F-3 - ombyggnad kök och matsal	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-05-02		
Utbynässkolan - verksamhetsanpassningar hus A (bruna villan)	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt-genomförande realisering	ok	2023-12-30 TG3 öppnad enligt plan	

Utmarksskolan tillfälliga moduler	Inhyrning - Förstudie	Planera förstudie	2024-03-08		
Västerhedsskolan - F3 utökning till F6	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2023-12-24 Flyttad till mars 2024		
Ånässkolan solavskärmning	A2 (om- och tillbyggnad)	Projekt- genomförande	ok	2024-04-22	2024-06-20
Önneredsskolan F-9 ny, om-till och nybyggnation i ny detaljplan	A1 Förstudie (nybyggnad)	Planera förstudie	2024-01-25 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan		
