

Investeringsåtgärder: beslut och delegationsnivåer

Utkast på bilder inför stadsmiljönämnd 2/2

Kerstin Elias

- Stadsmiljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på revidering av stadsmiljönämndens delegationsordning. Revideringen gäller sänkning av beloppsgränser till 15 miljoner kronor för inriktningsbeslut, genomförandebeslut och ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt.


Bakgrund till förvaltningens förslag

- Olika hantering i PoNN, TN och FN
- Samordnat förslag för NOS-nämnderna i syfte att säkerställa förutsättningarna för samverkan ex avseende tidplaner för åtgärder som har ett beroende till varandra.
- Följer stadens riktlinjer avseende investeringsstyrning

Stadsmiljönämndens investeringsportfölj

180 pågående investeringsåtgärder 2023 (genomförandestudie, projektering eller produktion)


	<15 miljoner kronor	15–30 miljoner kronor	30–50 miljoner kronor	>50 miljoner kronor	Namngivna projekt
Antal	130	20	10	10	10
Exempel	- Byte av spårkomplex Godhemsgatan - Tillgänglighetsåtgärder - Lekmiljöer - Trädplaneringar	- Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron - GC Alfred Gärdes Väg - Bulleråtgärd Näsetvägen - Älvsborgs-dammen (Plaskis) - Plikta utflyktslekplats	- Citybuss Bergsjön - Ersätta järnbandskabel - GC-bro över E6/E20 mellan Svingeln och skansen Lejonet - Olof Plames plats	- Askims stationsväg - Upprustning av Gullbergs-kulverten - Pendlings-cykelbana Backaplan - Bräckemotet	- Packhuskajen - Engelbrekts-länken - Avenyn upprustning - Torslanda tvärförbindelse

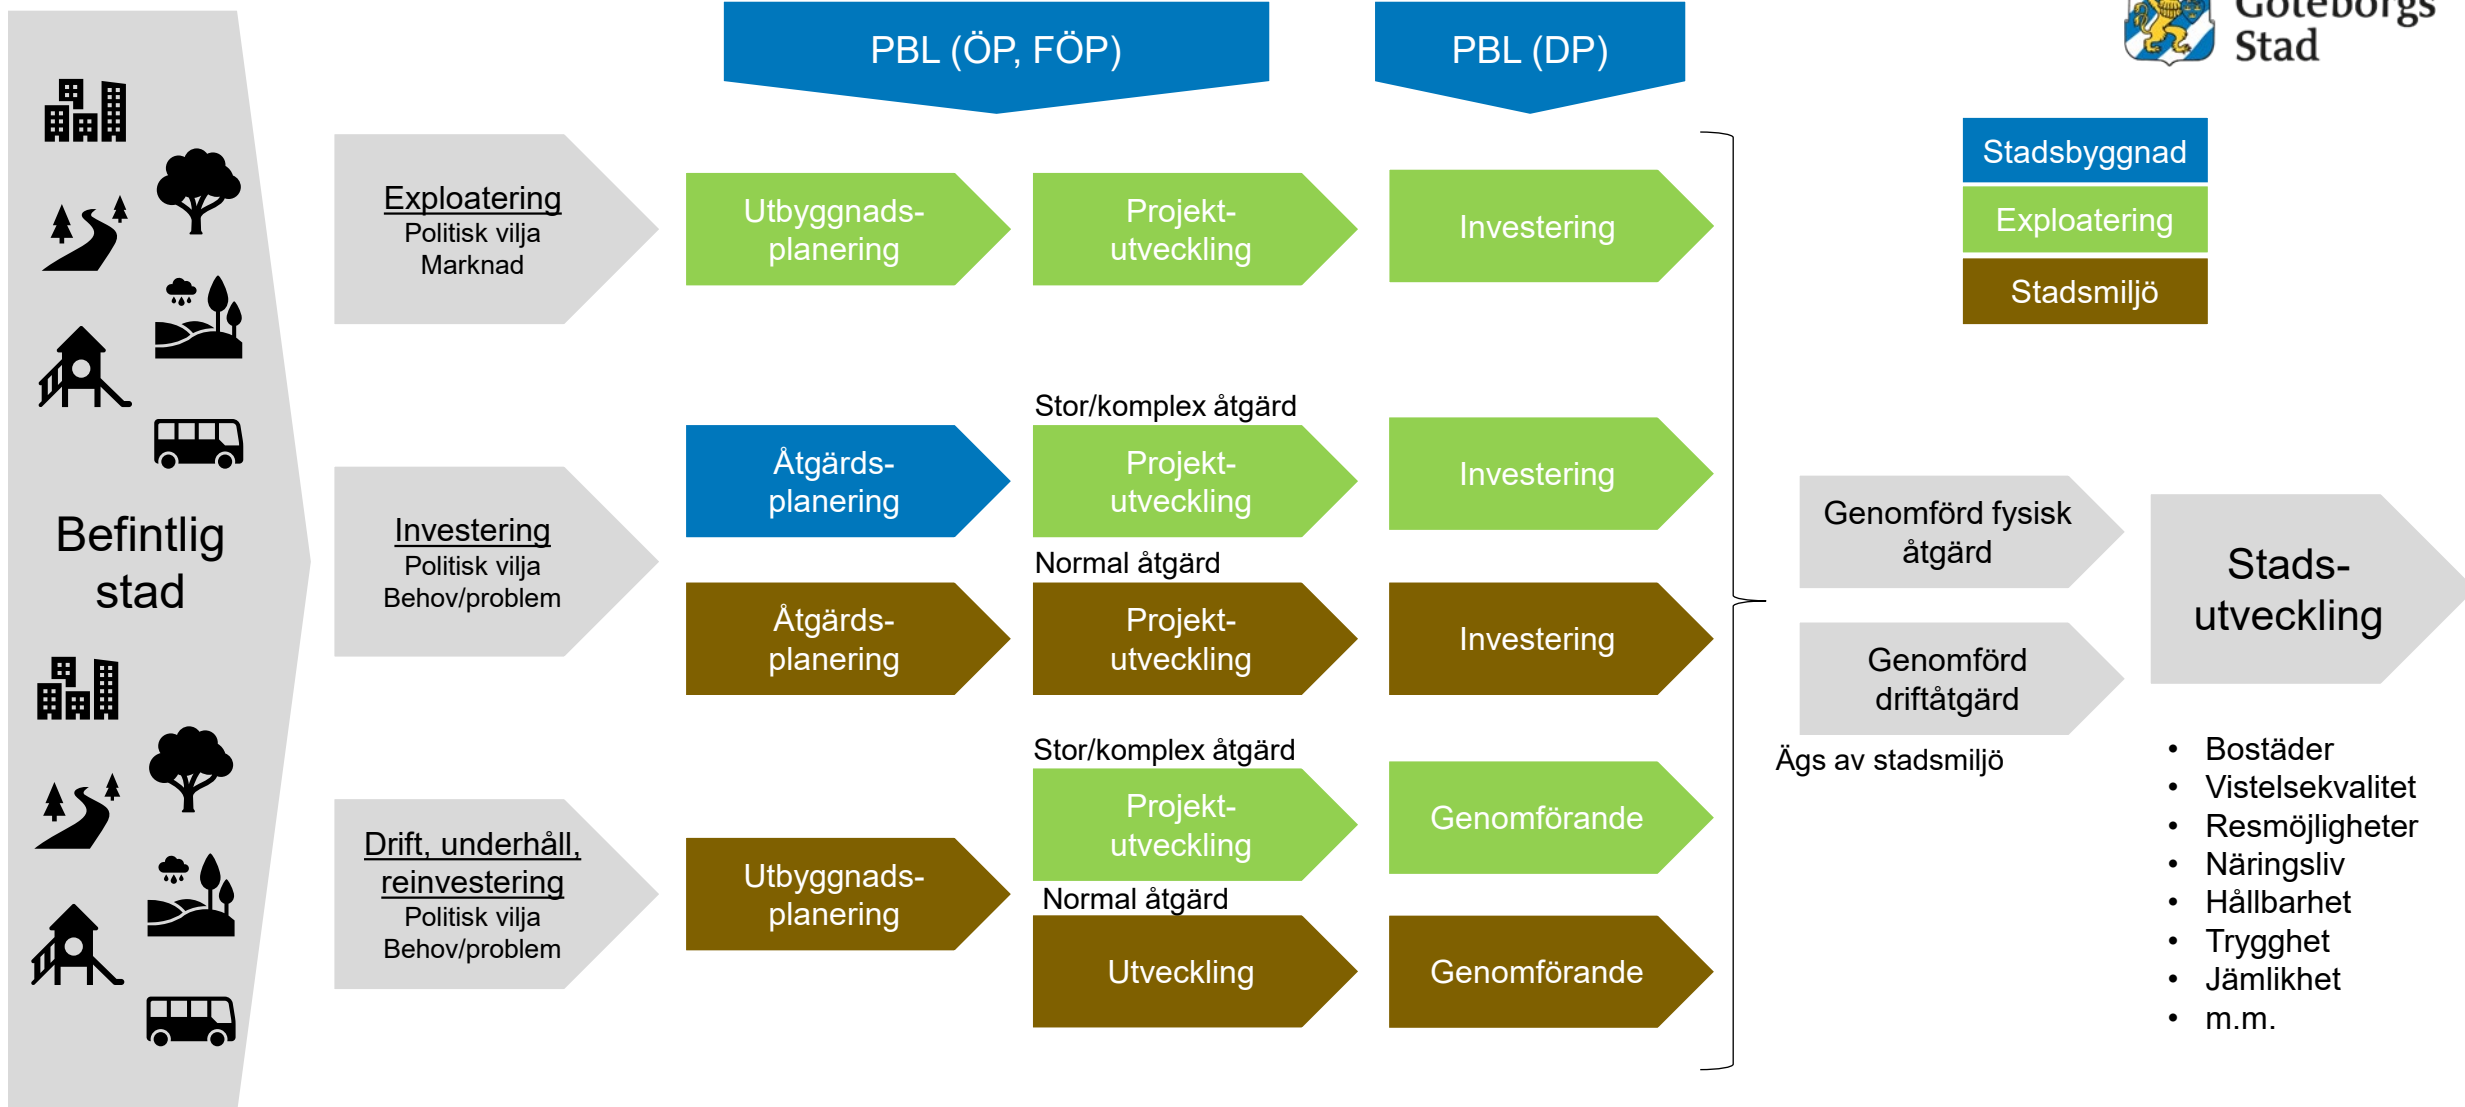


Beslut avseende investeringar

- Investeringsnominering (långsiktigt investeringsunderlag)
 - Investeringsplan
 - Inriktningsbeslut (starta genomförandestudie)
 - Genomförandebeslut (starta projektering och produktion)
-
- Tidigare PoNN beslutade enbart om investeringsnominering samt -plan
 - Tidigare TN beslutade om investeringsnominering, investeringsplan, skedesbeslut genomförandestudie, inköpsbeslut, godkännande av genomförandestudie, skedesbeslut projektering, skedesbeslut produktion

Hur genomförs en investeringsåtgärd

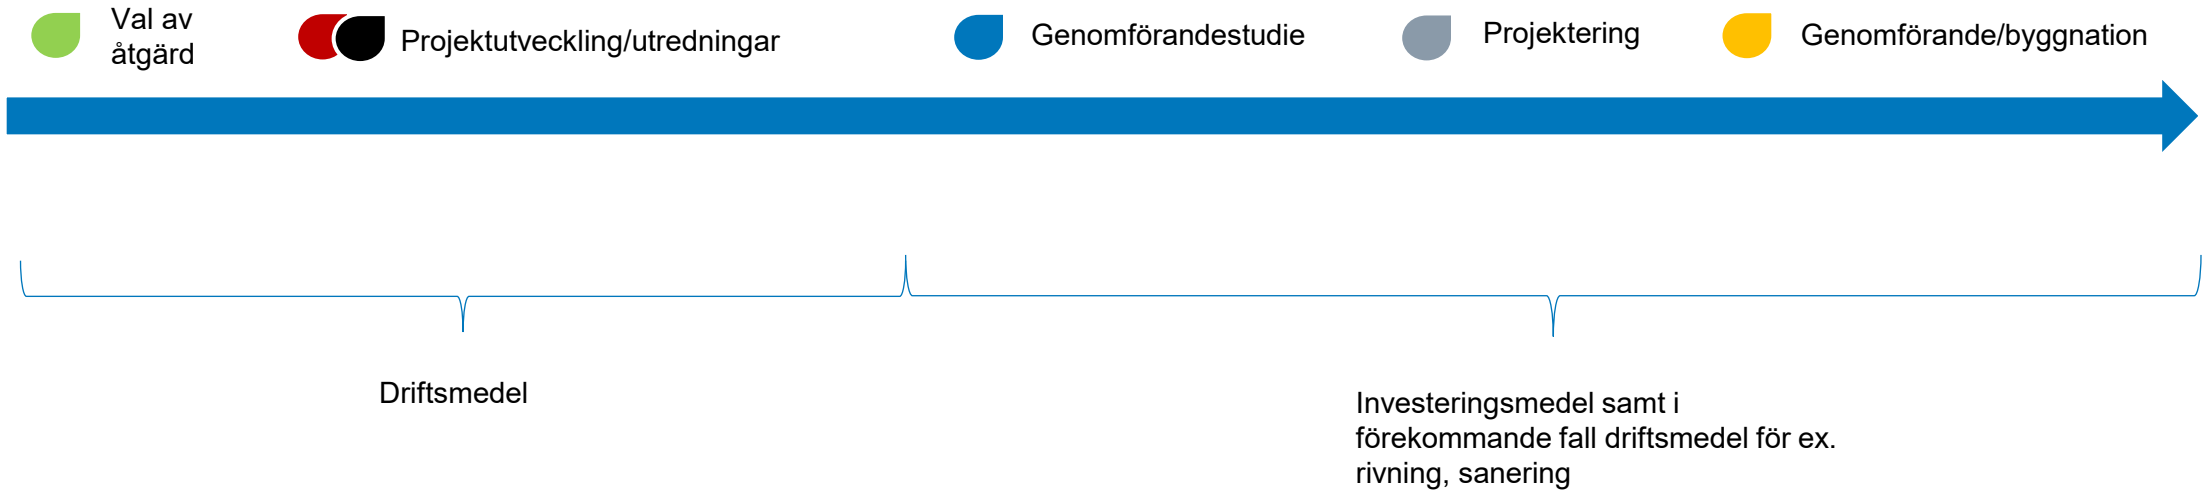

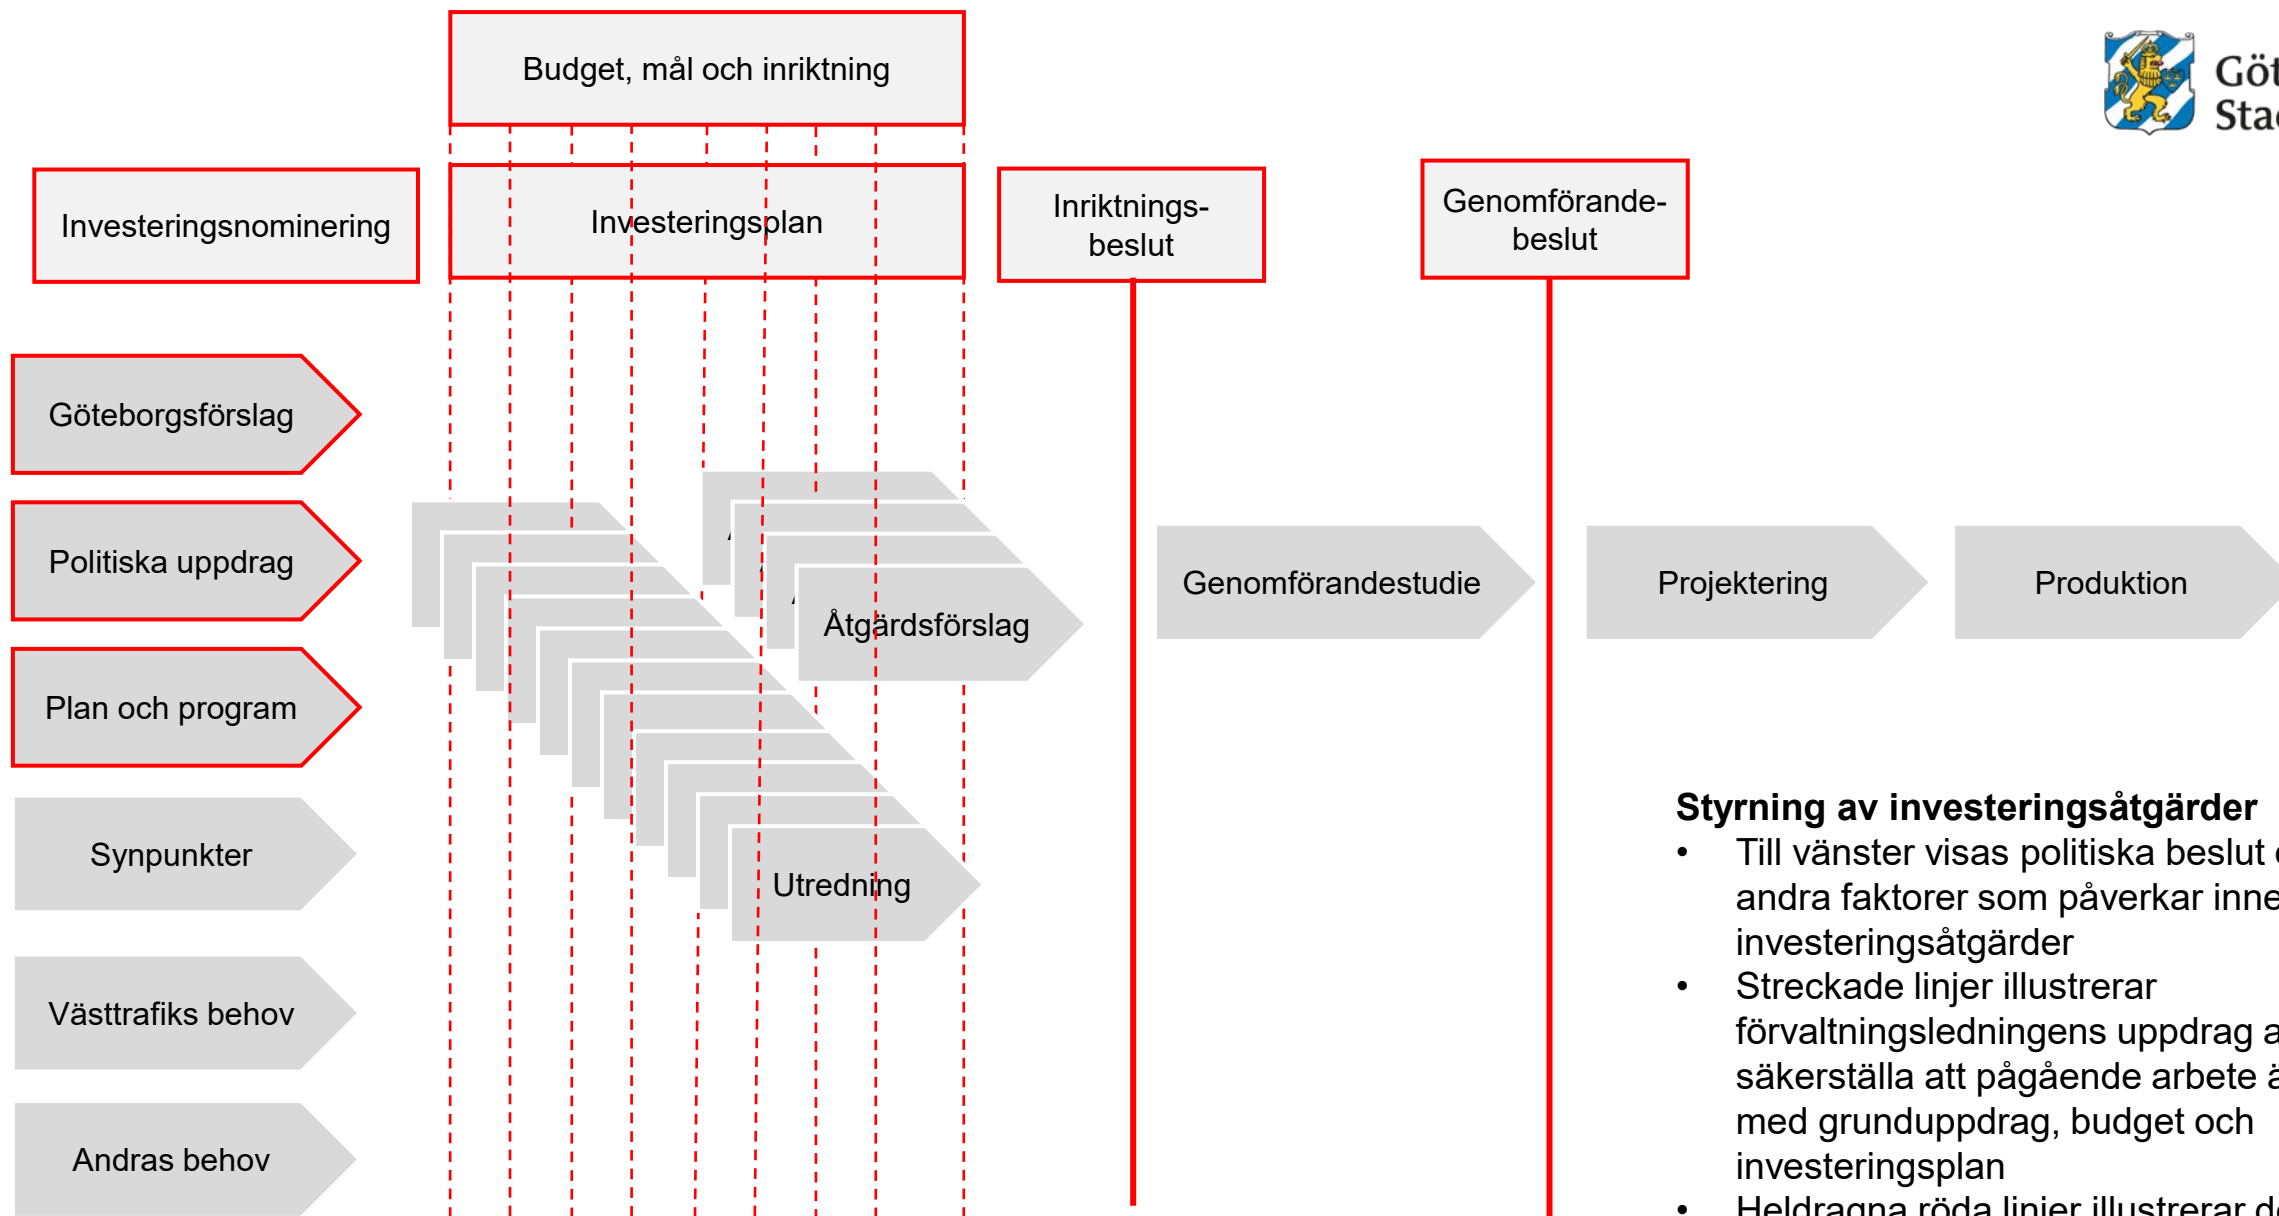

Styrning av investeringsåtgärder

- Till vänster visas politiska beslut och andra faktorer som påverkar innehåll i investeringsåtgärder
- Streckade linjer illustrerar förvaltningsledningens uppdrag att säkerställa att pågående arbete är i linje med grunduppdrag, budget och investeringsplan
- Heldragna röda linjer illustrerar de politiska beslut som krävs för att nyttja investeringsmedel.

Rapportering avseende investeringsåtgärder

- Avvikelserrapportering
- Rapportering för komplexa projekt
- Specifika projekt vid behov

Konsekvenser av reviderad delegationsordning (från 50 miljoner till 15 miljoner)

- Påverkar följande faktorer:
 - Risk för förlängd genomförandetid i projekten
(exempelvis är tiden mellan vårens sista nämnd och höstens första nämnd ett par månader vilket medför en påverkan på möjligheten att starta upp projekt under innevarande år)
 - Förutsättningarna för samordning mellan förvaltningarna
(exempelvis när åtgärder har ett beroende till varandra och behöver avvakta beslut i olika nämnder)
 - Volymen administrativt arbete
(framtagande av tjänsteutlåtande är mer tidskrävande än hantering av mindre åtgärder. I tillägg tillkommer administrativt arbete för revidering av besluten vid avvikelser)
 - Tid för nämndsmöten
(Fler ärenden och redogörelser i nämnd)
- Förvaltningen belyser i underlaget tre nivåer:
 - Ursprungligt förslag 50 mkr
 - Nämndens uppdrag om revidering till 15 mkr
 - Nytt förslag från förvaltningen om revidering till 30 mkr

Stadsmiljönämndens investeringsportfölj

Pågående åtgärder 2023 (genomförandestudie, projektering eller produktion)						
	<15 miljoner kronor	15–30 miljoner kronor	30–50 miljoner kronor	>50 miljoner kronor	Namngivna projekt	Totalt
Antal	100	20	10	10	10	150
Exempel	- Byte av spårkomplex Godhemsgatan - Tillgänglighetsåtgärder - Lekmiljöer	- Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron - GC Alfred Gärdes Väg - Bulleråtgärd Näsetvägen	- Citybuss Bergsjön - Ersätta järnbandskabel - Gång- och cykelbro över E6/E20 mellan Svingeln och skansen Lejonet	- Askims stationsväg - Upprustning av Gullbergskulverten - Pendlingscykelbana Backaplan - Bräckemotet	- Packhuskajen - Engelbrekts-länken - Avenyn upprustning	

Beslutsformuleringar

1. Att förklara uppdraget för fullgjort
2. Att anta ny delegationsordning med reviderade belopp för kronor för inriktningsbeslut, genomförandebeslut och ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt
3. Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på revidering av stadsmiljönämndens delegationsordning. Revideringen gäller sänkning av beloppsgränser till 30 miljoner kronor för inriktningsbeslut, genomförandebeslut och ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt.

Kontakt
